



ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (მცხეთის მუნიციპალიტეტი)

გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიში
და
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა

მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით

პროექტი: ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი (საქართველო I2Q)

თბილისი, საქართველო

2023 წ. იანვარი

ქვეპროექტის აღწერა

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია ინკლუზიურობის, ინოვაციისა და ხარისხის პროექტის (საქართველო (I2Q)) ფარგლებში განხორციელებულ ერთ-ერთ პროექტს წარმოადგენს.

საპროექტო ტერიტორია სოფელ ციხისძირში (საკადასტრო კოდი: 72.10.01.135) მდებარეობს, და მისი ტერიტორიის ფართობია 5,500 მ². მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრებაშია. ქვეპროექტის ტერიტორიაზე მისვლა შესაძლებელია თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო და E117/s 3 გზებით; მანძილი თბილისიდან დაახლოებით 71 კმ-ს შეადგენს.

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის თანახმად, ქვეპროექტის ტერიტორია 8-ბალიანი სეისმური აქტივობის ზონაში მდებარეობს - MSK64 სკალის მიხედვით (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2009 წ. 7 ოქტომბრის ბრძანება №1-1/2284). სკოლის შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის შესწავლა განხორციელდა 2021 წ. ოქტომბერში. რეკომენდაციები შენობის გამაგრების საჭიროების შესახებ აისახა სკოლის რეაბილიტაციის პროექტის შემუშავების პროცესში. 2022 წ. 28 ნოემბერს, პროექტმა გაიარა ექსპერტიზა აკრედიტირებული კომპანია შპს „ექსპერტიზას“ მიერ.

თავდაპირველი პროექტის თანახმად, შენობა გათვლილი იყო 160 მოსწავლეზე; ამჟამად სკოლას ჰყავს დაახლოებით 400 მოსწავლე - ორ ცვლაში, და მათ შორის 8 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა. შენობის გეგმა მრავალ-პროფილურია, შენობა მოიცავს ორ ფლიგელს და აშენებულია 1979 წელს. ტერიტორიაზე მდებარეობს სკოლის ძირითადი შენობა, სააქტო დარბაზი და საქვაბე (ბოილერი). 2010 წელს მოხდა შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: შეიცვალა გადახურვა, ფანჯრები და გარე კარებები, ასევე მოხდა გაზის გამათბობელი ბოილერის მონტაჟი.

ელექტროენერგია ობიექტს მიეწოდება უწყვეტად; ელ. კაბელი სკოლას უკავშირდება საპარო გზით. სკოლა დაერთებულია სასმელი წყლის საერთო ქსელზე. რაც შეეხება ადგილობრივი ჩამდინარე წყლის მოცილებას, სოფელ ციხისძირის მოსახლეობა იყენებს უბრალო გრუნტის ან ბეტონის თხრილებს სეპტიკის სახით. აღნიშნული ობიექტები მიწის ქვეშ არის განლაგებული და არ იწვევს ანტისანიტარიას და გარემოს დაბინძურებას.

ქვეპროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას:

- მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა, ისეთი დროებითი კონსტრუქციების მონტაჟი, როგორიცაა საპირფარეშოები, გასახდელი ოთახები თანამშრომლებისთვის, დაცვის ჯიხური, საწყობი მასალებისთვის და საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენების განთავსების ადგილები);
- არსებული ბოილერის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა;
- გარე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაცია და ახალი ქსელების მონტაჟი;
- სახანძრო სიგნალიზაციის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟი;
- შენობის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე;

- შენობის წყალმომარაგების, გათბობის, ვენტილაციის და ელ. ქსელების მოწყობა. შენობის დაერთება სასმელი წყალმომარაგების არსებულ მუნიციპალურ ქსელზე. ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის მონტაჟი, კანალიზაციის მისაღებად. ტერიტორიის კეთილმოწყობა სკოლის შენობის გარშემო.

სკოლის არსებული შენობა არ არის ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების, ან სხვა სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებზე.

სკოლის ეზოში რამდენიმე ხე და ბუჩქია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის თანახმად, არსებული მცენარეების მოჭრის საჭიროება არ არის. ბოილერის მშენებლობისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე ხეები არ არის. სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება 735 მ³ გრუნტის ექსკავაცია, საიდანაც 350.7 მ³ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენაა, რაც დროებით განთავსდება სამშენებლო ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავრობის 2013 წ. 31 დეკემბრის №424 რეგლამენტის (ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ) მოთხოვნების შესაბამისად.

ქვეპროექტით მიწის შეძენა, ფიზიკური, ან ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა (მაგ. ოფიციალური ან არაოფიციალური შესყიდვა) გათვალისწინებული არ არის. სარეაბილიტაციო სამუშაოების სასწავლო პროცესის პარალელურად წარმართვის შემთხვევაში, სკოლის პერსონალი და მოსწავლეები დროებით გადავლენ მუხრანის №1 საჯარო სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უზრუნველყოფს ყველა დროებით ღონისძიებას მოსწავლეების აღტერნატიულ ლოკაციებზე ტრანსპორტირებისა და სწავლებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მოწყვლად/უმცირესობის წარმომადგენელ ჯგუფებს.

უახლესი საცხოვრებელი შენობა სკოლიდან დაახლოებით 8.3 მეტრში მდებარეობს.

გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი

(ა) ზემოქმედების შეფასება

<p>აქვს თუ არა ქვე-პროექტს საგრძნობი ზემოქმედება გარემოზე?</p>	<p>ქვე-პროექტს ექნება მცირე უარყოფითი ზემოქმედება გარემოზე.</p> <p>ძირითადი ზემოქმედება დაკავშირებული იქნება მშენებლობის ეტაპთან, რაც გულისხმობს სკოლის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, არსებული საქვაბის შენობის დემონტაჟს და ახლის აშენებას, გარე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაციას და ახალი ქსელების მონტაჟს, სკოლის ტერიტორიის კეთილმოწყობას.</p>
<p>რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო და უარყოფითი ხასიათის ზემოქმედებები ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე?</p>	<p>უარყოფითი ეკოლოგიური ზემოქმედება მოკლე-ვადიანია და დაკავშირებულია მცირე მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებასთან მოდიფიცირებულ ლანდშაფტში: აღნიშნული დაკავშირებულია ხმაურთან, მტვერთან, ვიბრაციასთან და სამშენებლო მექანიზმებით გამოწვეულ ემისიებთან; ასევე მოსალოდნელია სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა; ეს უკანასკნელი დაკავშირებულია სკოლის მოვლა-პატრონობის შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებთან, რის მართვაზეც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტია პასუხისმგებელი.</p> <p>ქვე-პროექტი მოდიფიცირებულ გარემოში მდებარეობს. შესაბამისად, ზემოქმედება იქნება გარდამავალი და უმნიშვნელო (ხმაური, ემისიები, სამშენებლო ნარჩენები, სატრანსპორტო მომრაობის და მისასვლელის დროებითი შეზღუდვა და სხვ.).</p> <p>ექსპლოატაციის ეტაპზე უნდა მოხდეს წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების სათანადო მართვა, ეკოლოგიური ზემოქმედების შესამცირებლად.</p>
<p>შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფ სხვა პირებზე?</p>	<p>ქვე-პროექტს ექნება დადებითი გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედება, რადგან ადგილობრივებს ექნებათ წვდომა თანამედროვე სკოლაზე, რომელიც ადაპტირებული იქნება შშმ პირებზე.</p> <p>ქვე-პროექტის საბოლოო მიზანია ქალაქ მცხეთის ბავშვებისთვის განათლების ხარისხის და განათლების მიღების პირობების გაუმჯობესება. სკოლის რეკონსტრუქცია უზრუნველყოფს მყისიერ სარგებელს მისი მომხმარებლებისთვის, რაც გულისხმობს გაუმჯობესებულ</p>

	<p>სასწავლო სივრცეებს, სათამაშო მოედნებს, ყოველდღიურ სასწავლო აქტივობებსა და ზოგადად, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურასა და საცხოვრებელ პირობებს. სასარგებლო იქნება გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედებაც, რადგან ადგილობრივ ბავშვებსა და მოსწავლეებს სკოლაში ექნებათ გაუმჯობესებული საგანმანათლებლო და სამუშაო პირობები, მოსახლეობას გაეზრდება შემოსავალი, როგორც (პროექტის) განხორციელების პროცესში (მუშების დასაქმება), ასევე მშენებლობის შემდგომ.</p> <p>ქვეპროექტი შექმნის დროებით და ზოგიერთ შემთხვევაში, მუდმივ სამუშაო შესაძლებლობებს ადგილობრივებისთვის (როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის), რადგან მათი დასაქმება შესაძლებელი იქნება როგორც რეაბილიტაციის, ასევე მოვლა-პატრონობის ეტაპებზე. თანამედროვე სკოლის არსებობა თემში უფრო მეტ ადამიანს (განსაკუთრებით მათ, ვისაც ჰყავს სკოლის ასაკის ბავშვები) მისცემს სოფელში/ქალაქში დარჩენის შესაძლებლობას.</p> <p>უარყოფითი ზემოქმედება მოკლევადიანია და შეზღუდულია სამშენებლო ტერიტორიით. აღნიშნული დაკავშირებულია ზემოთ აღწერილ შესაძლო შეწუხებასთან.</p> <p>აღდგენითი სამუშაოების სასწავლო პროცესის პარალელურად წარმართვის საჭიროების შემთხვევაში, განიხილება სასწავლო პროცესის დროებით მუხრანის №1 სკოლაში გადატანის საკითხი; თუ შეუძლებელი იქნება აღნიშნული ვარიანტის განხორციელება, აღდგენითი სამუშაოების წარმოება შეიზღუდება სკოლის შენობის იმ ნაწილში, რომელზეც სკოლის მოსწავლეებს წვდომა არ ექნებათ (მაგ. რეაბილიტაცია განხორციელდება შენობის ერთ სართულზე, ხოლო სასწავლო პროცესი - მხოლოდ მეორე სართულზე). სამუშაოების განხორციელების პროცესში მოხდება პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება.</p> <p>ქვე-პროექტით გათვალისწინებულია სკოლის შენობის ადაპტირება, შშმ პირებისთვის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით.</p> <p>ქვეპროექტით მიწის შეძენა, ან განსახლება, ასვე ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა (მაგ. ოფიციალური, ან არაოფიციალური შესყიდვა) გათვალისწინებული არა რის.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

(B) შემარბილებელი ღონისძიებები

<p>რა ალტერნატივები იქნა განხილული დაპროექტებისას?</p>	<p>პროექტით გათვალისწინებულია არსებული სკოლის რეაბილიტაცია, შესაბამისად, სკოლის პროექტთან დაკავშირებული სხვა ალტერნატივები არ განხილულა.</p>
<p>ზემოქმედების შერჩილების რა ღონისძიებებია გათვალისწინებული?</p>	<p>სამშენებლო სამუშაოების დროს მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება გარემოზე მარტივად არის შესაძლებელი სამშენებლო სამუშაოების სათანადო მართვის შედეგად. კონტრაქტორის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს: ნარჩენების გატანა ნებადართულ ადგილას, მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერების მასალის გამოყენება, ან ლიცენზირებული მოწოდებლებისგან მასალების მიღება, წყლის და ნიადაგის დაბინძურების თავიდან აცილება (საწვავის დაღვრა აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლის გამო, ბეტონის დაღვრა და სხვ.), მოსახლეობის შეწუხების (ხმაური, მტვერი, ემისიები) პრევენცია - სამუშაოების წარმოების/მიწოდების, სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის სწორი გრაფიკის ჩამოყალიბებით და სამშენებლო მექანიზმების გამართული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.</p> <p>აუცილებელია სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება, საწვავის და საპოხი მასალების გაუღნვაზე; ყველა მექანიზმის ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ყველა სახის გაუღნვა და მასალების დაღვრა მინიმუმადე იქნას დაყვანილი; კონტრაქტორი ვალდებულია, რომ მოახდინოს დასაწყობების ადგილების ორგანიზება და გადახურვა. მასალების დასაწყობების ადგილები დაცული უნდა იყოს წყალგაუმტარი გადახურვით, რათა არ მოხდეს მათი გამორეცხვა ძლიერი წვიმების და წყალდიდობების დროს; იკრძალება მანქანების ტექნიკური მოვლა-პატრონობის პუნქტების მოწყობა ნებისმიერი წყლის ობიექტიდან 50 მეტრში.</p> <p>ქვე-პროექტის განხორციელების პროცესში მოხდება გამაფრთხილებელი ნიშნების გამოყენება და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მართვა სამუშაოების წარმოების გარშემო.</p>

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება მშენებლობის წარმოების პროცესში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს, რადგან საცხოვრებელი სახლები ქვეპროექტის სიახლოვესაა განლაგებული. კონტრაქტორის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს კონკრეტული ღონისძიებების გატარება ადგილობრივებზე ზემოქმედების შესარტილებლად; აღნიშნული მოიცავს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის ინფორმირებას მოსალოდნელი სამუშაოებისა და მუნიციპალური სერვისების დროებითი შეზღუდვების შესახებ, მსგავსი შეზღუდვების არსებობის შემთხვევაში; უნდა მოხდეს ასევე სამუშაო საათების შეზღუდვა დღის განმავლობაში, სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა, ხმაურის და მტვრის ემისიების მინიმუმამდე დაყვანა და სხვ.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების სასწავლო პროცესის პარალელურად წარმართვის აუცილებლობის შემთხვევაში, სკოლის პერსონალი და ბავშვები დროებით გადავლენ მუხრანის №1 სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გაატარებს ყველა დროებით ღონისძიებას, მოსწავლეების ალტერნატიულ ადგილამდე ტრანსპორტირებისა და სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მოწყვლად/უმცირესობის ჯგუფებს.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების პროცესში მნიშვნელოვანი ხასიათის საფრთხეების წარმოქმნა მოსალოდნელი არ არის - შესაბამისი სამშენებლო პრაქტიკის და უსაფრთხოების პროცედურების გამოყენების გამო. სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უმჯობესია ჩატარდეს ზაფხულის თვეებში (როდესაც სკოლა არ მუშაობს), სასწავლო პროცესის შეფერხების მინიმიზაციის და ბავშვების ჩართულობით გამოწვეული სხვადასხვა შემთხვევების პრევენციის მიზნით.

საპროექტო ტერიტორიაზე არის ბალახის საფარი და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. სამუშაოები გამოიწვევს 350,7 მ³ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას. ნიადაგის აღნიშნული ნაყოფიერი ფენა სრულად იქნება გამოყენებული გამწვანების სამუშაოების წარმოებისას. გრუნტის სამუშაოების დაწყებამდე, საპროექტო ტერიტორია გასუფთავდება ბალახის ტიპის მცენარეებისაგან, ნიადაგის

	ნაყოფიერი ფენა მოიხსნება და მოხდება მისი დროებითი დასაწყობება.
წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან მიღებული რა გამოცდილება იქნა გათვალისწინებული ქვე-პროექტის დიზაინში?	<p>„საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ (მგფ) ფართო გამოცდილება აქვს სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული საშუალო და ფართომასშტაბიანი შენობების (მათ შორის საჯარო სკოლების და ბაღების), გზების და ქუჩების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების განხორციელებაში. მსგავსი პროექტების განხორციელების საფუძველზე მიღებული გამოცდილების შესაბამისად, ტექნიკური პროექტით გათვალისწინებულია არა მხოლოდ სკოლის რეაბილიტაცია, არამედ გათბობის, ვენტილაციის და სახანძრო სისტემის, ასევე ცხელი წყლის მიწოდების, განათების სისტემების და ენერგოფექტურობის პოტენციალის გაუმჯობესება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება - ენერგო ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.</p> <p>სკოლის ინფრასტრუქტურა ადაპტირებული იქნება შშმ პირების მისაღებად და მათთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდებისთვის.</p>
ჩართული იყო თუ არა დაინტერესებული თემები ქვე-პროექტის მომზადების პროცესში და გათვალისწინებული იქნა თუ არა მათი ინტერესები და ცოდნა სათანადოდ?	<p>მოცემულ ქვე-პროექტთან დაკავშირებული მოთხოვნა წამოვიდა ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრიდან, არსებული მდგომარეობის და ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტების საპასუხოდ.</p> <p>2023 წლის 12 აპრილს, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ორგანიზება გაუკეთეს საჯარო კონსულტაციას, რათა განხორციელებულიყო პროექტის „ციხისმირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ და მისთვის მომზადებული გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშის და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ციხისმირის საჯარო სკოლის შენობაში. შეხვედრის ადგილი შეირჩა პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით. საკონსულტაციო შეხვედრის დეტალები (თარიღი, დრო და საკონტაქტო ინფორმაცია) განცხადებაში იყო შეტანილი. განცხადებები განთავსდა ქვე-პროექტის მომიჯნავე ტერიტორიაზე, სკოლის საინფორმაციო დაფაზე და მგფ-სა და განათლების სამინისტროს ვებ-გვერდებზე.</p>

--	--

(გ) კატეგორიზაცია და დასკვნა

გარემოსდაცვითი სკრინინგის დასკვნა:

1. ქვე-პროექტი უარყოფილია
2. ქვე-პროექტი მიღებულია

ქვე-პროექტის მომზადება მოითხოვს:

1. მცირემასშტაბიანი სამშენებლო და სარეაბილიტაციო
საქმიანობების გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის
საკონტროლო სიის შევსებას
2. გარემოსდაცვით და სოციალურ განხილვას,
გარემოსდაცვითი და სოციალური
მართვის გეგმის მომზადების ჩათვლით

ქვე-პროექტის სოციალური და კულტურულ რესურსებზე ზემოქმედების სკრინინგი

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
1	არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის ობიექტების მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და სარწმუნო? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)	x	
2	ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას სამეურნეო რესურსებზე, როგორიცაა მიწა, საძოვრები, წყალი, კომუნალური სამსახურები ან სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული?		x
3	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (სახელმწიფო ან კერძო, დროებით ან მუდმივად)?		x
4	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის, ხეხილის და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე ნაგებობები, ღობე, არხი, ბედელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას?		x
თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით.			
ინფორმაცია კულტურული რესურსების უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
5	საჭიროებს თუ არა პროექტი მიწის სამუშაოებს ისტორიული, არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიახლოეს?		x
თუკი პასუხი კითხვაზე 5 არის „დიახ“, მაშინ გამოყენებული უნდა იქნას OP/BP 4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები და შემთხვევით მოპოვებული მასალების მართვა უნდა განხორციელდეს OP/BP-სა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტში მოცემული პროცედურების შესაბამისად.			

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა

ნაწილი A: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ

ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები	
ქვეყანა	საქართველო
პროექტის დასახელება	პროექტი: ინკლუზიურობა, ინოვაცია და ხარისხი (საქართველო, I2Q)
ქვე-პროექტის დასახელება	ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
ქმედებების მოცულობა ქვე-პროექტის ფარგლებში	<p>მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია ინკლუზიურობის, ინოვაციისა და ხარისხის პროექტის (საქართველო (I2Q)) ფარგლებში განხორციელებულ ერთ-ერთ პროექტს წარმოადგენს.</p> <p>საპროექტო ტერიტორია სოფელ ციხისძირში (საკადასტრო კოდი: 72.10.01.135) მდებარეობს, და მისი ტერიტორიის ფართობია 5,500 მ². მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრებაშია. ქვეპროექტის ტერიტორიაზე მისვლა შესაძლებელია თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო და E117/s 3 გზებით; მანძილი თბილისიდან დაახლოებით 71 კმ-ს შეადგენს.</p> <p>საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის თანახმად, ქვეპროექტის ტერიტორია 8-ბალიანი სეისმური აქტივობის ზონაში მდებარეობს - MSK64 სკალის მიხედვით (საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2009 წ. 7 ოქტომბრის ბრძანება №1-1/2284). სკოლის შენობის კონსტრუქციული მდგრადობის შესწავლა განხორციელდა 2021 წ. ოქტომბერში. რეკომენდაციები შენობის გამაგრების საჭიროების შესახებ აისახა სკოლის რეაბილიტაციის პროექტის შემუშავების პროცესში. 2022 წ. 28 ნოემბერს, პროექტმა გაიარა ექსპერტიზა აკრედიტირებული კომპანია „ექსპერტიზას“ მიერ.</p> <p>თავდაპირველი პროექტის თანახმად, შენობა გათვლილი იყო 160 მოსწავლეზე; ამჟამად სკოლას ჰყავს დაახლოებით 400 მოსწავლე - ორ ცვლაში, და მათ შორის 8 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა. შენობის გეგმა მრავალ-პროფილურია, შენობა მოიცავს ორ ფლიგელს და აშენებულია 1979 წელს. ტერიტორიაზე მდებარეობს სკოლის ძირითადი შენობა, საქტო დარბაზი და საქვაბე (ბოილერი). 2010 წელს მოხდა შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: შეიცვალა გადახურვა, ფანჯრები და გარე კარებები, ასევე მოხდა გაზის გამათბობელი ბოილერის დამონტაჟება.</p>

ელექტროენერგია ობიექტს მიეწოდება უწყვეტად; ელ. კაბელი სკოლას უკავშირდება საპარტო გზით. სკოლა დაერთებულია სასმელი წყლის საერთო ქსელზე. რაც შეეხება ადგილობრივი ჩამდინარე წყლის მოცილებას, სოფელ ციხისძირის მოსახლეობა იყენებს უბრალო გრუნტის ან ბეტონის თხრილებს სეპტიკის სახით. აღნიშნული ობიექტები მიწის ქვეშ არის განლაგებული და არ იწვევს ანტისანიტარიას და გარემოს დაბინძურებას.

ქვეპროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას:

- მოსამზადებელი სამუშაოები (სამშენებლო ტერიტორიის შემოღობვა, ისეთი დროებითი კონსტრუქციების მონტაჟი, როგორიცაა საპირფარეშოები, გასახდელი ოთახები თანამშრომლებისთვის, დაცვის ჯიხური, საწყობი მასალებისთვის და საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენების განთავსების ადგილები);
- არსებული ბოილერის შენობის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა;
- გარე საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაცია და ახალი ქსელების მონტაჟი;
- სახანძრო სიგნალიზაციის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟი;
- შენობის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე;
- შენობის წყალმომარაგების, გათბობის, ვენტილაციის და ელ. ქსელების მოწყობა. შენობის დაერთება სასმელი წყალმომარაგების არსებულ მუნიციპალურ ქსელზე. ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის მონტაჟი, კანალიზაციის მიღების მიზნით. ტერიტორიის კეთილმოწყობა სკოლის შენობის გარშემო.

სკოლის არსებული შენობა არ არის ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების, ან სხვა სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებზე.

სკოლის ეზოში რამდენიმე ხე და ბუჩქია. სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტის თანახმად, არსებული მცენარეების მოჭრის საჭიროება არ არის. ბოილერის მშენებლობისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე ხეები არ არის. სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება 735 მ³ გრუნტის ექსკავაცია, საიდანაც 350.7 მ³ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენაა, რაც დროებით განთავსდება სამშენებლო ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავრობის 2013 წ. 31 დეკემბრის №424 რეგლამენტის (ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის,

	<p>შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ) მოთხოვნების შესაბამისად.</p> <p>უახლესი საცხოვრებელი შენობა სკოლიდან დაახლოებით 8.3 მეტრში მდებარეობს.</p>		
ინსტიტუციონალური ორგანიზება (მსოფლიო ბანკი)	<p>სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი:</p> <p>შირო ნაკათა</p>	<p>გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების სპეციალისტები</p> <p>დარეჯან კაპანაძე - გარემოს დაცვა</p> <p>დავით ჯიჯელავა - სოციალური საკითხები</p>	
განხორციელების ორგანიზება (მსესხებელი)	<p>განმახორციელებელი ერთეული:</p> <p>საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი</p>	<p>სამუშაოთა ზედამხედველი:</p> <p>კომპანია „ეპტისა“, ესპანეთი (Company Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. Spain)</p>	<p>სამუშაოთა კონტრაქტორი: -----</p>
ადგილმდებარეობის აღწერა			
ინსტიტუტის დასახელება, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი	ციხისძირის საჯარო სკოლა		
ინსტიტუტის მისამართი, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი	<p>სოფელი ციხისძირი ტელ: 577971118 ელ. ფოსტა: mtstskhisdziri@mes.gov.ge</p>		
ვინ არის მიწის ნაკვეთის მფლობელი? ვინ არის მოსარგებლე (ოფიციალურად/არაოფიციალურად)	მიწის ნაკვეთი სახელმწიფო საკუთრებაშია		
ფიზიკური და ბუნებრივი გარემო, ობიექტის გარშემო არსებული სოციო-ეკონომიკური კონტექსტი	<p>საპროექტო ტერიტორია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირში მდებარეობს. მცხეთის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონშია განთავსებული. მისი ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი მცხეთა.</p>		

მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - კასპის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით - დუშეთი და თიანეთი, ხოლო სამხრეთით - გარდაბნის, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები და თბილისი. რეგიონი ხასიათდება მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით. მცხეთის ტერიტორია დაბალ და ნახევრად მთიან რეგიონს წარმოადგენს. მის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს საგურამის ქედი, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთით საწკეპელას ქედს ვხვდებით. მის აღმოსავლეთ დაბოლოებას არმაზის ქედი ეწოდება, რომლის სიმაღლეც 1125 მეტრია. მდინარეებს ქანსა და არაგვს შორის სხალტბის ბორცვია.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი მორფოლოგიური ელემენტია მუხრან-საგურამოს ვაკე. მდინარე მტკვარი მოედინება რაიონის ტერიტორიაზე, მისი მთავარი შენაკადებია: ხეკორმულა, არაგვი და დიღმისწყალი. რეგიონში ვხვდებით ტბებსაც. მცხეთა გამოირჩევა ფლორის და ფაუნის მრავალფეროვნებით. საგურამოს ბუნებრივ ნაკრძალში ვხვდებით კავკასიურ ირემს, შველს, მურა დათვს, მგელს, მელას, ფოცხვერს, კურდღელს, წავს და სხვ. მცხეთის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. მუხრან-საგურამოს ვაკეზე აღინიშნება ზომიერად ნოტიო ჰავა ცხელი ზაფხულით და ცივი ზამთრით. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 10.8°C , ხოლო იანვარში -1.1°C . სხალტბის და საგურამოს ქედებზე აღინიშნება ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი, თბილი ზაფხული.

მცხეთის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 47 711 ადამიანი. მუნიციპალიტეტში შედის ერთი ქალაქი (მცხეთა) და 63 დასახლება. ქალაქი მცხეთის მუნიციპალურ ცენტრს წარმოადგენს, 7,940 მოსახლით, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13%-ს შეადგენს. ყველაზე დიდი სოფელია მუხრანი, 6,197 მოსახლით.

ქვეპროექტით მიწის შეძენა, ფიზიკური, ან ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა (მაგ. ოფიციალური ან არაოფიციალური შესყიდვა) გათვალისწინებული არ არის. აღდგენითი სამუშაოების სასწავლო პროცესის პარალელურად წარმართვის საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის პერსონალი და მოსწავლეები დროებით გადავლენ მუხრანის №1 სკოლაში; განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უზრუნველყოფს ყველა დროებითი ღონისძიების

	გატარებას მოსწავლეების ალტერნატიულ ლოკაციებზე ტრანსპორტირებისა და სწავლებისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მოწყვლად/უმცირესობის წარმომადგენელ ჯგუფებს.
მასალების, მათ შორის შემავსებლების, განსაკუთრებით, წყლის და ქვების მიწოდების წყაროების მდებარეობა და დაშორება ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილიდან	არა-სახიფათო ნარჩენების უახლოესი ოფიციალური ნაგავსაყრელი გორის მუნიციპალიტეტიდან დაახლოებით 40 კმ-ში მდებარეობს. მანძილი უახლოეს ლიცენზირებულ კარიერამდე მდინარე მტკვარზე, საპროექტო ტერიტორიიდან დაახლოებით 6 კილომეტრშია, ძეგვთან.
კანონმდებლობა	
ეროვნული და ადგილობრივი კანონმდებლობა და ქვე-პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო ნებართვები	I2Q პროექტი განხორციელებულია მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის OP/BP 4.01 – გარემოსდაცვითი შეფასების შესაბამისად. აღნიშნული პოლიტიკის თანახმად, წარმოდგენილი ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა გარემოსდაცვითი „B“ კატეგორიის პროექტად და წარმოდგენილი დოკუმენტი (გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP)) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის იქნა შემუშავებული - ბანკის სამოქმედო პოლიტიკის (OP/BP 4.01) და I2Q პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო დოკუმენტის (ESMF) პრინციპების შესაბამისად. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სკოლის რეაბილიტაცია არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემას, თუმცა ეროვნული რეგულაციების თანახმად: (i) სამშენებლო მასალების შეძენა უნდა მოხდეს ლიცენზირებული მომწოდებლებისაგან; (ii) თუ კონტრაქტორი გადაწყვეტს კარიერის გახსნას, მან უნდა მიიღოს შესაბამისი ლიცენზია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოდან; (iii) იმ შემთხვევაში თუ ყოველწლიურად კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება 120 კგ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენები, ან 200 ტონაზე მეტი არა-სახიფათო ნარჩენი, ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული მასალა, კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ნარჩენების ინვენტარიზაცია, ნარჩენების მართვის გეგმა და შეათანხმოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის

	<p>სამინისტროსთან, დანიშნოს გარემოს დაცვის მენეჯერი და მის შესახებ ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად;</p> <p>(iv) სამშენებლო ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან შეთანხმებულ ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე, ან განთავსდეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ოფიციალურად შეთანხმებულ და წინასწარ შერჩეულ ადგილას.</p> <p>(v) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება მოხდება საქართველოს მთავრობის 2013 წ. 31 დეკემბრის №424 რეგლამენტით (ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ) განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საჩივრების მოგვარების მექანიზმი

საჩივრების მოგვარების მექანიზმი პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს აძლევს მათთვის მიუღებელი სამუშაოების, ან გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობას.

საჩივრების მოგვარების მექანიზმის არსებობის შესახებ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები გაიგებენ საჯარო კონსულტაციების შედეგად და გავრცელებული ბროშურებით - სამუშაოების დაწყებამდე. შესაბამისი ინფორმაციის ამსახველი განცხადებები გაიკვრება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის შენობების ჰოლდებში განთავსებულ საინფორმაციო დაფებზე. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას მათი უფლებებისა და პრეტენზიების ზეპირად, ან წერილობით გასაჩივრების პროცედურების შესახებ, როგორც მშენებლობის წინა, ასევე მშენებლობის და ექსპლოატაციის ეტაპებზე. საჩივრების მოგვარების მექანიზმის ამოქმედებასთან მიმართებაში, პრიორიტეტი მიენიჭება საჩივრების პრევენციას.

მიღებული საჩივრები გადაეცემა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და მგფ-ს. საჩივრების მონიტორინგის მიზნით, სამინისტრო და მგფ მოახდენს ყველა მიღებული საჩივრის, შენიშვნების და იმის, თუ როგორ მოხდება საჩივრის მოგვარება - რეგისტრაციას. საჯარო კონსულტაციების პროცესში, ადგილობრივ მოსახლეობას ეცნობება საჩივრების მოგვარების პროცესის შესახებ და ისინი მიიღებენ ინფორმაციას საკონტაქტო პირების თაობაზე.

განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან საკონტაქტო პირია მარინე ჟვანია (ტელ: +995 577 27 88 41, marina.zhvania@iitq.gov.ge დიმიტრი უზნაძის N 52, 0102 თბილისი);

მგფ-ს მხრიდან საკონტაქტო პირია დავით არსენაშვილი (ტელ: +995 599 019 183; feedback@mdf.org.ge ; მის: დ. აღმაშენებლის გამზ. #150, მე-4 სართული, 0112, თბილისი, საქართველო).

საჯარო კონსულტაცია

სად და როდის ჩატარდა/ჩატარდება საჯარო კონსულტაცია?	2023 წლის 12 აპრილს, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ორგანიზება გაუკეთეს საჯარო კონსულტაციას, რათა განხორციელებულიყო პროექტის “ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” და მისთვის მომზადებული გარემოსდაცვითი და სოციალური სკოლის ანგარიშის და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ციხისძირის საჯარო სკოლის შენობაში. შეხვედრის ადგილი შეირჩა პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით. საკონსულტაციო შეხვედრის დეტალები (თარიღი, დრო და საკონტაქტო ინფორმაცია) განცხადებაში იყო შეტანილი. განცხადებები განთავსდა ქვე-პროექტის მომიჯნავე ტერიტორიაზე, სკოლის საინფორმაციო დაფაზე და მგფ-სა და განათლების სამინისტროს ვებ-გვერდებზე.
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დანართები

დანართი 1: ორთო-ფოტო

დანართი 2: გენ. გეგმა

დანართი 3: ტოპო-გეგმა

დანართი 4: საკადასტრო ინფორმაცია

დანართი 5: საკადასტრო გეგმა

დანართი 6: ობიექტის ფოტოები

დანართი 7: საპროექტო ნახატები (3დ ვიზუალიზაცია და სხვ.)

დანართი 8: გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის პროექტზე გამართული საჯარო კონსულტაციის ოქმი (წარმოსადგენია მგფ-ის მიერ)

დანართი 9: შეთანხმებები/ლიცენზიები (წარმოსადგენია)

ნაწილი B: ინფორმაცია უსაფრთხოების ღონისძიებების შესახებ

გარემოს დაცვითი/ სოციალური სკრინინგი			
	აქტივობა/ საკითხი	სტატუსი	გააქტიურებული აქტივობა
მოიცავს თუ არა ადგილზე აქტივობა რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილს?	1. რეაბილიტაცია	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი A
	2. ახალი მშენებლობა	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი A
	3. ნარჩენი წყლების დამუშავების ინდივიდუალური სისტემა	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. იხ. ქვემოთ ნაწილი B
	4. ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი C
	5. მიწის შეძენა ¹	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი D
	6. ზემოქმედება მიწის და საკუთრების გამოყენებაზე	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი E
	7. სახიფათო ან ტოქსიკური მასალები ²	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი F
	8. ზემოქმედება ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი G

¹ მიწის შესყიდვა გულისხმობს ადამიანთა ადგილმონაცვლეობას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების შელახვას - ეს ეხება მიწებს, რომელიც შეძენილი/გადაცემულია და ამ ქმედებას გააჩნია ზემოქმედება იმ ადამიანებზე რომლებიც ცხოვრობენ ან/და სახლობენ ან/და აწარმოებენ ბიზნესს (სავაჭრო ერთეულებს - ჯიხურებს) მიწაზე, რომლიც შეძენაც მიმდინარეობს.

² ტოქსიკური/ სახიფათო მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება აზბესტით, ტყვიის შემცველი და სხვა ტოქსიკური საღებავებით, მაგნე ზემოქმედების მქონე გამსსნელებით და ა.შ.

	9. სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/ მენეჯმენტი	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი H
	10. სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი I
	11. საზოგადოება და შრომის ჯანდაცვა და უსაფრთხოება	[] დიახ [] არა	თუ პასუხია „დიახ“, იხ. ქვემოთ ნაწილი J

ნაწილი C: ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

აქტივობა	პარამეტრი	ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებების საკონტროლო ჩამონათვალი
0. ზოგადი პირობები	შეტყობინება და მუშათა უსაფრთხოება	<p>(a) მშენებლობისთვის, ბუნებრივი სამშენებლო მასალების მოპოვებისთვის, ნარჩენების გატანისთვის და სხვ. საკითხების შესრულებისთვის საჭირო კანონიერი ნებართვების მიღება;</p> <p>(b) მომუშავეთა პირადი დაცვის აღჭურვილობა (PPE) შესაბამისობაში უნდა იყოს კარგ საერთაშორისო პრაქტიკასთან (მუშაობის დროს ყოველთვის დამცავი ჩაფხუტის ტარება, და საჭიროების შემთხვევაში: ნიღბები და უსაფრთხოების ჩექმები) და უნდა განხორციელდეს კონტროლი აღნიშნული აღჭურვილობის გამოყენებაზე;</p> <p>(c) სამუშაო ტერიტორიებზე განლაგებული მაჩვენებლები მუშებისთვის, სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებით შესასრულებელი მირითადი წესებისა და რეგულაციების შესახებ;</p> <p>(d) თითოეულ სამუშაო ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს ინფორმაცია სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ, შესაბამის საკონტაქტო ინფორმაციასთან ერთად;</p> <p>(e) მუშების პირადი დაცვის აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას (დამცავი ჩაფხუტების მუდმივად ტარება, ხოლო ნიღბების, დამცავი სათვალეების, უსაფრთხოების ღვედების და სპეციალური ფეხსაცმელების ტარება - საჭიროებისამებრ).</p>
A. ზოგადი რეაბილიტაცია და / ან სამშენებლო აქტივობები	ჰარის ხარისხი	<p>(a) ნგრევის შედეგად მიღებული ნარჩენების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირებად ტერიტორიაზე; ამასთან, ნარჩენებზე უნდა მოხდეს წყლის მოსხმა, მტვრის შესამცირებლად;</p> <p>(b) პნევმატური ბურღვის/ კედლების ნგრევის პროცესის შედეგად მიღებული მტვერის გავრცელება უნდა შეიზღუდოს წყლის მოსხმით და /ან ადგილზე მტვრის საწინააღმდეგო ეკრანის დამონტაჟებით;</p> <p>(c) მიმდებარე ტერიტორია (ტროტუარები, გზები) თავისუფალი უნდა იყოს (სამშენებლო) ნარჩენებისგან, მტვრის მინიმუმადე დაყვანის მიზნით;</p> <p>(d) სამშენებლო მასალის/ნარჩენების ღია ტიპის წვა სამშენებლო ტერიტორიაზე არ უნდა განხორციელდეს;</p> <p>(e) სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უქმად არ უნდა იყოს გაჩერებული (საპროექტო) ტერიტორიაზე;</p>

		(f) დატვირთული სატრანსპორტო საშუალებები ცალკე უნდა განთავსდეს და დაცული უნდა იყოს - გადახურვით.
ხმაური		(a) სამშენებლო ხმაური უნდა შეიზღუდოს დღის სამუშაო საათებით; (b) ოპერირებისას გენერატორების, დახურული ჰაერის კომპრესორების და სხვა მექანიკური დანადგარების ძრავის საფარები დახურული უნდა იყოს, ამასთან, დანადგარები მაქსიმალურად შორს უნდა განთავსდეს დასახლებული ტერიტორიებიდან; (c) მაქსიმალურად დასაშვები სიჩქარე უნდა შეიზღუდოს.
წყლის ხარისხი		(a) ადგილზე მოხდება ეროზიისა და დანალექების საკონტროლო ღონისძიებების განხორციელება, როგორიცაა თივის შეკვრებისა და/ან შლამის მესერების დამონტაჟება, რაც ხელს შეუშლის დანალექების სამშენებლო ტერიტორიებიდან გასვლას და ახლომდებარე ნაკადებისა და მდინარეების ზედმეტ ამღვრევას; (b) სამშენებლო სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების გარეცხვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისად გამოყოფილ ადგილას, სადაც წყლის ჩამონადენი არ დააბინძურებს ბუნებრივი ზედაპირის წყლის ობიექტებს; (c) საპოხი მასალები, საწვავი და გამხსნელები უნდა განთავსდეს და გამოყენებულ იქნას შესაბამის მექანიზმებთან მიმართებაში მხოლოდ განსაზღვრულ ადგილებზე, ნიადაგის სათანადო დაცვის (გადახურვის) და საოპერაციო და საავარიო დაღვრის განცალკევების მიზნით. ობიექტზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი და სხვ.), დაღვრის ლოკალიზების მიზნით.
ნარჩენების მართვა		(a) წარმოქმნილი ნარჩენების მოცულობის მინიმუმამდე დაყვანა, შესაძლებლობის ფარგლებში; (b) წარმოქმნილი ნარჩენების სხვადასხვა ტიპების განცალკევება და ნარჩენების შესაბამისი სახეობების ხელახალი გამოყენება, რამდენადაც ეს იქნება შესაძლებელი; (c) ნარჩენების სხვადასხვა ტიპებისთვის დროებითი განთავსების ადგილების გამოყოფა. დაუშვებელია საპროექტო ტერიტორიაზე ნარჩენების ზედმეტი მოცულობების აკუმულაცია; (d) საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადაყრის და ზედმეტი მასალის (ინერტული სამშენებლო მასალა) საბოლოო განთავსების მიზნით ოფიციალური ნებართვების მიღება მუნიციპალური უწყებებიდან; (e) სახიფათო ნარჩენების, ან ლიცენზირებული კომპანიებისთვის აღნიშნული ნარჩენების გადაცემის საკითხის დროული გადაწყვეტა.

	მასალების მიწოდება	<p>(f) მასალები შეძენილი უნდა იქნეს იმ არსებული საწარმოებისა და კარიერებისაგან, რომელთაც გააჩნიათ სათანადო ოფიციალური ნებართვა, ან მოქმედი ლიცენზია საქმიანობის განსახორციელებლად;</p> <p>(g) მოპოვებული უნდა იქნეს შესაბამისი ლიცენზია, თუ საჭიროა ახალი კარიერის გახსნა;</p> <p>(h) კარიერების ტერიტორიების გამოყენებული მონაკვეთების აღდგენა, ექსტრაქციის (მოპოვების) გაგრძელების შემთხვევაში, ან მათი სათანადოდ დახურვა, ექსტრაქციის (მოპოვების) დასრულების და ლიცენზიის ვადის ამოწურვის შემთხვევაში;</p> <p>(i) მასალების გადაზიდვა არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში;</p> <p>(j) სიჩქარის მარეგულირებელი, მიმართულების შეცვლის აღმნიშვნელი და გამაფრთხილებელი ნიშნების უზრუნველყოფა სატრანსპორტო საშუალებებისთვის - საჭიროების შესაბამისად.</p>
	მიწის სამუშაოები	<p>(a) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა უნდა მოიხსნას მიწის სამუშაოების დაწყებამდე;</p> <p>(b) აუცილებელია ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების შესაბამისი პრაქტიკის გამოყენება, გრუნტის ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური აქტივობის შენარჩუნებისათვის; უნდა აღიმართოს დროებითი შლამის მესერები, ეროზის (გამორეცხვის) პრევენციის მიზნით;</p> <p>(c) ნიადაგის დასაწყობებული ფენის გამოყენება უნდა მოხდეს აღდგენისა და გამწვანების პროცესში;</p> <p>(d) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა იმ ადგილებიდან, რომლებიც არ ექვემდებარებიან პირველადი მდგომარეობის აღდგენსას, ფრთხილად გადანაწილდება მიმდებარე ტერიტორიაზე;</p> <p>(e) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის აღდგენა მოხდება ქვენიადაგისგან განცალკევებით, რათა არ მოხდეს აღნიშნული მასალების ერთმანეთთან შერევა. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის აღდგენა საკმარისია თავდაპირველი ნაყოფიერი სიღრმის აღსადგენად, რაც გამოჩნდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ზოლზე - ვიზუალური დაკვირვებისას და აღდგენილი და მიმდებარე ადგილების ერთმანეთთან შედარებისას. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ადგილმონაცვლეობის დროს, კონტრაქტორმა ისე უნდა დაგეგმოს სამუშაოები, რომ თავდაპირველად მოხდეს ყრილებისგან ყველაზე დიდი მანძილით დაშორებული ადგილების აღდგენა, თანდათანობით კი უნდა მოხდეს აღდგენის აღნიშნულ ყრილებთან დაახლოვება, რაც შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების ნიადაგის აღდგენილ ნაყოფიერ ფენაზე მოძრაობის მოცულობას. ნიადაგის აღდგენილი ნაყოფიერი ფენა შეძლებისდაგვარად</p>

		<p>დაიფარცხება, რაც შეინარჩუნებს მცენარეული საფარის მდგრადობას და ხელს შეუწყობს ვეგეტაციის ზრდას;</p> <p>(f) მიწის სამუშაოების პროცესში შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტოს ფიზიკური სამუშაოების წარმოება საპროექტო ტერიტორიაზე და აცნობოს მგფ-ს. ფონდი (მგფ) მყისიერად აცნობებს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას შემდგომ მოქმედებებზე. სამუშაოების გაგრძელება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წერილობითი ნებართვის მიღების შემდეგ.</p>
J. საზოგადოების და შრომის ჯანდაცვა და უსაფრთხოება	საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა	<p>(a) კონტრაქტორის ჯგუფში გამოყავით პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და მათი თხოვნების/საჩივრების მიღებაზე;</p> <p>(b) გაიარეთ კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სამუშაოების განმახორციელებლებსა (დაქირავებულ სამუშაო ძალასა) და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის შესაძლო კონფლიქტების გამოვლენის და შესაბამისად მართვის მიზნით;</p> <p>(c) მოახდინეთ ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, სამუშაოების განმახორციელებლების (დაქირავებულ სამუშაო ძალის ტერიტორიაზე) ყოფნასთან დაკავშირებით, სექსუალურად გადამცემი დაავადებების რისკის შესახებ და ჩართეთ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები, ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებულ აქტივობებში;</p> <p>(d) აცნობეთ მოსახლეობას მშენებლობის და სამუშაოების გრაფიკების შესახებ, ასევე სერვისების შეწყვეტის, შემოვლითი მარშრუტების, ავტობუსების დროებითი მარშრუტების და აფეთქებისა და ნგრევის შესახებ, საჭიროებისამებრ;</p> <p>(e) სამშენებლო საქმიანობა შეზღუდეთ ღამით. აუცილებლობის შემთხვევაში, უზრუნველყავით ღამის სამუშაოების ფრთხილად დაგეგმვა და მოსახლეობის სათანადო ინფორმირება, რათა მათ შეძლონ ყველა საჭირო ზომის მიღება;</p> <p>(f) მოსახლეობის მინიმუმ ხუთი დღით ადრე ინფორმირება, რომელიმე სერვისის (მათ შორის, წყლის, ელექტროენერგიის, ტელეფონის, ავტობუსის მარშრუტების) შეწყვეტამდე; მოსახლეობის გამაფრთხილებელი ნიშნები განთავსდება სამუშაო ტერიტორიაზე, ავტობუსის გაჩერებებზე და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სახლებზე/ბიზნეს ობიექტებზე;</p> <p>(g) დამკვეთის მიერ შექმნილი საჩივრების მოგვარების მექანიზმის სამუალებით წამოჭრილი პრობლემური საკითხების მოგვარება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში და კონტრაქტორის პასუხისმგებლობის ფარგლებში;</p>

		<p>(h) სამუშაო ბანაკები არ განათავსოთ ადგილობრივ მოსახლეობასთან უშუალო სიახლოვეს, რამდენადაც ეს იქნება შესაძლებელი;</p> <p>(i) სამუშაო ბანაკების განთავსება და ოპერირება განახორციელეთ მეზობელ მოსახლეობასთან კონსულტაციების საფუძველზე.</p>
	სამუშაო რესურსების მართვა	<p>(a) არა-კვალიფიცირებული, ან ნახევრად-კვალიფიცირებული მუშების დაქირავება მოხდეს ადგილობრივი მოსახლეობიდან, რამდენადაც ეს იქნება შესაძლებელი. ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის გაძლიერების მიზნით, ჩატარდეს მუშებისთვის შესაბამისი სწავლება (ტრენინგი), როდესაც და სადაც ასეთი ტრენინგის ჩატარება იქნება შესაძლებელი;</p> <p>(b) სამუშაო ტერიტორიაზე შესაბამისი სან. კვანძების ობიექტების (ტუალეტების და დასაბანი ადგილების) მოწყობა, ცხელი და ცივი წყლის, საპნის და ხელის საშრობი მოწყობილობების უზრუნველყოფით. ნებისმიერი სამუშაო ბანაკისთვის უნდა მოხდეს დროებითი სეპტიკური ავზის სისტემის მოწყობა, რამაც არ უნდა გამოიწვიოს მახლობლად მდებარე წყლის ნაკადების დაბინძურება;</p> <p>(c) მუშების ცნობიერების ამაღლება ადგილობრივ მოსახლეობასთან ზოგადი ურთიერთობის მართვის საკითხებზე, ქცევის კოდექსის შემუშავება საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად და აღნიშნული კოდექსის მკაცრად დაცვა, რაც მოიცავს მუშების (სამსახურიდან) გაშვებას და შესაბამისი მოცულობის ფინანსური ჯარიმების დაკისრებას;</p> <p>(d) ზედამხედველი ინჟინრის და დამკვეთის სასწრაფო ინფორმირება სამუშაოების წარმოების ადგილზე მომხდარი ნებისმიერი ინციდენტის შესახებ, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ან გარემოზე.</p>

ნაწილი D: მონიტორინგის გეგმა

საქმიანობა	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელ დეს მონიტორინგ ი	როდის რა სიხშირით/პერი ოდულობით უნდა განხორციელდე ს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე?
სამშენებლო ფაზა						
სამშენებლო მასალების მიწოდება	სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებული მომწოდებლებისაგან	მომწოდებლის ოფიციალური საწყობში	დოკუმენტების შემოწმება	მოწოდების კონტრაქტების გაფორმებისას	ინფრასტრუქტ ურის ტექნიკური მდგრადობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფ ის მიზნით	მგებელის ზედამხედველი
სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირე ბა სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილება	სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების სტანდარტული ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა;	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექტირებ ა	გაუფრთხილებე ლი ინსპექტირება როგორც სამუშაო, ასევე არა სამუშაო საათებში	მიწისა და ჰაერის ემისიებით დაბინძურების შეზღუდვა; ხმაურით და ვიბრაციით ადგილობრივი	მგებელის ზედამხედველი, საგზაო პოლიცია

	<p>სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების გადაზიდვა დახურული მანქანებით;</p> <p>ტრანსპორტირების დადგენილი საათებისა და მარშრუტების დაცვა</p>				<p>მოსახლეობის შეწუხების შეზღუდვა;</p> <p>ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევის მინიმუმამდე შემცირება.</p>	
მიწის სამუშაოები	<p>ამოღებული გრუნტის დროებითი დასაწყობება წინასწარ განსაზღვრულ და შეთანხმებულ ტერიტორიებზე;</p> <p>ამოღებული გრუნტის უკუ-ჩაყრა და/ან განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ტერიტორიებზე;</p> <p>შემთხვევითი აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების დაუყონებლივ შეწყვეტა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმირება და სამუშაოების განახლება სამინისტროს</p>	სამშენებლო ობიექტი	ინსპექტირება	მიწის სამუშაოების მიმდინარეობის დროს	<p>სამშენებლო და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება;</p> <p>ფიზიკური და კულტურული რესურსების დაზიანების და დანაკარგის თავიდან აცილება;</p> <p>ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის</p>	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი

	<p>წერილობითი თანხმობის მიღების შემდეგ;</p> <p>ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა - მიწის სამუშაოების დაწყებამდე;</p> <p>ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების შესაბამისი პრაქტიკის გამოყენება;</p> <p>დროებითი დამცავი შემოღობვის (შლამის მესერის) აღმართვა;</p> <p>ნიადაგის მოხსნილი ნაყოფიერი ფენის გამოყენება აღდგენის და გამწვანების პროცესში.</p>				დანაკარგის პრევენცია.	
ბუნებრივი სამშენებლო მასალების წყარო	<p>მასალების შეძენა არსებული, ლიცენზირებული მომწოდებლებისაგან, თუ ეს შესაძლებელია;</p> <p>სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მიღება კონტრაქტის</p>	კარიერები	დოკუმენტებისა და სამუშაოების ინსპექტირება	ინერტული მასალის მოპოვების პერიოდში	ქანობების ეროზიის და ეკოსისტემების და ლანდშაფტების დეგრადაციის შეზღუდვა;	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი

	<p>საფუძველზე და ლიცენზიის პირობების მკაცრი დაცვა;</p> <p>კარიერების დატერასება, დამუშავებული ადგილების რეაბილიტაცია და ლანდშაფტთან ჰარმონიზება;</p> <p>მდინარეში ქვიშა-ხრეშის მოპოვება წყლის ნაკადის გარეთ, დამცავი ბარიერების მოწყობა ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. დაუშვებელია მანქანების შესვლა წყლის ნაკადში.</p>				<p>მდინარის ნაპირების ეროზიის, შეწონილი ნაწილაკებით წყლის დაბინძურების და წყლის ფლორის და ფაუნის დარღვევის შეზღუდვა</p>	
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	<p>სამშენებლო ნარჩენების დროებითი განთავსება სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში;</p> <p>ნარჩენების დროული განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ადგილებში.</p>	<p>სამშენებლო ტერიტორია; ნარჩენების განთავსების ტერიტორია</p>	<p>ინსპექტირებ ა</p>	<p>პერიოდულად - მშენებლობის პროცესში და პრეტენზიების შემთხვევაში</p>	<p>სამშენებლო და მის მეზობლად მდებარე ტერიტორიების მყარი ნარჩენებისაგან დაბინძურების თავიდან აცილება</p>	<p>მგებ, მშენებლობის ზედამხედველი</p>

<p>ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულეთა მიმოსვლის შეზღუდვა</p>	<p>სატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვის/მოძრაობის მიმართულების შეცვლის ნიშნების განთავსება;</p> <p>სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დროებითი განთავსება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სატრანსპორტო საცობები მისასვლელ გზებზე.</p>	<p>სამშენებლო ტერიტორიაზე და სამშენებლო ტერიტორიის გარშემო</p>	<p>ინსპექტირებ ა</p>	<p>სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში</p>	<p>სატრანსპორტო შემთხვევების თავიდან აცილება;</p> <p>ადგილობრივი მაცხოვრებლები ს შეწუხების შეზღუდვა;</p>	<p>მგვ. მშენებლობის ზედამხედველი</p>
<p>მუშების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება</p>	<p>მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა;</p> <p>სასმელი წყლის და ტუალეტების უზრუნველყოფა მამაკაცებისა და ქალებისთვის სამუშაო ტერიტორიაზე;</p> <p>მუშების და პერსონალის ინფორმირება მექანიზმებთან/აღჭურვილ ობასთან მუშაობისას ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების შესახებ და</p>	<p>სამშენებლო ობიექტი</p>	<p>ინსპექტირებ ა</p>	<p>გაუფრთხილებე ლი შემოწმება სამუშაოების მსვლელობისას</p>	<p>საწარმოო უბედური და გაუთვალისწინე ბელი შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა;</p>	<p>მგვ. მშენებლობის ზედამხედველი</p>

	<p>ასევე აღნიშნული წესები/ინსტრუქციების მკაცრი დაცვა;</p> <p>კოვიდ-19-ის ინფექციის გავრცელების პრევენციის გეგმის დამტკიცება და დაცვა და სამოქმედო რეაგირება, ინფექციის შესაძლო გავრცელების შემთხვევაში.</p>					
სამუშაოების წარმოება დასახლებაში	<p>პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის ინფორმირება მომავალი სამუშაოების და მუნიციპალური სერვისების მიწოდების დროებითი შეფერხების შესახებ, რამაც შესაძლოა იჩინოს თავი სამუშაოების წარმოების პროცესში;</p> <p>დღის განმავლობაში განსაზღვრული სამუშაო საათების დაცვა, ხმაურის და მტვრის ემისიების მინიმუმამდე დაყვანა, სამშენებლო</p>	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექტირებ ა	პერიოდულად	<p>ადგილობრივი მაცხოვრებლები ს უსაფრთხოების უზრუნველყოფ ა და შეწუხების მინიმუმამდე შემცირება</p>	მგება, მმენებლობის ზედამხედველი

	<p>სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა;</p> <p>სარეაბილიტაციო გზის გასწვრივ არსებულ სახლებთან და ბიზნეს ობიექტებთან ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო მისასვლელის უზრუნველყოფა და ადამიანების/ცხოველების ამოთხრილ ორმოებში, თხრილებში და ღრმულებში შემთხვევითი ჩავარდნისაგან დაცვა;</p> <p>გზის გასწვრივ არსებული ღობეების და სხვა კერძო საკუთრების დაზიანების პრევენცია და დაუყოვნებლივი აღდგენა, დაზიანების შემთხვევაში.</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

საოპერაციო ფაზა


რეაბილიტირებული სკოლის მოვლა-პატრონობის	მყარი ნარჩენების შესაბამისი მართვა	სკოლის ტერიტორია	ინსპექტირებ ა	სკოლის ექსპლოატაციის პერიოდში	მყარი ნარჩენებისაგან დაბინძურების პრევენცია	განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სკოლის
--------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები					ადმინისტრაციი ს მეშვეობით	
კანალიზაციის ბიოლოგიური გამწმენდის ექსპლოატაცია	სკოლის შენობისთვის მოწყობილი ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის რეგულარული მოვლა- პატრონობა და დროული შეკეთება - საჭიროებისამებრ	სკოლის ტერიტორია	ინსპექტირებ ა	ობიექტის ექსპლოატაციის დროს	ზედაპირული დ გრუნტის წყლების გაუწმენდავი კანალიზაციით დაბინძურების პრევენცია	განათლების და მეცნიერების სამინისტრო


დანართი 1: ორთო ფოტო



დანართი 2: გენ. გეგმა

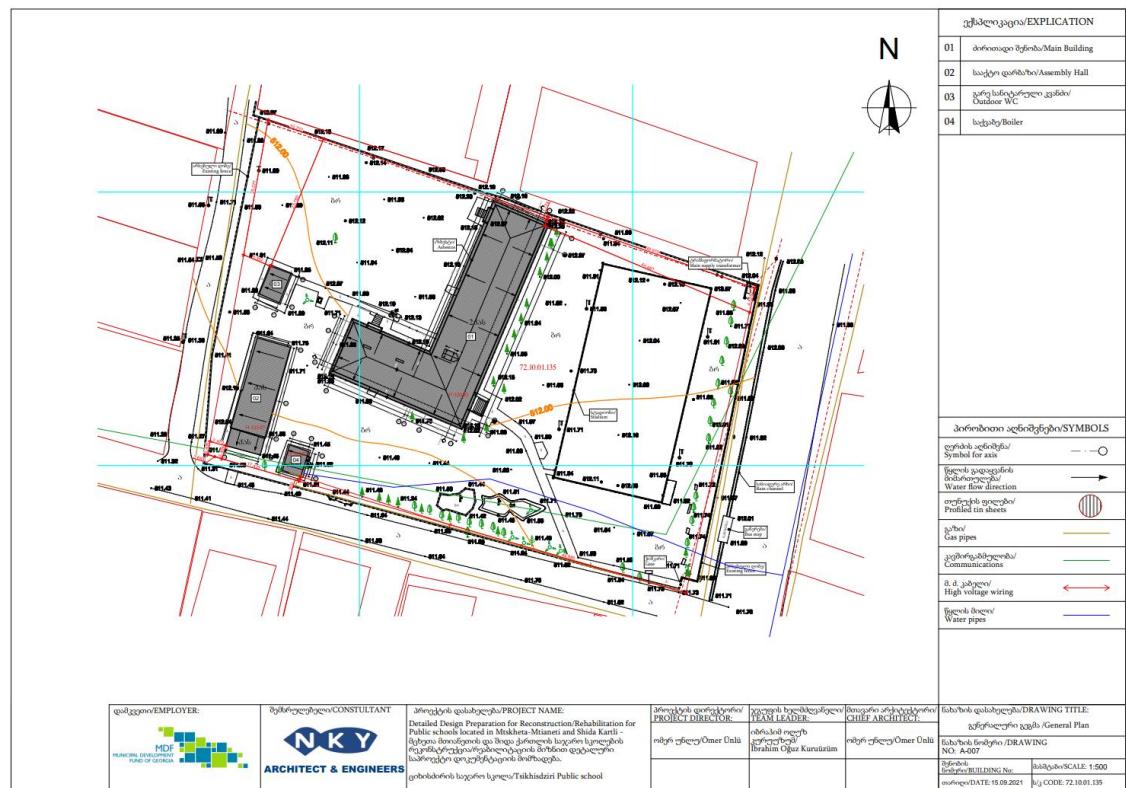

დანართი 3: ტოპო გეგმა

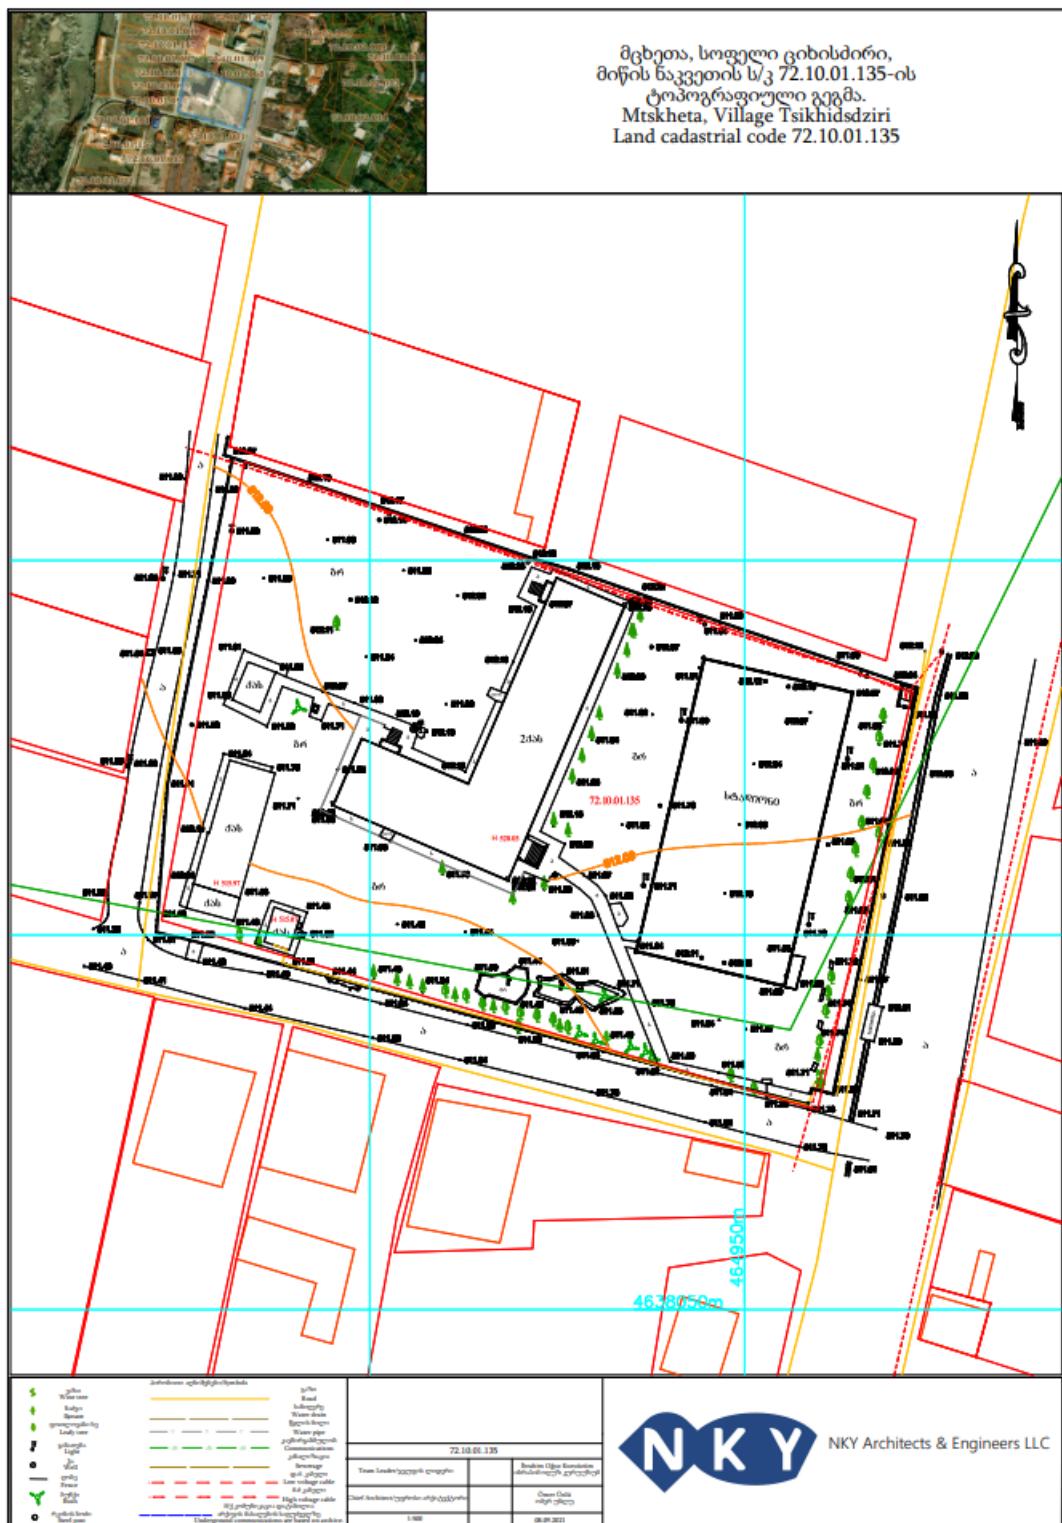

Attachment 4: Cadastral Information



მარტი (კონაგვა ქანების) საკუთრივი კოდი N 72.10.01.135

ამონაწერი საჯარო რეგისტრილი

განცხადების რეგისტრაცია
N 882020556742 - 18/08/2020 12:15:22

მომზადების თარიღი
24/08/2020 09:17:41

საკუთრების განყოფილება

მონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გამა: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასამსოფლო სამეურნეო დამუსტებელი ფართობი: 5500.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 72.10.00.056;
72	10	01	135	შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: შენობა N1 საცხოვო ფართი - 532,29 კვ.მ.; შენობა N2 საცხოვო ფართი - 102, 184 კვ.მ.; შენობა N3 საერთო ფართი - 24, 34 კვ.მ. და შენობა N4
მისამართი: მცხეთა, სოფელი ციხისძირი				

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 722005004566 , თარიღი 05/07/2005

უფლების დამადასტურებელი ღოკემენტი:

- მომართება N1/7-461 , დამოწმების თარიღი: 27/08/2015 , სიახ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"
- მომართება N2/188 , დამოწმების თარიღი: 14/03/2008 , საქართველოს კუთხიმისტერი განციითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების აღიატებისა და პრივატული ქონების აღიატების მცხოვრებლის მიერთებული
- მომართება N2/221 , დამოწმების თარიღი: 29/04/2010 , სახელმწიფო ქონების აღიატებისა და პრივატული ქონების სამსახურის სამსახურის სამსახურის მიერთებული
- მომართება N394 , დამოწმების თარიღი: 05/07/2005 , მცხოვრების სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის სამსახურის მიერთებული

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირაფენობა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882015508064
თარიღი 07/09/2015
17:36:08

მოსარგებლი: სსიპ "მცხვეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისმარის საჯარო
სკოლა" 236087550;
მესაკუთრე: სახელმწიფო
საცავი: 5500 კუმ მიწის ნაკვეთი და მასშე განთაქვებული შენობა-ნაცემის;
არსებობის ვადით;

უფლების წერილი N11/51508, დამოწმების თარიღი 26/08/2015, სსიპ "სახელმწიფო ქონების
რეგისტრაცია: თარიღი 26/08/2015
09/09/2015

ვალდებულება

ყალბადა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლის მიზე გადათ საკუთრებული არჩევული მაცენარეული აქციების რეგისტრისას, აგრეთვე საგადასისხადი წლის
განმსაკულებაში 1000 ლარის ან მეტი დანართულების ქანძების სამუშავის მიღებისას გადასისხადი გადახდის უკეთესობაზე საანგარიში წლის
მიმღები წლის 1 აპრილისთვის, რის შესაბამი აღნიშვნული ფინანსური პირი მიზე მიმღები წლის უკეთესობის საგადასისხადი თვალისწინების აღნიშვნული
გადაღებულების შეუსრულებლივი წარმომადგენის საგადასისხადი სამართილდღიურების, რაც თწლები პირის მიმღები საგადასისხადის საქანონების საგადასისხადი კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."


- დღე კურნების ნამდილების გაღმინდებული შესახებულებელა საჯარო რეგისტრის ვრცელები სააგენტების თვითმიმდევრ კუბ-გეერდზე www.napr.gov.ge;
- ამინისტრის მდებარეობის მუნიციპალიტეტის კუბ-გეერდზე www.napr.gov.ge, ხელისმმერ ცარისობრივ სამსახურის სამსახურის, იუსტიციის სახლებისა
და სამაცხოვის აგრძინებულ პირებისას;
- ამინისტრის გენერალური ხარების აღმინდებამი დაუგიანებელი 2 405405 ან სირაცხვის შეფარისებრის განვითარების კუბ-გეერდზე;
- კომისიურების მთავარ შესახებულება იუსტიციის სახლის ცენტრ ხაზე 2 405405;
- საჯარო რეგისტრის თანამშრომელთა შენიდინ ქართველი ქართველის შემოქმედების დაცვის აღმინდონის ტელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქმინის სანდერული სენატის საკონსილიო დაკავშირების მოუწვერული კუბ-გეერდზე info@napr.gov.ge

დანართი 5: საკადასტრო გეგმა



საქართველოს 0-ესტოციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის მროველი სააგენტო
საკადასტრო გეგმა

90°06' ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 72 10 01 135
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882015475974
90°06' ნაკვეთის ფართი: 5500 მ²
დანიჭულება: არასასრულ-სამშრომელი
კატეგორია: 24.08.15
მომზადების თარიღი:

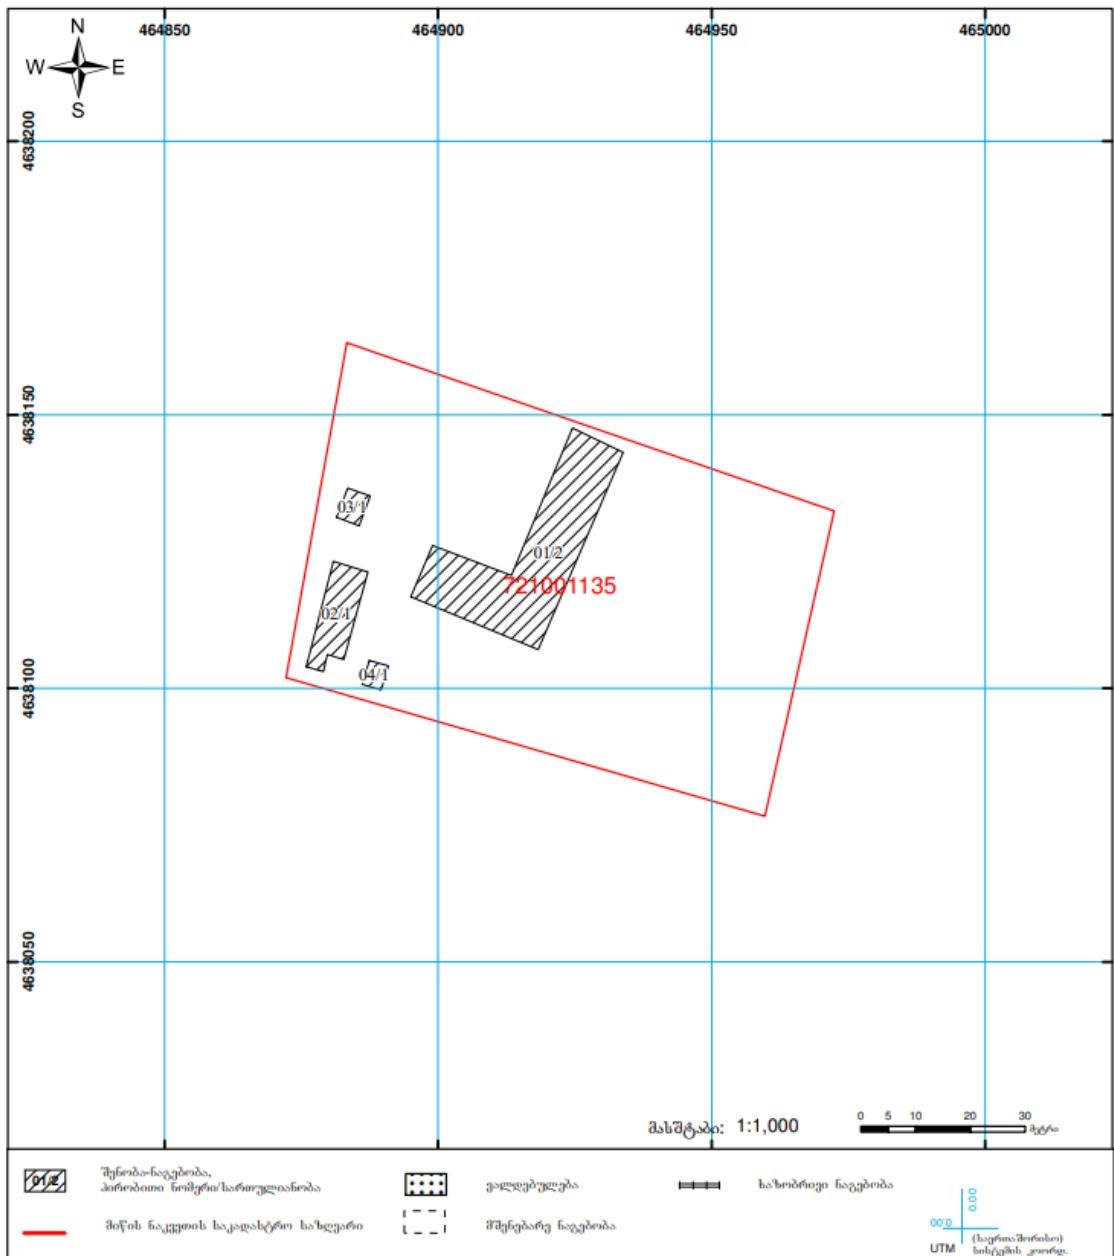

საჯარო რეესტრის გრანტიდან სამუშავებელი: მიღების 0102 წლ. ნოვემბრის შესაბამის ქ. 2 ტელ: (995 32) 91 04 27; ფაქს: (995 32) 91 03 41
მცხვარის სამინისტროს სამსახური, ქ. მცხვარი, 3003 მცხრას ქ. № 17

www.napr.gov.ge

დანართი 6: ობიექტის ფოტოები



დანართი 7: საპროექტო ნახატები (3 დ ვიზუალიზაცია და სხვ.)



დანართი 8: საჯარო კონსულტაციის ოქმი

2023 წლის 12 აპრილი

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

პროექტი: ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი (საქართველო I2Q)

ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

საჯარო კონსულტაცია

პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშის და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის განსახილველად

2023 წლის 12 აპრილს, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ორგანიზება გაუკეთეს საჯარო კონსულტაციას, რათა განხორციელებულიყო პროექტის “ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” და მისთვის მომზადებული გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშის და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ციხისძირის საჯარო სკოლის შენობაში. შეხვედრის ადგილი შეირჩა პროექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით. საკონსულტაციო შეხვედრის დეტალები (თარიღი, დრო და საკონტაქტო ინფორმაცია) განცხადებაში იყო შეტანილი. განცხადებები განთავსდა ქვე-პროექტის მომიჯნავე ტერიტორიაზე, სკოლის საინფორმაციო დაფაზე და მგფ-სა და განათლების სამინისტროს ვებ-გვერდებზე.

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაოებთან, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელ უარყოფით/დადებით ზემოქმედებასთან და მათი თავიდან აცილების გზებთან და საშუალებებთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე დამსწრეები ციხისძირის საჯარო სკოლის მხრიდან:

ინგა ტატიშვილი— ციხისძირის საჯარო სკოლის დირექტორი

ქეთი ოქრუაშვილი;

აინურა აბდიევი;

ნინო ნიკოლიშვილი;

იზა ესიტაშვილი;

ანა აბულაშვილი;

ნანა აბუაშვილი;

ნათია ჩაბიევი;

ინგა;

მარიამ შარიფაშვილი;

თამარ თოლორაია;

ლამარა ჩანთარია ;

მზევინარ მეშველიანი;

თეა ნებიერიძე;

მაია ბეგაძე;

თამარ ნიჟარაძე;

გიორგი მჭედლიშვილი;

შორენა ბაქრაძე;

ლალი ოსიპოვი;

ნათია ბედნიანაშვილი;

საიდა ნასიბოვი;

მამუკა ჯელალოვი;

ჯამბულ აბდიევი;

თამაზ ათვაზოვი;

თამუნა აბრამიანი;

ნუნუ ჩხეიძე;

რამაზი მიშა.

შეხვედრაზე დამსწრეები მცხეთის მუნიციპალიტეტის მხრივდან:

დიმიტრი ზურაბიშვილი – მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი;

თამაზ ფოლადაშვილი;

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები:

მარინე ჟვანია – საკონტაქტო პირი საჩივრების მოგვარების მექანიზმის ფარგლებში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები:

სალომე მეფარიშვილი - გარემოს დაცვის სპეციალისტი;

ნონა ჭიჭინაძე – სოციალური და გენდერული საკითხების სპეციალისტი;

დავით არსენაშვილი – განსახლების კონსულტანტი, (საკონტაქტო პირი საჩივრების მოგვარების მექანიზმის ფარგლებში);

შეხვედრა გახსნა სალომე მეფარიშვილმა, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეებს მუნიციპალური განვითარების ფონდის და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები გააცნო და წარმოადგინა ინფორმაცია შეხვედრის მიზნების შესახებ. მან ასევე წარმოადგინა ქვეპროექტი და დეტალურად განიხილა ქვეპროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მან ასევე მოკლედ მიმოიხილა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, და სამუშაოების განხორციელების ეტაპები: პირველ ეტაპზე მოხდება დემონტაჟი, რის შემდგომაც შესრულდება კონსტრუქციული გამაგრების და **MEP** სამუშაოები. ბოლო ეტაპზე შესრულდება კეთილმოწყობის და გამწვანებების სამუშაოები.

სალომე მეფარიშვილმა განმარტა, რომ საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, ქვეპროექტი არ საჭიროებს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, თუმცა ქვეპროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, მგთ ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს შესაბამისობა მსოფლიო ბანკის სოციალურ და გარემოს დაცვის პოლიტიკასთან. სალომე მეფარიშვილმა წარმოადგინა როგორც მსოფლიო ბანკის სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურები, ასევე აღნიშნული ქვეპროექტისთვის მომზადებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP).

სალომე მეფარიშვილმა მოკლედ მიმოიხილა გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის (ESMP) შინაარსი და სტრუქტურა. მან წარმოადგინა აღნიშნული დოკუმენტით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი, სოციალური, საზოგადოებრივი და შრომის მართვის ღონისძიებები. აღნიშნული დოკუმენტის (ESMP) არსებითი ნაწილის შესაბამისად, დამსწრე საზოგადოებას მან აცნობა წარმოდგენილ ქვეპროექტთან დაკავშირებული შესაძლო გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შესახებ და მოახდინა მათი ინფორმირება შემარბილებელი ზომების თაობაზე, შესაბამისი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების, ან მინიმუმადე დაყვანის მიზნით.

მან აღნიშნა, რომ პროექტის მიხედვით, ტერიტორიაზე ხის ჭრა გათვალისწინებული არ არის, სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში მოხსნილი ჰუმუსოვანი ფენა დროებით განთავსდება სამშენებლო ტერიტორიაზე, ამოღებული გრუნტი კი სრულად იქნება გამოყენებული საპროექტო ტერიტორიის გამწვანების სამუშაოების წარმოებისას.

სალომე მეფარიშვილმა აღნიშნა, რომ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (EMP) სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. შესაბამისად, წარმოდგენილი გეგმით (ESMP) გათვალისწინებული ზომების გატარება სოციალური, ბუნებრივი გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, მშენებელი კონტრაქტორის ვალდებულებას წარმოადგენს. სალომე მეფარიშვილმა ასევე მიმოიხილა ქვეპროექტის განხორციელების დროს შესასრულებელი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ასპექტები, გარემოს დაცვის ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი მხარეების საკითხი და ანგარიშგების პროცედურები - ქვეპროექტის განხორციელების პროცესში.

დავით არსენაშვილმა აღნიშნა, რომ პროექტის თანახმად, ქვეპროექტით მიწის შეძენა ან განსახლება, ისევე როგორც ეკონომიკური ადგილმონაცვლეობა (მაგ. ოფიციალური ან არაოფიციალური გამყიდველების მიერ), გათვალისწინებული არ არის. მან ასევე აღნიშნა, რომ თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოები შესრულდება სასწავლო პროცესის პარალელურად, სკოლის პერსონალი და ბავშვები დროებით გადავლენ ალტერნატიულ სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უზრუნველყოფს ყველა დროებითი ღონისძიების გატარებას, სასწავლო პროცესის წარმართვისა და მოსწავლეების ალტერნატიულ ლოკაციებამდე ტრანსპორტირებისთვის, საჭიროების შესაბამისად. დამსწრე საზოგადოებას მან აცნობა მგფ-ში შექმნილი საჩივრების მოგვარების მექანიზმის პროცედურების და აღნიშნული მექანიზმის მნიშვნელობის შესახებ. დამსწრე საზოგადოებას მან ასევე გაუზიარა ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ, გარემოს დაცვასთან, ან სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით საჩივრების წარმოქმნის და/ან შენიშვნების და შემოთავაზებების გამოხატვის სურვილის შემთხვევაში. შეხვედრაზე დავით არსენაშვილმა წარმოადგინა ინფორმაცია საინფორმაციო დაფების თაობაზე, სადაც მოცემულია საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ. ნომრები და ელ. ფოსტა) საჩივრების მოგვარების მექანიზმთან დაკავშირებით. შეხვედრის მონაწილეებს ეცნობათ ასევე საჩივრების ყუთების შესახებ. აღნიშნული ყუთები და საჩივრების ფორმები - ანონიმური საჩივრებისთვის, განთავსდება ყველა ობიექტზე. დამსწრებს დავით არსენაშვილმა დაურიგა საჩივრების მოგვარების მექანიზმის საკონტაქტო ინფორმაციის ამსახველი ბროშურები.

ნონა ჭიჭინაძემ დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარმოადგინა ინფორმაცია საზოგადოებრივი ჩართულობის, უკუგების მექანიზმების და გენდერთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ. მონაწილეებს დაურიგდათ ბროშურები შევიწროების და ძალადობის შესახებ. შეივსო სოციალურ და გენდერის საკითხებთან დაკავშირებული კითხვარიც.

შეხვედრის დასასრულს, დამსწრე საზოგადოებამ მონაწილეობა მიიღო წარმოდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით გამართულ კითხვა/პასუხის სესიაში; მათ დასვეს შემდეგი კითხვები:

კითხვები და შენიშვნები:	პასუხები და კომენტარები:
როდის დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები?	სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება სატენდერო პროცედურის დასრულების შემდეგ.
სად გაგრძელდება სასწავლო პროცესი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში?	სკოლის პერსონალი და ბავშვები დროებით გადავლენ მუხრანის N1 საჯარო სკოლაში.

შეხვედრის მონაწილეებმა გამოხატეს მადლიერება და აღნიშნეს, რომ წარმოდგენილი ქვეპროექტის განხორციელება მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.

მონაწილეებმა დადებითი დამოკიდებულება გამოხატეს ქვეპროექტის მიმართ.

ფოტო მასალა თანდართულია.



დამსწრეთა ნუსხა:

მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის რეანიტიფირება/რეაბილიტაცია Reconstruction/Rehabilitation for Tskhisdziri Public School (Mtskheta Municipality)					
შენდებოსთვის დამსწრეთა რეკორდის ფარგლები Public Consultation Meeting - 12.04.2023					
List of Attendees					
#	სახელი და გვარი / Full Name	მისამართი / Address	ინსტიტუცია / Organization	საკონტაქტო ინფორმაცია / Contact Information	ხელმოწერა / Signature
1	ქარა მუხრანული	საქართველოს სამართლის სამსახურის მიერ მიღებული სკოლი		538 300 746	
2	არეგი აბდული	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	599 07 90 80	
3	ნინო ჩუკულაძე	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	555 12 08 06	
4	აბ. ერებული	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	577 62 57 65	
5	ართ გუგულაძე	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	577 62 57 58	
6	ნინო მუხრანული	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	577 62 63 41	
7	ნინო გუგულაძე	საქართველოს სამართლის მიერ მიღებული სკოლი	ინტერნაციული სკოლი	577 26 13 92	

8	ანგელი ანგელი	ანგ. ანგელი	ინტერნაციული სკოლა	595 95-6045	
9	გიორგი ჭავჭავაძე	გიორგ. ჭავჭავაძე	ინტერნაციული სკოლა	577 62 63 53	
10	ოთამი ოთამი	ოთამი აზერი	ინტერნაციული სკოლა	577 62 57 68	
11	გურა ჩიგარია	გურა აზერი	ინტერნაციული სკოლა	577 61 97 57	
12	გიორგი ჭავჭავაძე	გიორგ. ჭავჭავაძე	ინტერნაციული სკოლა	577 62 57 78	
13	არა ბულგარი	არა ბულგარი	ინტერნაციული სკოლა	595 95-60-46	
14	არა გუგულაძე	არა გუგულაძე	ინტერნაციული სკოლა	577 625-770	
15	ოთამ ოთამი	ოთამ აზერი	ინტერნაციული სკოლა	577 625-777	
16	გიორგი ჭავჭავაძე	გიორგ. ჭავჭავაძე	ინტერნაციული სკოლა	577 62-54-54	
17	მარია აზერია	მარია აზერია	ინტერნაციული სკოლა	577 62 57 48	
18	დავით მარაშვილი	დავით მარაშვილი	ინტერნაციული სკოლა	577 640 890	
19	ნინო ჭავჭავაძე	ნინო ჭავჭავაძე	ინტერნაციული სკოლა	577 77 58 47	

20	ԱՆԴՐԻԱՆ ԳԵՐԵՎԻ ՄԱԿԱՐՅԱՆ	ՀԵՂԵԿԻ ՎՐԱՆՈՒԹՅԱՆ	Վահագին	(31001031304) 539993697.	ՀՀ
21	ՋԱՋԱՎ ՀՐԱՄԱՆ	ՋԱՋԱՎ Լ.Պ.	Վահագին	555 10 88 20 (31001019475)	ՀՀ
22	ՀԱՅՐԱ ՔԵՐՈՍՅԱՆ	ՀԱՅՐԱ Լ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ	Վահագին	(31001008308) 577 72 41 90	ՀՀ
23	ՀԱՅՐԱ ՀԱՅՐԱ ՀԱՅՐԱ	ՀԱՅՐԱ Լ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ	Վահագին	557 910004 (31001005328)	ՀՀ
24	ԱՎԵՐՅԱՆ ՎԵՐՅԱՆ	ԱՎԵՐՅԱՆ ԼԱՄԱՆ	Վահագին	557 56-55-07	ՀՀ
25	ԾՐԵՐ ՔԵՐՈՍՅԱՆ	ԾՐԵՐ ԼԱՄԱՆ	Վահագին	577-62-57-41	ՀՀ - Ա.Ե.Ճ
26	ԽԱՎԻ ՅԱԴ	ԽԱՎԻ ՅԱԴ	Վահագին	555-15-86-35	ՀՀ
27	ԱՎԵՐՅԱՆ ՎԵՐՅԱՆ	ԱՎԵՐՅԱՆ ԼԱՄԱՆ	Վահագին	577 607125	ՀՀ
28					
29					
30					

Քարմուգենունու ռյամու մոմիագեթնուա մցու-ու Քարմուգենուա մույր, 2023 թ. 17 ապրունք.
