

პროექტის ნომერი: P53118-001 LCIP

ანგარიშგების პერიოდი: 2023 წ. იანვარი-ივნისი
სემესტრული ანგარიში N3

2023 წლის ივნისი

საქართველო: საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი
განვითარებისთვის

(აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული)

მომზადებულია:

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ - აზიის განვითარების ბანკისთვის.

წარმოდგენილი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიში სესხის ამღების საკუთრებას
წარმოადგენს. დოკუმენტში მოცემული მოსაზრებები არ არის აუცილებელი, რომ ასახავდეს
აზიის განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს, ხელმძღვანელობის ან პერსონალის
მოსაზრებებს, და შესაძლოა ატარებდეს წინასწარ ხასიათს.

აღნიშნულ დოკუმენტში მოხსენიებულ კონკრეტულ ტერიტორიასთან ან გეოგრაფიულ
არეალთან მიმართებაში, აზიის განვითარების ბანკის განზრახვას არ წარმოადგენს ხსენებულ
ტერიტორიასთან ან არეალთან დაკავშირებით, რაიმე სახის სამართლებრივ ან სხვა სტატუსთან
დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა.

შენიშვნა: ქართულ და ინგლისურ ვერსიებს შორის განსხვავების შემთხვევაში, გთხოვთ,
იხელმძღვანელოთ ინგლისური დოკუმენტით.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ)
ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია
მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სარჩევი

1 შესავალი	10
1.1 პრემბულა	10
1.2 ინფორმაცია სათაურების შესახებ.....	10
2 პროექტის აღწერა და მიმდინარე აქტივობები	15
2.1 პროექტის აღწერა	15
2.1.1 ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა.....	1
2.1.2 ახალციხის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა.....	2
2.1.3 რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	3
2.1.4 საცურაო აუზის მშენებლობა ქუთაისში	4
2.1.5 ძველი ანაგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	5
2.1.6 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში.....	6
2.1.7 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში.....	7
2.1.8 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში.....	8
2.1.9 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში.....	9
2.1.10 საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში.....	10
2.1.11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში	11
2.1.12 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდიჭყონში	11
2.1.13 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სუფსაში	12
2.1.14 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში	13
2.1.15 საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში	14
2.1.16 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში.....	15
2.1.17 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში.....	16
2.1.18 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყაროში.....	17
2.1.19 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში	18
2.1.20 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკში	19
2.1.21 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში.....	20
2.1.22 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში.....	21
2.1.23 საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში.....	22
2.1.24 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დარჩელში	23
2.1.25 სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია.....	23
2.1.26 ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ზუგდიდში	28
2.2 პროექტების კონტრაქტები, ქვეკონტრაქტორები და მენეჯმენტი	29
2.2.1 ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი	34
2.2.2 ქუთაისის საცურაო აუზი	34
2.2.3 რუსთავისა და ახალციხის სპორტული კომპლექსი	35
2.2.4 საბავშვო ბაღი ძველ ანაგაში (სიღნაღი), საბავშვო ბაღი ქვემო ბოდბეში (სიღნაღი), საბავშვო ბაღი ჭიაურში (ლაგოდეხი)	36
2.2.5 საბავშვო ბაღი ქუთაისში, საბავშვო ბაღი კურდღელაურში (თელავი)	37
2.2.6 საბავშვო ბაღი ჭაბუკიანში, საბავშვო ბაღი ჭითაწყაროში, საბავშვო ბაღი რუხში, საბავშვო ბაღი კეზერაშვილი ბანძაში	38
2.2.7 საბავშვო ბაღი ვარდისუბანში, საბავშვო ბაღი წინწყაროში, საბავშვო ბაღი შამგონაში, საბავშვო ბაღი დარჩელში	39
2.2.8 საბავშვო ბაღი დიდიჭყონში, საბავშვო ბაღი სუფსაში, საბავშვო ბაღი ხაჯალიაში, საბავშვო ბაღი აგარაში	40
2.2.9 საბავშვო ბაღი ფოთში, საბავშვო ბაღი სენაკში	41
2.2.10 სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია	42
2.2.11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში	44
2.2.12 ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა	45
2.3 პროექტის ღონისძიებები მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში	51
2.3.1 ზუგდიდის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	51
2.3.2 ქუთაისის საცურაო აუზის მშენებლობა	51
2.3.3 რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	53
2.3.4 ძველი ანაგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა	Error! Bookmark not defined.
2.3.5 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში	56
2.3.6 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში	58
2.3.7 საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში	60
2.3.8 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში	61
2.3.9 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სუფსაში	63
2.3.10 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში	65
2.3.11 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდიჭყონში	67
2.3.12 საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში	69
2.3.13 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში	71
2.3.14 საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში	72
2.3.15 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში	73
2.3.16 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში	75
2.3.17 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყაროში	77
2.3.18 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში	79
2.3.19 საბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკში	81
2.3.20 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში	82
2.3.21 ახალციხის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	84
2.3.22 საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში	86
2.3.23 საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში	88
2.3.24 საბავშვო ბაღის მშენებლობა დარჩელში	90
2.3.25 ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია	91
2.3.26 ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ზუგდიდში	98
2.4 პროექტის გეგმის ცვლილებების აღწერა	100
3 გარემოს დაცვის ღონისძიებები	101

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

3.1	გარემოს დაცვის უსაფრთხოების ღონისძიებების ზოგადი აღწერა	101
3.2	ობიექტის ინსპექცია / აუდიტი.....	102
3.3	საკითხებზე თვალყურის დევნა (შეუსაბამობის შეტყობინებების საფუძველზე).....	103
3.4	გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება გარემოზე ან რისკები.....	113
	გარემოსდაცვითი მონიტორინგის შედეგები	115
3.5	მიმდინარე პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის მიმოხილვა	115
3.6	მატერიალური რესურსების გამოყენება	122
3.6.1	მიმდინარე პერიოდი	122
3.7.	ნარჩენების მართვა	124
3.7.1	მიმდინარე პერიოდი	124
3.8	ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	133
3.9	ტრენინგები	Error! Bookmark not defined.
4	სამშენებლო მოედანზე გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (SEMP) ფუნქციონირება .	200
4.1	სამშენებლო მოედანზე გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (SEMP) მიმოხილვა.....	Error! Bookmark not defined.
5	კარგი პრაქტიკა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა	202
5.1	კარგი პრაქტიკა.....	202
6	რეზიუმე და რეკომენდაციები.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.1	რეზიუმე.....	Error! Bookmark not defined.
6.2	რეკომენდაციები	Error! Bookmark not defined.

ცხრილის სია

ცხრილი 1. ქვეპროექტები სამშენებლო კომპანიების შესახებ ინფორმაციისა და განხორციელების ვადების შესახებ	15
ცხრილი 2. სპორტული კომპლექსებისა და საბავშვო ბაღების ორგანიზაციების გარემოსდაცვითი პერსონალის სია	47
ცხრილი 3. მიმდინარე აქტივობების პროგრესი	98
ცხრილი 4. ანგარიშგების პერიოდში მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი აღმოჩენები და შეუსაბამობები	103
ცხრილი 5. მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება ...	110
ცხრილი 6. მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება ...	112
ცხრილი 7: მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება ...	113
ცხრილი 8: მატერიალური რესურსების გამოყენება	Error! Bookmark not defined.
ცხრილი 9. წარმოქმნილი ნარჩენები ანგარიშგების პერიოდში.....	131

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათების სია

სურათი 1. ადგილის მდებარეობა - ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი.....	1
სურათი 2. ადგილის მდებარეობა– ახალციხის სპორტული კომპლექსი	Error! Bookmark not defined.
სურათი 3. ადგილის მდებარეობა– რუსთავის სპორტული კომპლექსი.....	Error! Bookmark not defined.
სურათი 4. ადგილის მდებარეობა - ქუთაისის საცურაო აუზი	5
სურათი 5. ადგილის მდებარეობა - ძველი ანაგის საბავშვო	6
სურათი 6. ადგილის მდებარეობა – საბავშვო ბაღი ქვემო ბოდბეში.....	7
სურათი 7. ადგილის მდებარეობა საბავშვო ბაღი ჭიაურში	8
სურათი 8. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ჭაბუკიანში	9
სურათი 9. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ვარდისუბანში	9
სურათი 10. ადგილის მდებარეობა – საბავშვო ბაღი კურდღელაურში	10
სურათი 11. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი წინწყაროში	11
სურათი 12. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი დიდიჭყონში.....	12
სურათი 13. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი სუფსაში	12
სურათი 14. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ხაჯალიაში	13
სურათი 15. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი შამგონაში	14
სურათი 16. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ფოთში.....	15
სურათი 17. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი რუხში.....	16
სურათი 18. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ჭითაწყარში	17
სურათი 19. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ბანძაში	18
სურათი 20. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი სენაკში	19
სურათი 21. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ქუთაისში.....	20
სურათი 22. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ფარცხისში.....	21
სურათი 23. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი აგარაში.....	22
სურათი 24. ადგილის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი დარჩელში	23
სურათი 25. სოფ. ველისციხის ლოკაცია.	24
სურათი 26. შენობების გეგმა, რომლებსაც პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს	25
სურათი 27. ლოკაცია თეატრისა და პარკის, რომლებსაც რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს ...	25
სურათი 28. სარეკრეაციო პარკის ლოკაცია	26
სურათი 29. ავტობუსის გაჩერების ლოკაცია, პარკინგი და WWT-ები	27
სურათი 30. ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის ადგილმდებარეობა ზუგდიდში	29
სურათი 31. სამშენებლო კომპანია „საბა ქონსტრაქშენის“ საორგანიზაციო გრაფიკი	34
სურათი 32. სამშენებლო კომპანია შპს „არალის“ საორგანიზაციო გრაფიკი LLC.....	36
სურათი 33. სამშენებლო კომპანია შპს „ინსტალის“ საორგანიზაციო გრაფიკი LLC.....	37
სურათი 34. სამშენებლო კომპანია „სათავე პლუსის“ საორგანიზაციო გრაფიკი	37

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 35. სამშენებლო კომპანია „აბეკას“ საორგანიზაციო გრაფიკი.....	38
სურათი 36. სამშენებლო კომპანია „პროდუს ინვესტმენტის“ საორგანიზაციო გრაფიკი.....	40
სურათი 37. სამშენებლო კომპანია „ჯორჯიან კონსტრაქშენ გრუპის“ საორგანიზაციო გრაფიკი	41
სურათი 38. სამშენებლო კომპანია „პრაიმ ბეტონის“ საორგანიზაციო გრაფიკი	42
სურათი 39. სამშენებლო კომპანიასთან საინფორმაციო შეხვედრა.....	42
სურათი 40. სამშენებლო კომპანიის საორგანიზაციო გრაფიკი	43
სურათი 41. სამშენებლო კომპანიის საორგანიზაციო გრაფიკი	45
სურათი 42. სს მეთაგ ინშაათ თიჯარეთის საქართველოს ფილიალის საორგანიზაციო გრაფიკი	46
სურათი 43. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	53
სურათი 44. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	54
სურათი 45. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	Error! Bookmark not defined.
სურათი 46. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	58
სურათი 47. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	59
სურათი 48. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	61
სურათი 49. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	62
სურათი 50. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	64
სურათი 51. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	66
სურათი 52. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	68
სურათი 53. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	70
სურათი 54. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	72
სურათი 55. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	73
სურათი 56. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	75
სურათი 57. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	76
სურათი 58. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	78
სურათი 59. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	80
სურათი 60. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	82
სურათი 61. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	83
სურათი 62. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	87
სურათი 63. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	89
სურათი 64. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა	91
სურათი 65. ანგარიშების პერიოდში მიმდინარე სამუშაოების და მოქმედი სამუშაო ტერიტორიის არსებული მდგომარეობა	92
სურათი 66. ანგარიშების პერიოდში მიმდინარე სამუშაოების და მოქმედი სამუშაო ტერიტორიის არსებული მდგომარეობა	100
სურათი 67. აზომვითი პუნქტები სოფელ ველისციხეში.....	Error! Bookmark not defined.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აბრევიატურები

აგბ	აზიის განვითარების ბანკი
CAR	მაკორექტირებელი ქმედებების ანგარიში
CC	სამშენებლო კომპანია
CSC	სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი
EA	შემსრულებელი სააგენტო
EARF	გარემოს შეფასებისა და მიმოხილვის ჩარჩო
EIA	გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
EHS	გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა
EMP	გარემოს დაცვის მართვის გეგმა
ES	გარემოსდაცვითი და სოციალური მენეჯერი
HSES	ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, გარემო და სოციუმი
IA	განმახორციელებელი სააგენტო
IEE	საწყისი გარემოსდაცვითი გამოკვლევა
IR	ინსტრუქციის ანგარიშგება
LCIP	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა
MDF	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
რგის	რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
NACHP	საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
PPE	პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

SAEMR	ნახევარ წლიანი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის განხილვა
SPS	უსაფრთხოების პოლიტიკის განაცხადი
SSEMP	სამშენებლო მოედანზე გარემოს დაცვის მართვის გეგმა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

1 შესავალი

1.1 პრეამბულა

1. წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს ნახევარ წლიან გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიმოხილვას (SAEMR) საცხოვრებლად ვარგის ქალაქებში საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის.
2. წინამდებარე ანგარიში არის მე-3 (მესამე) ნახევარწლიანი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიმოხილვა პროექტისთვის, რომელიც მოიცავს იანვარი-ივნისის პერიოდს.

1.2 ინფორმაცია სათაურების შესახებ

3. აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული ყველა პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის განაცხადს (SPS), 2009 წ. ADB SPS მიზნად ისახავს განვითარებად წევრ ქვეყნებს ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შემცირებას განვითარების პროექტებში და შეამციროს და მინიმუმამდე დაიყვანოს პროექტის უარყოფითი ზემოქმედება ადამიანებსა და გარემოზე. SPS ვრცელდება ADB-ს მიერ მხარდაჭერილ ყველა პროექტზე და ADB თანამშრომლობს მსესხებლებთან, რათა განხორციელდეს პოლიტიკის პრინციპებისა და მოთხოვნების პრაქტიკაში გამოყენება პროექტის განხილვისა და ზედამხედველობის, და შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის საშუალებით. SPS ასევე უზრუნველყოფს პლატფორმას დაზარალებული ადამიანებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობისთვის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებაში.
4. საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (LCIP) კლასიფიცირებულია როგორც B კატეგორია აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის განაცხადზე, შესაბამისად, საჭიროა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასება (IEE), პროექტის ფარგლებში ღონისძიებების განსახილველად. ყველა IEE განხილულია შესაბამის მონაწილე მხარეებთან.
5. IEE-ები, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (EMP) ჩათვლით, კონტრაქტორების სახელშეკრულებო დოკუმენტის განუყოფელი ნაწილია და მისი შესრულება სავალდებულოა. ამიტომ, კონტრაქტორებს მოეთხოვრათ საპროექტო ობიექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (SSEMP) შედგენა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.
6. ანგარიშგების პერიოდში პროექტების სამშენებლო ტერიტორიებზე განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:
 - i. **ზუგდიდის სპორტული კომპლექსის** პროექტის კონტრაქტორად მოხდა შპს „საბა კონსტრაქშენის“ შერჩევა, შესაბამისად, დაიწყო წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები.
 - ii. **ახალციხის სპორტული კომპლექსის** პროექტის კონტრაქტორად მოხდა შპს „არალის“ შერჩევა, რომელიც ამჟამად ახორციელებს სამშენებლო სამუშაოებს: გადახურვის და შესასვლელის მოწყობის და სხვა სახის სამუშაოებს. მიმდინარეობს შიდა მოპირკეთების სამუშაოები პირველ და მეორე სართულებზე, ასევე კედლის მობათქაშების სამუშაოები, იატაკის იზოლაციის სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობს სახურავის პარაპეტების მოწყობა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- iii. **ქუთაისის მთავარი საცურო აუზის** შენობის მშენებლობა. მშენებლობა დასრულებულია, განხორციელდა გარე პერიმეტრის კეთილმოწყობა და გამწვანება. საცურო აუზის გახნა მოხდა საზეიმო ვითარებაში (18.05.2023). **ქუთაისის მთავარი საცურო აუზის** გახსნის ცერემონიალს ესწრებოდნენ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.
- iv. **რუსთავის სპორტული კომპლექსის** შენობის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები თითქმის დასრულებულია და ჩატარდა შენობის შიდა და გარე სამუშაოები. გარდა ამისა, დაწყებულია საპროექტო ტერიტორიის მოწყობა შემოღობვის, გადახურვისა და შესასვლელი კარიბჭის სამონტაჟო სამუშაოების ჩათვლით. სამშენებლო ტერიტორიაზე განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: პარაპეტის რკინა-ბეტონის სვეტების მოწყობა, პარაპეტის ბლოკების მოწყობა, გადახურვის იზოლაცია, ე.წ. სენდვიჩის პანელებით შეფუთვა, ფასადის მოპირკეთება, შესასვლელის ფილის დაბეტონება, მოაჯირების დაბეტონება, კედლების მობათქაშება, ლიფტის შახტის მოწყობა, შიდა კედლების შეფუთვა ფიცრებით, შიდა კიბეების მოპირკეთება, დაერთება წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელებზე, ელ. მომარაგება, სუსტი დენების უზრუნველყოფა, შიდა კიბეების მოწყობა, იზო-ალუმინის კარების და ფანჯრების მოწყობა, და გარე კანალიზაციის შეფუთვა.
- v. **ანაგას საბავშვო ბაღის** სამშენებლო მოედნის მიწის სამუშაოები და კონსტრუქციული სამუშაოები დასრულებულია. დაწყებულია 1 სართულზე გარე კედლებისა და ბოილერის შენობის მოწყობა. ამჟამად მიმდინარეობს სვეტების და დიაფრაგმების ყალიბების მოწყობის სამუშაოები, ასევე სვეტების და დიაფრაგმების დაბეტონების სამუშაოები.
- vi. **ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღის** პროექტში დასრულდა მიწის, კონსტრუქციული სამუშაოები, გარე/შიდა კედლებისა და ტიხრების, სახურავისა და ელექტრო, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიციონერების ობიექტების მოწყობა. მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების, პარაპეტის მოჩარჩოების და პირველი სართულის კედლების შეღებვის სამუშაოები.
- vii. **ჭიაურის საბავშვო ბაღის** პროექტში მიწის სამუშაოები, კონსტრუქციული სამუშაოები, გარე კედლების მოწყობა (1 სართული) დასრულდა და განხორციელდა შიდა კედლებისა და ტიხრების, საქვების შენობის, ელექტრო, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიციონერების ობიექტების მოწყობა. მიმდინარეობს მეორე სართულის კედლების შელესვის, წყალსადენი მილების და ბოილერის აგრეგატების მოწყობის სამუშაოები, ასევე წყალმომარაგების მილების მოწყობის და ტექნიკური სართულის კედლების მშენებლობის სამუშაოები.
- viii. **ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღის** პროექტში დასრულდა მიწის, კონსტრუქციული სამუშაოები, გარე კედლების მოწყობა და დაიწყო შიდა კედლებისა და ტიხრების, ბოილერის შენობის, ელექტრომოწყობილობის, სათამაშო მოედნებისა და ფარდულების მოწყობა. მიმდინარეობს წყალმომარაგების და კანალიზაციის მილების მოწყობა სველ ადგილებში, ასევე ფასადის დათბუნების მოწყობა ქვით, წყლის რეზერვუარის კედლების ყალიბების მოწყობა, ქვიშა-ცემენტის ხსნარით XPS ფილების მოწყობა სახურავზე, იატაკების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით - მეორე სართულზე, ფასადის მოპირკეთება წებოვანი ცემენტით ცხაურაზე, ფასადის შეღებვა.
- ix. **ვარდისუბნის საბავშვო ბაღის** პროექტში სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის შემოღობვა, მიმდინარეობს სამშენებლო ტერიტორიაზე. ჩატარდა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

გარკვეული შიდა სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები დეფექტების აღმოფხვრის მიზნით. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.

- x. სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი მიმდინარეობს **კურდღელაურის საბავშვო ბაღის** მშენებლობაზე. ჩატარდა გარკვეული შიდა სამუშაოები. განხორციელდა შემოღობვის, ბოილერის შენობის, ელექტრო, წყლის ობიექტების, სათამაშო მოედნებისა და ფარდულების მოწყობა. მიმდინარეობს შენობის და ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნარჩენებისგან, ასევე ეზოს დაბეტონება B24-ით, მოაჯირების შეფუთვა და მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილებით, აბაზანების გაწმენდა, სართულებზე მტვრის მოცილება, ეზოს დონის აწევა ღორღით - შესაბამის დონემდე და გამაგრება მზა ბადეებით.
- xi. სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი მიმდინარეობს **წინწყაროს საბავშვო ბაღის** მშენებლობაზე. ჩატარდა გარკვეული შიდა სამუშაოები. მოეწყო გათბობის, ვენტილაციის, კონდიციონერების ელექტრო, წყლის ობიექტების და სათამაშო მოედნები. მიმდინარეობს ელ. კაბელების და განათების მოწყობის სამუშაოები, ასევე სიგნალიზაციის სისტემის, მეტალის კარებების, კიბეების და მოაჯირების შეღებვის სამუშაოები, მიმდინარეობს ვინოპლასტის მოწყობა, შიდა კედლების საღებავის მეორე ფენის წასმა, სათამაშო მოედნების მოწყობა/აწყობა, ხის ჭერების მოწყობა გადახურულ ადგილებზე, კერამიკული პლინტუსის მოწყობა შენობის გარე პერიმეტრზე, საკომპლექტო ნაწილების/წყალგაყვანილობის მოწყობა საქვების შენობაში, საშხაპის მოწყობა. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.
- xii. **დიდიჭყონის საბავშვო ბაღის** პროექტში დასრულდა მიწის, კონსტრუქციული (1 სართული) და შემოღობვის სამუშაოები და დაიწყო გარე, შიდა კედლებისა და ტიხრების, ბოილერის შენობის, ჭაბურღილის კონსტრუქციული სამუშაოები (მე-2 სართული) და ტერიტორიის გამწვანება. ბაღის შენობა: შიდა კედლების (მეორე სართულზე) შეღესვა, კერამიკული ფილების მოწყობა აბაზანების კედლებზე, კერამო-გრანიტის იატაკების მოწყობა, ფასადის მოპირკეთება, ვერტიკალური გეგმარება - შიდა გზებზე ბორდიურების და საძირკვლების მოწყობა. სათამაშო მოედნების საძირკვლის მოწყობა, წყალმომარაგება-კანალიზაციის, ელ. გაყვანილობის სამუშაოები.
- xiii. სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი მიმდინარეობს **სუფსის საბავშვო ბაღის** მშენებლობაზე. განხორციელდა შემოღობვის, ბოილერის შენობის, ელექტრო, და წყლის ობიექტების მოწყობა. მოაჯირების დაბეტონება, კედლების შეღესვა, ლიფტის შახტის მოწყობა, შიდა კედლების შეფუთვა ხის ფიცრებით, შიდა კიბეების მოპირკეთება, დაერთება წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელებზე, ელ. მომარაგება, სუსტი დენების, ვენტილაციის მოწყობა, შიდა კიბეების მოწყობა, იზო-ალუმინის კარებების და ფანჯრების მოწყობა, გარე კანალიზაციის მოწყობა. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.
- xiv. სამშენებლო მოედანზე **ბანძის საბავშვო ბაღის** სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია, შემოღობვის ჩათვლით. განხორციელდა გადახურვის, წყლის ობიექტების, სათამაშო მოედნების მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება. მიმდინარეობს (ფასადის) გარე კედლების მოპირკეთება, ფილების მოწყობა სველ წერტილებში.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- xv. სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის შემოღობვა, მიმდინარეობს **ხაჯალიას საბავშვო ბაღის** მშენებლობაზე. მოხდა საქვების შენობის, ელექტრო, წყლის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიციონერების ობიექტების მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება. სუსტი დენების, ვენტილაციის შეფუთვა, შიდა კიბეების მოწობა, იზო-ალუმინის კარებების და ფანჯრების მოწყობა, გარე კანალიზაციის შეფუთვა. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.
- xvi. **შამგონას საბავშვო ბაღის** სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია, მათ შორის შემოღობვა. მოხდა ელექტრო, წყლის, გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიციონერების ობიექტების მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება. აღნიშნულ პერიოდში მოხდა გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა: 1. ტუალეტი და ნიჟარა შშმ პირებისთვის მოეწყო შესაბამისი სპეციალური სტანდარტების (მეორე) შესაბამისად. 2. კედლებზე დამონტაჟდა საშხაპეების შესაბამისი სამაგრების მონტაჟი; 3. გრანიტის ფილების დაგება ტექნიკური სართულის იატაკზე დასრულდა. მშენებლობის შემდგომი აუდიტის ანგარიში წარმოდგენილია დანართის სახით.
- xvii. **ფოთის საბავშვო ბაღის** პროექტში მიწის, კონსტრუქციული სამუშაოები (ქვედა სართული, 1-ელი სართული) დასრულდა და დაწყებულია ბოილერის შენობის მოწყობა. ტიხრების მოწყობა ბლოკებით, შიდა კედლების მოპირკეთება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, შიდა კედლების მოპირკეთება ბათქაშით, ხარაჩოების მოწყობა.
- xviii. **რუხის საბავშვო ბაღის** პროექტში მიწის, კონსტრუქციული სამუშაოები დასრულდა. მიმდინარეობს ფასადის მეტალის დეტალების დამუშავება (e-mailing). დაერთების სამუშაოების დასრულება - 70%, 2. სამონტაჟო სამუშაოები (ბოქსების ჩასმა) დასრულებულია 40%-ით.
- xix. **ჭითაწყარის საბავშვო ბაღის** სამშენებლო მოედანზე სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია, მათ შორის შემოღობვა. განხორციელდა გადახურვის, წყლის ობიექტების, სათამაშო მოედნების მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება. მიმდინარეობს შიდა კედლების გათეთრების/მობათქაშების სამუშაოები ორივე სართულზე, 60% დასრულებულია. მიმდინარეობს სამზარეულოს კედლების ფილებით მოწყობა პირველ სართულზე, დასრულებულია 15%-ით. დაიწყო ლიფტის დამონტაჟება, დასრულებულია 10%-ით. ასევე მიმდინარეობს ე.წ. არმსტრონგის ჭერების მოწყობა პირველ სართულზე, დასრულებულია 10%-ით.
- xx. **სენაკის საბავშვო ბაღის** პროექტში მიწის სამუშაოები და საძირკველის მოწყობა დასრულდა. განხორციელდა კონსტრუქციული სამუშაოების (ქვედა სართული) და საყრდენი კედლების მოწყობა. იატაკის და მოაჯირის ყალიბების მონტაჟი.
- xxi. სამშენებლო მოედანზე **ქუთაისის საბავშვო ბაღის** სამშენებლო სამუშაოების უმეტესი ნაწილი შესრულებულია, შემოღობვის ჩათვლით. განხორციელდა სათამაშო მოედნების მოწყობა, ტერიტორიის გამწვანება. შიდა ელ. სამონტაჟო სამუშაოები, სავენტილაციო არხების დაკვალვა, ფილების მოწყობის - ლითონის დამუშავების სამუშაოები, გარშემო არსებული ჩარჩოების შედუღება, გარშემო არსებული ბეტონის პლინტუსის მოწყობა, ბრჯენის მოწყობა ნაწილში, გარემომცველი ჩარჩოების შედუღება საყრდენ ბოძებზე, გარშემო არსებული პლინტუსის ქვედა ნაწილის დაბეტონება, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, ტერიტორიის მონიშვნა.
- xxii. **ფარცხისის საბავშვო ბაღის** პროექტში დასრულდა მიწის სამუშაოები, კონსტრუქციული სამუშაოების მოწყობა (1-ელი სართული). განხორციელდა კონსტრუქციული სამუშაოები (მე-2 სართული). შიდა კედლების და ტიხრების მშენებლობა ბლოკებით -

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მე-2 სართულზე, გარე კედლების მშენებლობა ბლოკებით - მე-3 სართულზე, ყალიბების აწყობა საყრდენი კედლისთვის, საყრდენი კედლის არმატურით განმტკიცების მომზადება, საყრდენების მოწყობა საირიგაციო მიწებისთვის, ხის გადახურვის კონსტრუქციების მოწყობა, გათბობის და შიდა წყალმომარაგების მიწების მოწყობა.

- xxiii. **აგარის საბავშვო ბაღის** პროექტში მიწის სამუშაოები და სამირკველის მოწყობა დასრულდა. მშენებლობა პარაპეტის ბლოკებით, გადახურვის იზოლაცია, ე.წ. სენდვიჩის პანელებით შეფუთვა, ფასადის მოპირკეთება, ჰოლის ფილის დაბეტონება, მოაჯირების დაბეტონება, კედლების შელესვა, ლიფტის შახტის მოწყობა, შიდა კედლების შეფუთვა ხის ფიცრებით, შიდა კიბეების მოპირკეთება, დაერთება წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელებზე, ელ. მომარაგების შეფუთვა, სუსტი დენების შეფუთვა, ვენტილაციის შეფუთვა, შიდა კიბეების მოწყობა, იზო-ალუმინის კარების და ფანჯრების მონტაჟი, გარე კანალიზაციის შეფუთვა.
- xxiv. **დარჩელის საბავშვო ბაღის** პროექტში დასრულდა მიწის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამირკველის მოწყობა. შიდა კედლების მოპირკეთება პირველ სართულზე დასრულებულია 60%-ით. 2. მეორე სართული - მიმდინარეობს შიდა სატიხრე კედლების ამოყვანა, დასრულებულია 70%-ით.
- xxv. **ველისციხის ურბანული განახლების** პროექტის სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდა თითქმის ყველა ადგილას, მათ შორის ადგილობრივი ადმინისტრაციის ოფისში, თეატრში, ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე, ავტობუსების გაჩერებაზე, რეკრეაციულ პარკში, შენობებში. მშენებელმა კომპანიამ მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა ანგარიშგების პერიოდში, ძირითად მიღწევას კანალიზაციის მილსადენის მოწყობა წარმოადგენდა. ამასთან, შპს „ჯავა“ აქტიურად ახორციელებს სახლების რეაბილიტაციას და აღნიშნულ პროცესში, ფოკუსირებულია მოპირკეთებასა და ქვით დეკორაციაზე. სახლების ძირითადი გამაგრების სამუშაოები წარმატებით დასრულდა, რაც მიუთითებს არსებით წინსვლაზე, აღნიშნული მიმართულებით. სამუსიკო სკოლაში ასევე მიმდინარეობს მოპირკეთების სამუშაოები, ხოლო გამაგრების სამუშაოები აქ უკვე დასრულებულია. თუმცა, თეატრის შენობაში - ველისციხის ცენტრში, კვლავ ხარაჩოებია, რადგან შენობის შიგნით მიმდინარეობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, რაც ძირითადად გულისხმობს კედლების და კიბეების გასუფთავებას, ინტერიერის მოპირკეთებისთვის მოსამზადებლად. პროექტის პარკის ტერიტორიაზე, საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა სამუშაოები, რაც ძირითადად ფოკუსირებული იყო ნიადაგის გასუფთავებასა და მოსწორებაზე. ტერიტორია კარგად არის მოწყობილი, ხოლო ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა დასაწყობებულია შემდგომი გამოყენების მიზნით.
- xxvi. **ზუგდიდის ბიბლიოთეკის** მშენებლობის პროექტი ამჟამად მიმდინარეობს. ანგარიშგების პერიოდში დაფიქსირდა მნიშვნელოვანი მიღწევები. კერძოდ, წარმატებით დასრულდა შენობის სამირკველის მოწყობა, რაც არსებითად მნიშვნელოვანია სამშენებლო პროცესში. შესაბამისად, კონტრაქტორმა დაიწყო რკინის კონსტრუქციული კარკასის აღმართვა, რაც ამჟამადც მიმდინარეობს. რკინის კარკასის სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რკინის კარკასის მშენებლობის სამუშაოების არსებითი ნაწილი უკვე დასრულებულია.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2 პროექტის აღწერა და მიმდინარე აქტივობები

2.1 პროექტის აღწერა

7. სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი არის ცხოვრებისათვის ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის (LCIP) განმახორციელებელი სააგენტო (IA). ცხოვრებისათვის ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა მოიცავს 28 ქვეპროექტს. ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს თითოეული პროექტის სტატუსს.
8. მიმდინარეობს შემდეგი ქვეპროექტები: სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია და ზუგდიდის ბიბლიოთეკის მშენებლობა, ზუგდიდში, ახალციხესა და რუსთავში სპორტული კომპლექსების, ქუთაისში საცურაო აუზის და საბავშვო ბაღების მშენებლობა ქუთაისში, ფოთში, სუფსაში, ხაჯალაში, სენაკში, ძველ ანაგაში, ქვემო ბოდბეში, ბანძაში, დიდიჭყონში, ჭიაურში, ჭაბუკიანში, ჭითაწყაროში, რუხში, ვარდისუბანში, კურდღელაურში, შამგონაში, წინწყაროში, დარჩელში, აგარასა და ფარცხისში. ქვეპროექტების, სტატუსების და თარიღების სია სამშენებლო კონტრაქტორებთან ერთად მოცემულია 1-ელ ცხრილში.
9. ზუგდიდის სპორტული კომპლექსის პროექტის კონტრაქტორად მოხდა შპს „საბა კონსტრაქშენის“ შერჩევა, შესაბამისად, დაიწყო წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები. ამჟამად, ობიექტზე აშენებულია შენობის მხოლოდ 2 სართული, და მშენებელი კონტრაქტორი აქტიურად ასრულებს სამობილიზაციო სამუშაოებს, პროექტის დროულად დასრულების მიზნით.
გარდა ამისა, შპს „საბა კონსტრაქშენმა“ წარმოადგინა პროექტით გათვალისწინებული გარემოს დაცვის და შრომითი უსაფრთხოების გეგმები. აღნიშნული გეგმები მოიცავს კონკრეტული ობიექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმას (SSEMP), ხმაურის და ვიბრაციის მართვის გეგმას, ობიექტის მართვის გეგმას, ნარჩენების მართვის გეგმას და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის გეგმას. ამჟამად, ობიექტზე მიმდინარეობს დროებითი კონსტრუქციების აღმართვა.

ცხრილი 1. ქვეპროექტები სამშენებლო კომპანიების შესახებ ინფორმაციისა და განხორციელების ვადების შესახებ

№	ქვეპროექტი	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	მშენებელი კომპანია
1.	ქუთაისის საცურაო აუზი	21.04.2021	28.04.2023	შპს საბა კონსტრაქშენი
2.	ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი	10.07.2023	10.08.2024	შპს საბა კონსტრაქშენი
3.	ახალციხის სპორტული კომპლექსი	19.01.2023	19.02.2024	შპს არალი
4.	რუსთავის სპორტული კომპლექსი	21.04.2021	21.02.2023	შპს არალი
5.	ველისციხის ურბანული განახლება	21.01.2022	22.09.2023	ერთობლივი საწარმო “ინსი” & შპს “ჯავა”

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

6.	ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ზუგდიდში	06.10.2022	06.01.2024	სს მეთაგ ინშაათ თიჯარეთის ფილიალი საქართველოში
7.	თელავის ურბანული განახლება	-	-	-
8.	ლალამის ურბანული განახლება	-	-	-
9.	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	07.01.2022	31.03.2023	შპს „სათავე +“
10.	ფოთის საბავშვო ბაღი	07.01.2022	05.06.2023	შპს პრაიმ ბეტონი
11.	სუფსის საბავშვო ბაღი	22.12.2021	31.05.2023	შპს ქართული სამშენებლო ჯგუფი
12.	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	22.12.2021	31.05.2023	შპს ქართული სამშენებლო ჯგუფი
13.	სენაკის საბავშვო ბაღი	07.01.2022	16.09.2023	შპს პრაიმ ბეტონი
14.	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	10.01.2022	11.07.2023	შპს ინსტალი
15.	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	11.01.2022	30.04.2023	შპს ინსტალი
16.	ბანძის საბავშვო ბაღი	12.04.2022	11.07.2023	ერთობლივი საწარმო აბეკა და შპს არქტრეიდი
17.	დიდიჭყონის საბავშვო ბაღი	23.12.2022	15.07.2023	შპს ქართული სამშენებლო ჯგუფი
18.	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	11.01.2022	21.04.2023	შპს ინსტალი
19.	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	12.04.2022	11.07.2023	ერთობლივი საწარმო აბეკა და შპს არქტრეიდი
20.	ჭითაწყარის საბავშვო ბაღი	14.04.2022	13.04.2023	ერთობლივი საწარმო აბეკა და შპს არქტრეიდი
21.	რუხის საბავშვო ბაღი	14.04.2022	13.04.2023	ერთობლივი საწარმო აბეკა და შპს არქტრეიდი
22.	დარჩელის საბავშვო ბაღი	19.07.2022	19.09.2023	შპს „პროდუს ინვესტმენტ“

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

23.	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	13.01.2022	13.04.2023	ერთობლივი საწარმო პროდუს ინვესტიმენტ და შპს მათაგ ინსაათ თიქარეთ ანონიმ სირქეთ
24.	შამგონას საბავშვო ბაღი	13.01.2022	30.04.2023	ერთობლივი საწარმო პროდუს ინვესტიმენტ და შპს მათაგ ინსაათ თიქარეთ ანონიმ სირქეთ
25.	კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	18.01.2022	13.04.2023	შპს „სათავე +“
26.	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	04.01.2022	03.05.2023	შპს „ბალავარი“
27.	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	24.01.2022	19.04.2023	ერთობლივი საწარმო პროდუს ინვესტიმენტ და შპს მათაგ ინსაათ თიქარეთ ანონიმ სირქეთ
28.	აგარის საბავშვო ბაღი	15.07.2022	03.02.2024	შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.1.1 ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

10. პროექტის ფართობი (საკადასტრო კოდი: 43.31.71.114) მდებარეობს ზუგდიდის სამხრეთ ნაწილში, ბენდელიანის ქუჩაზე. პროექტის ადგილის გარშემო მდებარეობს კერძო სახლები ბაღებით, სიმიანდის მიწდვრები და თხილის პლანტაციები. პროექტის ადგილის სიახლოვეში არ არის დიდი საწარმოო ობიექტები. ადგილი არის ვაკე, დონეებს შორის მაქსიმალური სხვაობაა 1.2 მ. საცურო აუზის მშენებლობისთვის შერჩეული მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება. პროექტით მოსალოდნელია გრძელვადიანი დადებითი ზემოქმედება ზუგდიდის მოსახლეობაზე, კერძოდ, ახალგაზრდებზე.
11. პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობას. დიდი საცურო აუზი (33X25 მ), პატარა აუზი (16X8 მ), სპორტული დარბაზი და სიმძიმის ასაწევი დარბაზი შენობის პირველ სართულზე განთავსდება. პროექტით გათვალისწინებულია ადაპტირებული გარემოს მოწყობა შშმ პირებისთვის. მოეწყობა სპეციალური პანდუსები შშმ პირებისთვის. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება ადაპტირებული სან. კვანძები. მოეწყობა ლიფტიც. მოეწყობა პარკინგი 100 ავტომობილისთვის და 3 ავტობუსისთვის. პროექტი ასევე ითვალისწინებს გარემოს ლანდშაფტს. სპორტული კომპლექსის არე შემოღობილი იქნება. შენობის ენერგო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, გათვალისწინებულია გარე კედლის ამოყვანა ბეტონის ბლოკებით, რომლებზეც მოეწყობა შიდა იზოლაციის ქაფი. ორმაგი მინის პაკეტებით მოეწყობა გარე ვიტრაჟები. ჭერის თერმო იზოლაციის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყენებული იქნება ქვის ბამბა და პემზა. სახურავი მოეწყობა ე.წ. სენდვიჩის პანელებით.
12. პროექტის ადგილის მთლიანი ფართობია 13 015 მ², პარკინგისა და უკანა ეზოს ჩათვლით. სპორტული კომპლექსის შენობის მიწის ფართობია 3551,1 მ² სპორტული კომპლექსის შენობა ორ სართულიანია. პროექტი ითვალისწინებს ელ. გაყვანილობას, შიდა წყალმომარაგებას და საკანალიზაციო ქსელს, გათბობისა და გაგრილების სისტემას, განათებას, ცეცხლსაქრობ სისტემას.

სურათი 1. ობიექტის მდებარეობა - ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ლოკაცია
GPS კოორდინატები

N 1	X= 736106; Y= 4708448	N 2	X= 736200; Y= 4708443
N 3	X=736230; Y= 4708559	N 4	X=736108; Y= 4708560

2.1.2 ახალციხის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

13. პროექტი ითვალისწინებს ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობას (საკადასტრო კოდი: 62.09.63.183) (იხ. სურ. 2). სპორტული კომპლექსის მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 13 394 მ², პარკინგისა და უკანა ეზოს ჩათვლით. სპორტული კომპლექსის შენობა აშენდება მიწის ნაკვეთის დასავლეთ ნაწილში 4000 მ² ფართობზე. სპორტული კომპლექსის შენობის მიწის ფართობია 3551,1 მ², ხოლო მთლიანი ფართობი 7795,4 მ². შენობის სიმაღლე იქნება 15.6 მ².
14. მთავარი ვესტიბული, დიდი საცურაო აუზი (33X25 მ), პატარა აუზი (16X8 მ), სპორტული დარბაზი და წონის ასაწევი დარბაზი შენობის პირველ სართულზე განთავსდება. სტანდარტების თანახმად, დიდი აუზი მოემსახურება დღეში 80 ადამიანს, ხოლო პატარა აუზი მოემსახურება 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს - 20 ბავშვს, ერთ ცვლაში. დიდი აუზის ჰოლში მოეწყობა 200 მაყურებელზე გათვლილი ადგილები. პროექტით გათვალისწინებულია ადაპტირებული გარემოს მოწყობა შშმ პირებისთვის. მოეწყობა სპეციალური პანდუსები შშმ პირებისთვის. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება ადაპტირებული სან. კვანძები. მოეწყობა ლიფტი. მოეწყობა პარკინგი 100 ავტომობილისთვის და 3 ავტობუსისთვის. პროექტი ასევე ითვალისწინებს გარემოს ლანდშაფტს. სპორტული კომპლექსის არე შემოღობილი იქნება.
15. შენობის ენერგო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, გათვალისწინებულია გარე კედლის ამოყვანა ბეტონის ბლოკებით, რომლებზეც მოეწყობა შიდა იზოლაციის ქაფი. ორმაგი მინაპაკეტებით მოეწყობა გარე ვიტრაჟები. ჭერის თერმო იზოლაციის უზრუნველყოფის მიზნით, გამოყენებული იქნება ქვის ბამბა და პემზა. სახურავი მოეწყობა ე.წ. სენდვიჩის პანელებით. პროექტით გათვალისწინებულია ელ. მომარაგების, შიდა წყალსადენი და კანალიზაციის ქსელების, გათბობის და გაგრილების სისტემების, განათების და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მოწყობა.

სურათი 2. ობიექტის ადგილმდებარეობა – ახალციხის სპორტული კომპლექსი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



**ადგილმდებარეობა
GPS კოორდინატები**

N 1	X=332535; Y= 4612057	N 5	X=332730; Y= 4612070
N 2	X=332529; Y= 4612072	N 6	X=332721; Y= 4612034
N 3	X=332582; Y= 4612098	N 7	X=332704; Y= 4611991
N 4	X=332743; Y=4612104	N 8	X=332564; Y= 4612062

2.1.3. რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

16. რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობას ერთ-ერთი პროექტია, რომელიც განხორციელდა საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების ინვესტიციის პროგრამის ფარგლებში. პროექტის ადგილი მდებარეობს რუსთავის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე (საკადასტრო კოდი: 02.02.04.426). პროექტის ადგილის მთელი ფართობია 25 469 მ², პარკინგისა და უკანა ეზოს ჩათვლით. სპორტული კომპლექსი ორსართულიანი შენობა იქნება მთლიანი ფართობით 8635.77 მ², მიწის ფართობი კი - 5793,4 მ². ძირითადი შესასვლელი, ცენტრალური ვესტიბიული და ძირითადი ჰოლი (სიმაღლე: 10.5 მ) განთავსებულია ცენტრში. მაყურებელთა ტრიბუნა 1416 ადგილით ცენტრალური ვესტიბულის მხარეს მდებარეობს.
17. ყველა საჭირო არეალი მოეწყობა სიმეტრიულად, ძირითადი ჰოლის გარშემო, მათ შორის: სპორტული დარბაზი, კრივის დარბაზი, გასახდელები - საშხაპეებით, საკონფერენციო ოთახი, ინვენტარის საწყობი, პერსონალის ოთახი და აბაზანები. ცენტრალურ ვესტიბიულში განთავსდება ღია კაფე, სალარო, სწრაფი კვების ობიექტები და სპორტული აღჭურვილობის მაღაზიები. ვესტიბიულის მარცხენა მხარეს მოეწყობა დაცვის ოთახი, საწყობი სივრცე, და ერთი ოთახი - საინჟინრო კომუნიკაციებისთვის. მსაჯების ოთახები იზოლირებული იქნება და მოეწყობა ცენტრალურ ჰოლთან.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

18. მოეწყობა პარკინგი ავტომობილებისთვის. პროექტი ასევე ითვალისწინებს გარემოს კეთილმოწყობას. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები და განათება. სპორტული კომპლექსის არე შემოღობილი იქნება.

სურათი 3. ობიექტის ადგილმდებარეობა – რუსთავის სპორტული კომპლექსი



ადგილმდებარეობა GPS კოორდინატები

N1	X=499294; Y=4602196	N7	X=499188; Y=4602377
N2	X=499547; Y=4602052	N8	X=499162; Y=4602336
N3	X=499559; Y=4602068	N9	X=499188; Y=4602323
N4	X=499374; Y=4602170	N10	X=499240; Y=4602271
N5	X=499420; Y=4602268	N11	X=499249; Y=4602283
N6	X=499357; Y=4602307	N12	X=499313; Y=4602233

2.1.4. საცურაო აუზის მშენებლობა ქუთაისში

19. პროექტი ითვალისწინებს ქუთაისში ახალი სპორტული კომპლექსის მშენებლობას (საკადასტრო კოდი: 03.01.22.088) რომელიც მოიცავს დიდ საცურაო აუზს (50X25 მ) და პატარა აუზს (16X10 მ). სამშენებლო ტერიტორიის მთლიანი ფართობია: 13 015 მ², პარკინგის და უკანა ეზოს ჩათვით. სპორტული კომპლექსის შენობის მიწის ფართობია: 5043.1 მ². მოეწყობა პარკინგი 40 ავტომობილისთვის. სპორტული კომპლექსის შენობა ერთ სართულიანია. დიდი საცურაო აუზის დარბაზის სიმაღლე 12 მ. შენობის დანარჩენი ნაწილის სიმაღლე 4 მ. დიდი აუზის ჰოლის გარე (ფასადი) და გადახურვა მოეწყობა პოლიურეთანის ქაფის 6 სმ სისქის სენდვიჩის პანელებით, შენობის ენერგო ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. შენობის ქვედა ნაწილის გადახურვა მოეწყობა რკინა-ბეტონით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს გარემოს კეთილმოწყობას.

20. სპორტული კომპლექსის არე შემოღობილი იქნება. პროექტით გათვალისწინებულია ადაპტირებული გარემოს მოწყობა შშმ პირებისთვის. მოეწყობა სპეციალური პანდუსები შშმ

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

პირებისთვის. ტრიბუნებზე გამოიყოფა და შესაბამისად აღიჭურვება სივრცე შშმ პირებისთვის. უზრუნველყოფილი იქნება სან. კვანძებიც. მოეწყობა ლიფტიც.

21. პროექტი ითვალისწინებს ელ. გაყვანილობას, შიდა წყალმომარაგებას და საკანალიზაციო ქსელს, გათბობისა და გაგრილების სისტემას, განათებას, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემას. კანალიზაციის სისტემა დაერთდება ქალაქის ქსელზე.

სურათი 4. ობიექტის მდებარეობა - ქუთაისის საცურაო აუზი



ადგილმდებარეობა GPS კოორდინატები

N 1	X= 307528; Y= 4681896	N 4	X= 307697; Y= 4682100
N 2	X= 307521; Y= 4682067	N 5	X= 307736; Y= 4682096
N 3	X= 307693; Y= 4682064	N 6	X= 307742; Y= 4681912

2.1.5. ძველი ანაგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

22. პროექტი ითვალისწინებს ძველ ანაგაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. პროექტის მიზანია სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მაღალი ხარისხის სკოლამდელ განათლებაზე. საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის შერჩეული ადგილი ქალაქ სიღნაღის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს, ძველ ანაგაში, თბილისი - გურჯაანი - სიღნაღის გზის ახლოს. ფართობი: 6075 მ2 (საკადასტრო კოდი: 56.08.55.239).
23. ახალი, ორსართულიანი საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო ფართობია: 1.612,90 მ2. პროექტით გათვალისწინებულია 3 ჯგუფზე (75 ბავშვი) გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. საბავშვო ბაღის შენობაში მოეწყობა საძინებლები, სათამაშო ოთახები, გასახდელეები, ბუფეტი, საწყობები, ჰოლი, ადმინისტრაციის ოთახები, სამრეცხაო ოთახები, სამზარეულო, საევაკუაციო კიბეები. პროექტით ასევე გათვალისწინებულია ბაღის, სკამების, საჩრდილობლების, სათამაშო მოედნების, სანაგვე ურნების და წყლის მადრევენების მოწყობა - პროექტისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის დანარჩენ ნაწილში.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

24. პროექტი ითვალისწინებს ელ. გაყვანილობას, შიდა წყალმომარაგებას და საკანალიზაციო ქსელს, გათბობისა და გაგრილების სისტემას, განათებას, ცეცხლსაქრობ სისტემას. პროექტით გათვალისწინებულია ბოილერის სივრცის (33,80 მ2) გამოყოფა და დღეში 6 მ3 სიმძლავრის ბიოლოგიური გამწმენდი ერთეულის/მოწყობილობის მოწყობა საპროექტო ტერიტორიაზე.

სურათი 5. ობიექტის მდებარეობა - ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი



**ადგილმდებარეობა
GPS კოორდინატები**

N1	X=587302; Y=4599778	N7	X=587398; Y=4599768
N2	X=587301; Y=4599828	N8	X=587410; Y=4599794
N3	X=587317; Y=4599820	N9	X=587357; Y=4599812
N4	X=587394; Y=4599876	N10	X=587372; Y=4599824
N5	X=587455; Y=4599789	N11	X=587356; Y=4599841
N6	X=587417; Y=4599755	N12	X=587335; Y=4599817

2.1.6. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში

25. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 3 ჯგუფისთვის (75 ბავშვი) სოფელ ქვემო ბოდბეში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში (კახეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3629 მ², საკადასტრო კოდი: 56.10.46.299. იგი არის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
26. საბავშვო ბაღის შენობის სამშენებლო ფართობია 1612,8 მ². 1-ელი სართულის სამშენებლო ფართობია 723,6 მ², მე-2 სართულის 788,2 მ², სახურავზე ერთი ტექნიკური სართულის ფართობია 67.3 მ². ბოილერის შენობის სამშენებლო ფართობია 33,8 მ².
27. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

28. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. წყლით უზრუნველყოფა მოხდება არსებული ადგილობრივი ქსელიდან. ცხელი წყალი უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 6 მ³ სიმძლავრით.

სურათი 6. ობიექტის მდებარეობა – საბავშვო ბაღი ქვემო ბოდბეში



**ადგილმდებარეობა
GPS კოორდინატები**

N1	X=587302; Y=4599778	N2	X=587398; Y=4599768
N3	X=587301; Y=4599828	N4	X=587410; Y=4599794
N5	X=587317; Y=4599820	N6	X=587357; Y=4599812
N7	X=587394; Y=4599876	N8	X=587372; Y=4599824

2.1.7. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში

29. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სამი ჯგუფისთვის (75 ბავშვი) სოფელ ჭიაურში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში (კახეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 4064 მ², საკადასტრო კოდი: 54.06.57.029. მიწის ნაკვეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრებაშია.
30. პროექტისთვის შერჩეულ ტერიტორიაზე არის ძველი საბავშვო ბაღის შენობა. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებელია არსებული შენობის დანგრევაზე და ადგილიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანაზე, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.
31. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოიღობება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

32. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, საჰაერო ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
33. საბავშვო ბაღის შენობის წყალმომარაგების მიზნით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიზინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტი ითვალისწინებს საკანალიზაციო წყლების გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას შემდეგი სიმძლავრით: 6 მ³/დღეში.

სურათი 7. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ჭიაურში



2.1.8. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში

34. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ჯგუფებისთვის (100 ბავშვი) სოფელ ჭაბუკიანში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში (კახეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3466,0 მ² (საკადასტრო კოდი: 54.13.60.292) მიწის ნაკვეთი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრებაშია.
35. პროექტისთვის შერჩეულ ტერიტორიაზე არის ძველი საბავშვო ბაღის შენობა. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებელია არსებული შენობის დანგრევაზე და ადგილიდან სამშენებლო ნარჩენების გატანაზე, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.
36. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, საჰაერო ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
37. საბავშვო ბაღის შენობის წყალმომარაგების მიზნით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიზინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

საქვებიდან. პროექტით გათვალისწინებულია ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის / მოწყობილობის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა: 8 მ³ / დღეში.

38. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოიღობება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 8. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ჭაბუკიანში



2.1.9. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში

39. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ექვსი ჯგუფისთვის (120 ბავშვი) სოფელ ვარდისუბანში, თელავის მუნიციპალიტეტში (კახეთის რეგიონი). ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება მიწის ნაკვეთზე, რომელიც არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება (4262 მ², საკადასტრო კოდი: 53.08.40.050.). მიწის ნაკვეთი თელავის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრებაა. პროექტისთვის შერჩეულ ტერიტორიაზე ძველი შენობებია. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებელია არსებული შენობის დანგრევაზე და სამშენებლო ნარჩენების გატანაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.
40. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიზინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვებიდან. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.
41. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 14 მ³ სიმძლავრით.

სურათი 9. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ვარდისუბანში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.10. საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში

42. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ბავშვების ექვსი ჯგუფისთვის სოფელ კურდღელაურში, თელავის მუნიციპალიტეტში (კახეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 4025 მ², საკადასტრო კოდი: 53.07.43.034. მიწის ნაკვეთი თელავის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრებაა. პროექტისთვის შერჩეულ ტერიტორიაზე ძველი შენობის ნანგრევებია. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებელია არსებული შენობის დანგრევაზე და სამშენებლო ნარჩენების გატანაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.
43. ჩამდინარე წყლები ჩაედინება თელავის საკანალიზაციო ქსელში. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 10. ობიექტის მდებარეობა – საბავშვო ბაღი კურდღელაურში



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.1.11. საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში

44. პროექტი მოიცავს ახალი საბავშვო ბაღის აშენებას ბავშვების ექვსი ჯგუფისთვის სოფელ წინწყაროში. ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 84.10.33.000.121, ფართობი: 7973 მ²).
45. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. პროექტი ითვალისწინებს ჭაბურღილის მოწყობას საბავშვო ბაღის წყლით მომარაგების მიზნით. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 14 მ3 სიმძლავრით. ცხელი წყალი უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
46. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.
47. პროექტისთვის განკუთვნილ ტერიტორიაზე არის რამდენიმე ნაწილობრივ დანგრეული ნაგებობა, რომელიც მდებარეობს მიწის ნაკვეთის კიდეზე. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებელია არსებული შენობის დანგრევაზე და სამშენებლო ნარჩენების გატანაზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე.

სურათი 11. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი წინწყაროში



2.1.12. საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდიჭყონში

48. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) სოფელ დიდიჭყონში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 5978 მ², საკადასტრო კოდი: 41.15.35.236 (მარტვილის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება).
49. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, საჰაერო ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
50. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიზინფექციო სისტემით.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.

51. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ3 სიმძლავრით. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 12. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი დიდიჭყონში



2.1.13. საბავშვო ბაღის მშენებლობა სუფსაში

52. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ოთხი ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) სოფელ სუფსაში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, გურიის რეგიონი. მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3504 მ², საკადასტრო კოდი: 27.15.52.668. იგი არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
53. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
54. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ3 სიმძლავრით.
55. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 13. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი სუფსაში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.14. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში

56. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ოთხი ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) სოფელ ხაჯალიაში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, გურიის რეგიონი. მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 6500 მ², საკადასტრო კოდი: 27.14.50 005. იგი არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
57. პროექტი ითვალისწინებს ელ. გაყვანილობას, შიდა წყალმომარაგებას და საკანალიზაციო ქსელს, გათბობისა და გაგრილების სისტემას, განათებას, ცეცხლსაქრობ სისტემას. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
58. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებიზინფექციო სისტემით.
59. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ3 სიმძლავრით.
60. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 14. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ხაჯალიაში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.15. საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში

61. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სამი ჯგუფისთვის სოფელ შამგონაში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3040 მ², საკადასტრო კოდი: 43.16.42.181. იგი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
62. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
63. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადებინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
64. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 6 მ3 სიმძლავრით.
65. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 15. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი შამგონაში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.16. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში

66. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის ქალაქ ფოთში, ფოთის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 4294 მ², საკადასტრო კოდი: 04.02.12.924. იგი არის ფოთის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება. მშენებლობისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე არ არის შენობები.
67. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.
68. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. წყლით უზრუნველყოფა მოხდება ქალაქის წყალმომარაგების ქსელიდან. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
69. პროექტით გათვალისწინებულია ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის / მოწყობილობის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა დღეში 8 მ³ / დღეში.

სურათი 16. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ფოთში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.17. საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში

70. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის სოფელ რუხში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 3277 მ², საკადასტრო კოდი: 43.10.42.439. იგი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
71. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
72. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტის დიზაინით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის დიზაინში კვანძით და წყლის სადეზინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტით გათვალისწინებულია ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის / მოწყობილობის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა დღეში 8 მ 3 / დღეში.
73. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.

სურათი 16. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი რუხში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.18. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყარში

74. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) სოფელ ჭითაწყარში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 7385 მ², საკადასტრო კოდი: 43.14.42.059. იგი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
75. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
76. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადუზინფექციო სისტემით. პროექტით გათვალისწინებულია ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის / მოწყობილობის მონტაჟი, რომლის სიმძლავრეა 8 მ³ / დღეში.
77. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 17. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ჭითაწყარში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.19. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში

78. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) სოფელ ბანძაში, მარტვილის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 5662 მ², საკადასტრო კოდი: 41.04.35.339. იგი არის მარტვილის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
79. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები.
80. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადენინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
81. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ³ სიმძლავრით. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.
82. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 18. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ბანძაში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.20. საბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკში

83. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 4 ჯგუფისთვის (100 ბავშვი) ქალაქ სენაკში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 4304 მ², საკადასტრო კოდი: 44.01.35.441. იგი არის სენაკის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
84. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.
- ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. წყლით უზრუნველყოფა მოხდება არსებული ადგილობრივი ქსელიდან. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
85. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ3 სიმძლავრით.

სურათი 19. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი სენაკში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.21. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში

86. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას 6 ჯგუფისთვის (180 ბავშვი) ქუთაისში. ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩაზე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 03.01.24.857, ფართობი 8537მ²).
87. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. წყლით უზრუნველყოფა მოხდება ქალაქის წყალმომარაგების ქსელიდან. ჩამდინარე წყლები ჩაედინება ქალაქის საკანალიზაციო ქსელში. სახანძრო სისტემა მოწყობილია ფოლადის მილებით, ხოლო სასმელი წყლის სისტემა პლასტმასის მილებით. ცხელი წყალი უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისთვის გამოყენებული იქნება 110-500 მმ კანალიზაციის მილები.
88. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 20. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ქუთაისში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.22. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში

89. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სამი ჯგუფისთვის სოფელ ფარცხისში. ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 84.03.33.026.601, ფართობი: 2438 მ²).
90. საბავშვო ბაღის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო თვალთვალის სისტემა.
91. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან. პროექტი ითვალისწინებს ჰაბურდილის მოწყობას საბავშვო ბაღის წყლით მომარაგების მიზნით.
92. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის/კანალიზაციის წყლების დამონტაჟებას 6მ³ სიმძლავრით დღეში.

სურათი 21. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი ფარცხისში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.1.23. საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში

93. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ოთხი ჯგუფისთვის სოფელ აგარაში. ახალი საბავშვო ბაღი აშენდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 62.05.58.505, ფართობი 6294 მ²).
94. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. წყლით უზრუნველყოფა მოხდება ქალაქის წყალმომარაგების ქსელიდან. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 8 მ3 სიმძლავრით. ცხელი წყალი უზრუნველყოფილი იქნება ობიექტზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
95. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 22. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი აგარაში



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.1.24. საბავშვო ბაღის მშენებლობა დარჩელში

96. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ექვსი ჯგუფისთვის სოფელ დარჩელში, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი). მშენებლობისთვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის ფართობია 5186 მ², საკადასტრო კოდი: 43.25.43.178. იგი არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მთავრობის საკუთრება.
97. ასევე მოეწყობა სახანძრო უსაფრთხოების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ჰაერის ვენტილაციისა და გათბობის სისტემები. საბავშვო ბაღის წყლით უზრუნველყოფისათვის, პროექტით გათვალისწინებულია ჭაბურღილის მოწყობა ფილტრების ტუმბოთი, ტუმბოს მართვის კოლოფით, ჭაბურღილის თავით, წყლის მრიცხველის კვანძით და წყლის სადუზინფექციო სისტემით. ცხელი წყალი და გათბობა უზრუნველყოფილი იქნება ადგილზე დამონტაჟებული საქვაბიდან.
98. პროექტი ითვალისწინებს ბიოლოგიური გამწმენდი მოწყობილობის დამონტაჟებას დღეში 14 მ³ სიმძლავრით.
99. საბავშვო ბაღის მშენებლობის მთელი ტერიტორია შემოღობილი იქნება და დამონტაჟდება ვიდეო კონტროლის სისტემა.

სურათი 23. ობიექტის მდებარეობა - საბავშვო ბაღი დარჩელში



2.1.25. სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია

100. პროექტის ადგილია სოფელ ველისციხეში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთი საქართველო. სოფელი არის კახეთში ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი დასახლება. მდებარეობს ხორნაბუჯი-ველისციხე-ჭერემი-უჯარმას მთავარ გზატკეცილზე.
101. ველისციხე მდებარეობს ალაზნის ველზე, მდინარე ჭერმისხევის პირას (იხ. სურ. 25).
102. პროექტი ითვალისწინებს ტურიზმისთვის მიმზიდველი და ორგანიზებული გარემოს შემქნას სოფელ ველისციხეში. რეაბილიტაციის პროექტი სოფელში სამი მთავარი ადგილის განახლებას შეიცავს: (1) ველისციხის ცენტრალური ქუჩა, (2) თეატრი და (3) პარკი. (1) და (2) გამიზნულია სტუმართმოყვარეობისა და საცალო ვაჭრობის ჰაზად, ხოლო შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

(3) პირველ რიგში მკვიდრ მოსახლეობას მოემსახურება სარეკრეაციო სივრცის სახით. თეატრის და პარკის სრული რეაბილიტაცია მოხდება; შენობის ფასადები და საფეხმავლო ბილიკები განახლდება ცენტრალურ ქუჩაზე.

103. მთლიანი საპროექტო ფართობი არის 7.7 ჰა, ცენტრალური ქუჩა (შენობებისა და თეატრის ჩათვლით) 4.3 ჰა, ხოლო ცენტრალური პარკი 3.4 ჰა. ასევე, გამოიყოფა მიწის ნაკვეთები ავტობუსის გაჩერების და პარკინგის მოსაწყობად (4611 მ²) და ჩამდინარე წყლების გამწენდი ნაგებობის ასაშენებლად (ორი შენობა ტევადობით 150 მ³/24 საათში თითოეული, 589 მ² ფართობზე).

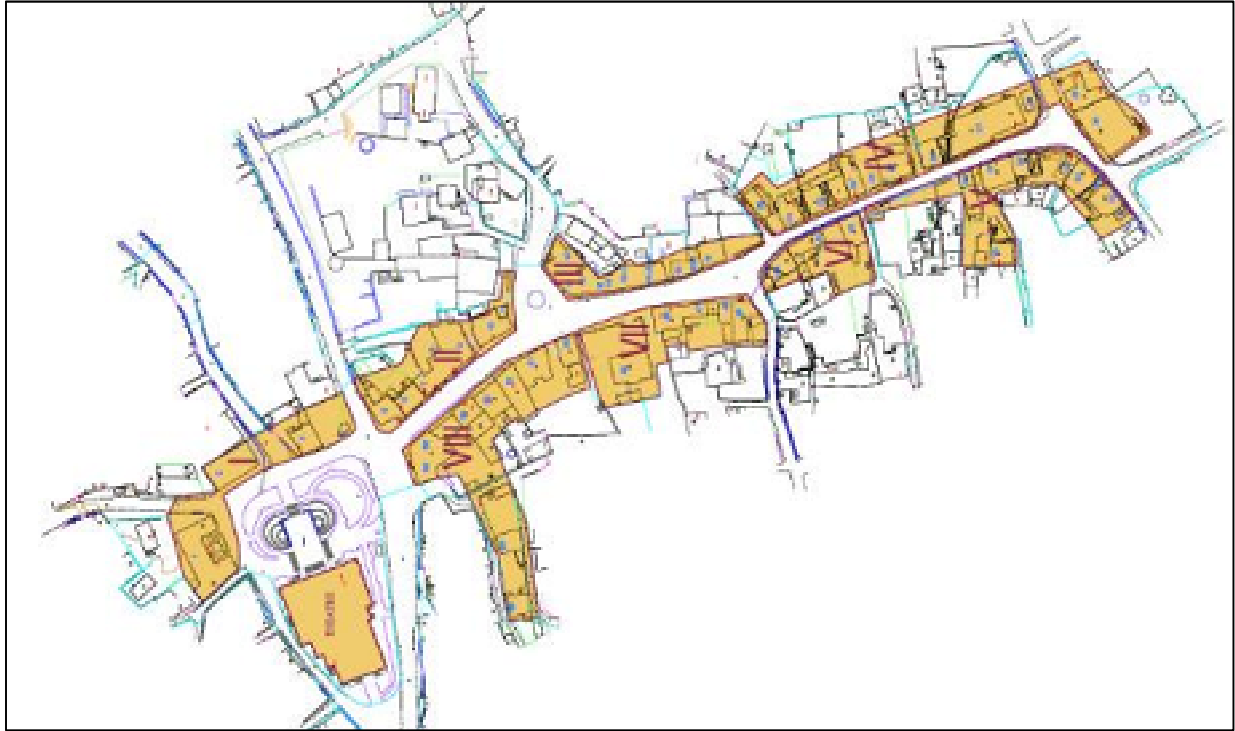
სურათი 24. სოფ. ველისციხის ლოკაცია.



104. სოფლის განვითარების ხედვა სტაბილურობის პრინციპებს ემყარება, რომლებშიც მოიაზრება შემდეგი: (I) სოფლის ერთ-ერთ მთავარ ფასეულობას წარმოადგენს ადგილის ისტორიული ავთენტურობის შენარჩუნება; და (ii) თანამედროვე საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირება და ამავე დროს ადგილობრივი ისტორიული ფასეულობების გათვალისწინება.
105. პროექტი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: (I) სოფლის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია (იხ. სურ. 23); (ii) თეატრთან ახლოს მდებარე ცენტრალური ქუჩისა და სკვერის რეაბილიტაცია; (iii) თეატრის შენობის ფასადისა და პირველი სართულის რეაბილიტაცია (იხ. სურ. 24); (iv) სარეკრეაციო პარკის რეაბილიტაცია; და (v) ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (იხ. სურ. 26).
106. პროექტის დიზაინი შემუშავებულია „სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის მთავარი გეგმა“ ჩარჩოში, რომელიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა 2019 წელს დაამტკიცა. ველისციხის მთავარი გეგმა ფოკუსირებულია ტურისტული გარემოს გაუმჯობესებაზე და ამავე დროს ითვალისწინებს ლოკაციასა და კულტურულ ფასეულობებს. ველისციხე შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მდებარეობს ცენტრალურ გზატკეცილთან ახლოს, რომელიც აკავშირებს კახეთის რეგიონს საქართველოს დედაქალაქ თბილისთან და ქვეყნის სხვა რეგიონებთან. სოფლის ცენტრი ტურისტებს იზიდავს თავისი ურბანული სტრუქტურით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით, ღვინის მარნებითა და მეღვინეობით.

სურათი 25. პროექტის ფარგლებში სარეაბილიტაციო შენობების გეგმა



სურათი 26. სარეაბილიტაციო თეატრისა და სკვერის ადგილმდებარეობა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



სურათი 27. სარეკრეაციო პარკის ლოკაცია



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 28. ავტობუსის გაჩერების ადგილმდებარეობა, პარკინგი და წყალგამწმენდი ნაგებობები



107. საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო მშენებლობა არ საჭიროებს გარემოსდაცვით სკრინინგს ან გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (EIA). თუმცა, რადგანაც პროექტი ითვალისწინებს ორი გამწმენდი ნაგებობის (WWTP) დამონტაჟებას (თითოეულის სიმძლავრე 150 მ³/24 სთ), ჩატარდა გარემოს სკრინინგი. სოფლის მეურნეობისა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2-942 ბრძანებით (2020 წლის 20 ოქტ.), გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლოატაცია ველისციხეში არ მოითხოვს სრული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დასრულებას.
108. საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამას (LCIP), წინამდებარე პროექტის ჩათვლით, აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის განაცხადით (ADB SPS) მიენიჭა B კატეგორია. ამგვარად, პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასება (IEE) ჩატარდა წინასწარი გაზომვებთან ერთად და დამტკიცდა აზიის განვითარების ბანკის მიერ.
109. 2020 წლის 18, 26, 27, 30 ნოემბერს, 2020 წლის 1, 3 დეკემბერს და 2022 წლის 17, 18, 19 იანვარს საპროექტო და საბოლოო IEE მონაწილე მხარეებმა განიხილეს გამოაქვეყნეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გარდა ამისა, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტს გაუზიარეს ანგარიშები.
110. რამდენიმე შენობა, რომლებსაც პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს (ველისციხის ცენტრ. ქუჩაზე, კლასტერი 2) მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ვიზუალური უსაფრთხოების ზონაში: წმ. გიორგი ეკლესია, შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ღვთისმშობლის ეკლესია და მარიამ ღვთისმშობლის ეკლესია. პროექტის დიზაინი შეთანხმდა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან (NACHP), რომელმაც დაამტკიცა კულტურული მემკვიდრეობის ვიზუალური უსაფრთხოების ზონაში სამუშაოების ჩატარება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ განიხილა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიახლოვეში მდებარე საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემოწმებული საესკიზო პროექტი. შედეგად, აღინიშნა, რომ სოფ. ველისციხის ცენტრში საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, შეიძლება შესრულდეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის დაწვრილებითი პროექტის მიმოიხილა და დასახული სამუშაოების დამტკიცების დასტურის წერილი წამოადგინა (დათარიღებული 24.05.2021 N12/1745) კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომლებიც მშენებლობის ფაზაში უნდა იქნას გათვალისწინებული.

2.1.26. ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ზუგდიდში

111. მოცემული ანგარიშგების პერიოდში, ოქტომბრის თვეში, EPTISA-მ დაიწყო საზედმედველო სამუშაოები ზუგდიდის ბიბლიოთეკაში. „ეპტისამ“ საქმიანობა დაიწყო 2022 წლის 6 ოქტომბერს, ქალაქ ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობის პროექტში.
112. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ ზუგდიდში, ზ. გამსახურდიას ქ.#7 (საკადასტრო კოდი: 43.31.49.025). შენობის ტერიტორიის დასავლეთით მდებარეობს მერაბ კოსტავას ქუჩა, ჩრდილო-დასავლეთით დადიანების სასახლე და პარკი. სამხრეთ-აღმოსავლეთით N2 დაწყებითი სკოლა და სკეიტ პარკი. ჯვრის მსგავსი ფორმით პროექტი ასახავს მის მიმდებარე ურბანულ კონტექსტს, ღირსშესანიშნაობების ხედებით (დადიანების სასახლე, ნიკოსეული სასახლე, სკეიტ პარკი და ქალაქი).
113. ფართობი არის 2400 კვ.მ და სამშენებლო ნაკვეთი 980 კვ.მ. შენობის ფუნქციები გადანაწილებულია 3 დონეზე. -1დონიანი 940კვ.მ 1დონე -980კვ.მ ტერასა 1 დონეზე 64კვ.მ. მე-2 დონე არის 720 კვ.მ და ტერასა 82 კვ.მ საერთო შიდა ფართი 2640 კვ.მ. შენობის ზომები: 44,3 მ. x 44,3 მ. მიწიდან სიმაღლე 9,3 მ. ხოლო მიწისქვეშა 5,7 მ. შენობის მთავარი შესასვლელი მდებარეობს დადიანის პარკიდან, ასევე ორი მეორეხარისხოვანი შესასვლელი მ. კოსტავას ქუჩიდან.
114. ანგარიშგების პერიოდში დასრულდა მიწის სამუშაოები და საძირკველის მოწყობა. მოეწყო საყრდენი კედლები.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 29. ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის ადგილმდებარეობა ზუგდიდში



2.2. პროექტების კონტრაქტები, ქვეკონტრაქტორები და მენეჯმენტი

115. პროექტის მსესხებელი არის აზიის განვითარების ბანკი, განმახორციელებელი სააგენტო - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; ხელშეკრულებები თითოეული SP-ისთვის სამშენებლო სამუშაოების შესახებ მოცემულია მე-2 ცხრილში.
116. პირველადი გარემოსდაცვითი ანგარიშის (IEE)/გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP)/კონკრეტული ობიექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (SSEMP) განხორციელების მონიტორინგში ჩართული მთავარი დაწესებულებებია განმახორციელებელი სააგენტო - მგფ, სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი (CSC), სამშენებლო კონტრაქტორები და გარკვეულ წილად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მუნიციპალური ორგანოები. განხორციელების სააგენტო (მუნიციპალური განვითარების ფონდი) და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი პასუხისმგებელი არიან მშენებლობის ეტაპზე პროექტის განხორციელების მონიტორინგზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პერიოდულად აუდიტს ატარებს, მაგრამ წინამდებარე SSEMP-ის თანახმად მონიტორინგზე პასუხისმგებელ მხარეს არ წარმოადგენს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, მუნიციპალური განვითარების ფონდი პასუხისმგებელია უსაფრთხოების დავალებების

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ზოგად განხორციელებაზე. განმახორციელებელი სააგენტო (მუნიციპალური განვითარების ფონდი) და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი (ეპტისა) პასუხისმგებელი არიან პროექტის განხორციელების მონიტორინგზე მშენებლობის ეტაპზე, მუნიციპალიტეტები კი სამუშაო ეტაპზე.

117. მუნიციპალური განვითარების ფონდი უზრუნველყოფს მთელი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მისაწვდომობას და ხელს უწყობს პროექტის გარემოს დაცვით ზედამხედველობას. IEE/SSEMP განხორციელებასთან დაკავშირებით მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოსდაცვითი სპეციალისტების პასუხისმგებლობა შემდეგია: უზრუნველყონ, რომ IEE/SSEMP-ის ყველა სათანადო მოთხოვნა (გარემოსდაცვითი პროექტებისა და შემარბილებელი ზომების ჩათვლით) შესულია პროექტის სატენდერო დოკუმენტებში; საჭიროებისამებრ დაეხმარონ კონტრაქტორებს ყველა აუცილებელი ნებართვის ანდა ავტორიზაციების მოპოვებაში ყველა შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოდან; უზრუნველყონ, რომ ყველა აუცილებელი სარეგულაციო ავტორიზაცია მოპოვებულია პროექტის სამოქალაქო სამუშაოების დაწყებამდე; დარწმუნდნენ, რომ კონტრაქტორებს აქვთ წვდომა EMP და IEE ანგარიშებზე და რომ მათ ესმით სამშენებლო აქტივობებთან დაკავშირებულ გარემოს დაცვით ზომებზე თავიანთი პასუხისმგებლობა და ხელი შეუწყონ EMP-ს მათი პერსონალის ტრენინგის განხორციელებაში; დაამტკიცონ სამშენებლო მოედანზე გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SEMP), რომელიც მოამზადა კონტრაქტორმა სანამ სამშენებლო მოედანს ჩაიბარებდა; დრო და დრო, ადგილზე ვიზიტებით, გაუწიოს მონიტორინგი მენარდის მიერ SEMP-ის შესრულებას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის მიხედვით.
118. მუნიციპალური განვითარების ფონდი, თავისი გარემოს დაცვის სპეციალისტის მიერ, აზიის განვითარების ბანკს ყოველ 6 თვეში წარუდგენს ანგარიშს სამშენებლო სამუშაოების გარემოს დაცვით შესაბამისობაზე, რისთვისაც ნახევარ წლიანი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშებს მოამზადებს. პროექტის განხორციელებისას გარემოზე გაუთვალისწინებელი ზემოქმედების შემთხვევაში გარემოს დაცვის საგანგებო პროგრამას მოამზადებს და განახორციელებს შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებთან და აზიის განვითარების ბანკთან კონსულტაციით;
119. მგფ-ის მიერ დანიშნული ზედამხედველი კომპანია (ზკ) სამუშაოების შესრულების ადგილზე უნდა იყოს და ყურადღებით დააკვირდეს სამუშაოების მიმდინარეობას. სამშენებლო ზედამხედველობის კომპანია პასუხისმგებელია ყველა გარემოსდაცვითი საკითხის ზედამხედველობაზე პროექტის განხორციელების დროს. სამუშაოების დიზაინთან შესაბამისობისა და ხარისხის უზრუნველყოფის პარალელურად, ზედამხედველს ევალება თვალყური ადევნოს კონტრაქტორის მიერ EMP/SSEMP-ს შესრულებას და დადგენილი ღონისძიებებიდან გადახრები გამოავლინოს.
120. გარემოს დაცვით საკითხებს მართავს ზედამხედველი კომპანია „ეპტისა“, რომელიც პასუხისმგებელია შემდეგზე:
 - კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მიმოხილვა და დამტკიცება;
 - სამშენებლო საქმიანობის მონიტორინგი, შეუსაბამობის აქტების (NCR) გაცემა;
 - ურთიერთობა კონტრაქტორისთან და დამკვეთთან;
 - კონტრაქტორის მხარდაჭერა გარემოს დაცვით ნებართვებისა და ლიცენზიების მოპოვებაში;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- მიმოწერა დამკვეთთან, კონტრაქტორისთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
121. ტექნიკური ზედამხედველის გარემოს დაცვის სპეციალისტი ამოწმებს კონტრაქტორის ანგარიშებში ინფორმაციის სიზუსტეს, ავსებს მათში აღმოჩენილ გამოტოვებებს და აფასებს კონტრაქტორის მიერ მიღებული შემარბილებელი ზომების ადეკვატურობას. ტექნიკურმა ზედამხედველმა უნდა მიუთითოს EMP/SSEMP-ებთან შეუსაბამობის შემთხვევებზე, ინფორმირება მოახდინოს კონტრაქტორის მიერ წამოწეულ ან თავად ზედამხედველის მიერ გამოვლენილ მწვავე საკითხებზე და შემასწორებელი ღონისძიებების შესთავაზოს.
 122. სამშენებლო საქმიანობის შესრულების დროს, სამშენებლო ზედამხედველობის გარემოს დაცვის სპეციალისტი, დრო და დრო, ატარებს გარემოს დაცვით შეხვედრებს და ობიექტის ინსპექტირებას. არსებითი შეუსაბამობების აღმოჩენის შემთხვევაში, ინჟინერი ავსებს შეუსაბამობის ანგარიშის ფორმებს და ოფიციალურად უგზავნის მათ კონტრაქტორის. უმთავრესი საკითხები, რომლებსაც HSE დეპარტამენტი ვერ წყვეტს, ყოველკვირეულ შეხვედრებზე განიხილება. საგანგებო სიტუაციაში, კონტრაქტორი ოფიციალურად ითხოვს მხარდაჭერას დამსაქმებლისგან მისი კომპეტენციის ფარგლებში, მიმართავს შესაბამის სამინისტროებს და ადგილობრივ ორგანოებს.
 123. ამგვარად, შეუსაბამობის შეტყობინება ეგზავნება კონტრაქტორის თუ სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი მოითხოვს ღონისძიების გატარებას. კონტრაქტორის მოეთხოვება, მოამზადოს მაკორექტირებელი ღონისძიების გეგმა, რომელიც უნდა შესრულდეს ზედამხედველ კომპანიასთან (SC) შეთანხმებულ დროში. შეუსაბამობა დადგენილი კრიტერიუმით უნდა შეფასდეს.
 124. სამშენებლო ზედამხედველობის კომპანია ამზადებს წელიწადში ორჯერ და ყოველთვიურ გარემოს დაცვით ანგარიშებს, სადაც შესულია SSEMP-ს შესრულება, მისგან გადახრები და ჩამოთვლილი ყველა HSE ინციდენტები და შემთხვევები, რომლებიც განხორციელების დროს მოხდა; აბარებს პერიოდულ ანგარიშებს მონიტორინგის მონაცემების და ლაბორატორიული ანალიზის საფუძველზე.
 125. სამშენებლო კომპანია ვალდებულია დაიცვას EMP/SSEMP კარგი სამშენებლო პრაქტიკა სამშენებლო საქმიანობის დროს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად კონტრაქტორებმა შექმნეს გარემოს დაცვის მართვის ჯგუფები და პროცედურები.
 126. ხელშეკრულების განმავლობაში კონტრაქტორი დანიშნავს სრულ განაკვეთზე მომუშავე ჯანმრთელობისა გარემოს დაცვის მენეჯერებს (HS&EM), რომელიც ობიექტზე მომუშავე სამშენებლო მენეჯმენტის გუნდის უფროსი წევრები არიან. სამშენებლო კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი გუნდების პასუხისმგებელნი არიან EMP/SSEMP-ს შესრულებაზე ყოველდღიური გარემოსდაცვითი და მონიტორინგით და ანგარიშგებით.
 127. სამშენებლო კომპანიის გარემოსდაცვითი გუნდები ამზადებენ სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმას (SEMP), რომელსაც განხორციელების სააგენტო ამტკიცებს, სანამ კონტრაქტორები სამშენებლო მოედანს ჩაიბარებენ; უზრუნველყოფენ, რომ SEMP ეფექტურად სრულდება მშენებლობის პერიოდში; ატარებენ მონიტორინგს და შემარბილებელ ზომებს რომლებიც IEE/EMP/SSEMP-ში არის მოცემული; ნერგავენ საოპერაციო სისტემას გარემოზე გავლენების მართვისთვის; ანაწილებენ ბიუჯეტს, რათა უზრუნველყონ, რომ ასეთი ზომები გატარდეს. სამშენებლო კონტრაქტორები პასუხისმგებელნი არიან SSEMP შესრულებაზე ყოველთვიური პროგრესის ანგარიშის

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მომზადებაზე. ანგარიში უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ანგარიშგების პერიოდში განხორციელებული მთავარი აქტივობების, ამ აქტივობებისთვის საჭიროს ავტორიზაციების/ნებართვების/ლიცენზიების სტატუსის, შემარბილებელი ზომების და მომწოდებლებთან, ადგილობრივ ორგანოებთან, გავლენის ქვეშ მოქცეულ თემებთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი საკითხების და ა. შ. შესახებ.

128. სამშენებლო კომპანია ასეთი ზომების გატარების ანგარიშებს აბარებს დამკვეთს ყოველთვიურად; აწარმოებს ობიექტზე ჩანაწერებს შემდეგ საკითხებზე:
- I. სამშენებლო ობიექტის ყოველკვირეული შემოწმება SEMP-ზე დაფუძნებული საკონტროლო სიებით;
 - II. გარემოსდაცვითი შემთხვევები/ინციდენტები და აღმოფხვრის ღონისძიებები;
 - III. გარემოს დაცვის მონიტორინგის მონაცემები;
 - IV. გარემოსდაცვითი ინსტრუქციების ანგარიშები;
 - V. სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტის მიერ გაცემული შეუსაბამობის შეტყობინებები;
 - VI. შეუსაბამობის შენიშვნების საპასუხოდ სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტისათვის წარდგენილი კორექციის ღონისძიებების გეგმები;
 - VII. თემთან ურთიერთობის ღონისძიებები საჩივრების ჟურნალების წარმოებით;
 - VIII. მონიტორინგის ანგარიშები;
 - IX. SEMP შესაბამისობის რუტინული ანგარიშგება და თემთან კომუნიკაცია;
 - X. გარემოსთან დაკავშირებული ინციდენტების/დაღვრის ანგარიშგება განმახორციელებელ სააგენტოსთან და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტთან, მათ შორის საკითხების აღმოფხვრის ზომები.
129. სამშენებლო კომპანიის გარემოს დაცვისა და სოციალური მენეჯერი პასუხისმგებელია შემდეგზე:
- i. განვითარების გეგმების ეფექტურად შესრულება პროექტის ციკლის მანძილზე და სამუშაოების შესრულება მოქმედი გარემოსდაცვითი/სოციალური/ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით;
 - ii. საჩივრების დაკმაყოფილების პროცესში ჩართვა და საჩივრების განხილვის მექანიზმის (GRM) ჟურნალის წარმოება;
 - iii. სამუშაო ობიექტების ჩაწერა და ფოტო-დოკუმენტაციის წარდგენა წინა სამშენებლო და სამშენებლო საქმიანობის დროს.
 - iv. შემდეგი ჩანაწერების წარმოება: (I) SEMP-ზე დაფუძნებული საკონტროლო სიებით ობიექტის ყოველკვირეული ინსპექტირება / სხვა გეგმები და ინსტრუმენტული გარემოსდაცვითი მონიტორინგი (თუ საჭიროა); (ii) გარემოსდაცვითი შემთხვევები / ინციდენტები და გადაწყვეტის ღონისძიებები; (vii) მონიტორინგის ანგარიშები; (viii) SEMP შესაბამისობის ყოველთვიური ანგარიშგება და თემთან კომუნიკაცია; (ix) შემუშავებული გეგმების შესრულება;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- v. მომზადებული გეგმების შესრულების ყოველთვიური ანგარიშგება და გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, SSEMP მონიტორინგის საკონტროლო სიებით ინსპექტირება;
 - vi. CSC/IA-სთვის დაუყოვნებლივი ანგარიშგება, თუ მშენებლობის დროს მოხდა სერიოზული გარემოსდაცვითი დარღვევა;
 - vii. ხმაურის, ვიბრაციის და ემისიების მუდმივი მონიტორინგის წარმოება;
 - viii. თითოეული აქტივობის გარემოზე ზემოქმედების დადგენა და პროექტის ვარიაციები;
 - ix. ყველა აუცილებელი გარემოსდაცვითი ნებართვის მოპოვება, რომლებიც აუცილებელია პროექტის განხორციელებისათვის; შესაბამისი ნებართვების უზრუნველყოფა ობიექტზე აქტივობების დაწყებამდე;
 - x. კლიენტსა და მომწოდებელს/ქვე-კონტრაქტორის შორის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ნაკადის კოორდინირება;
 - xi. ყველა წინა სამშენებლო, დაბინძურების პრევენციული, ნარჩენების მართვის, წყალმომარაგების, აგრეგატების, ფაუნისა და ვიზუალური მენეჯმენტის ამ გეგმაში მოცემული მოთხოვნების შესრულება და დაცვა;
 - xii. მონიტორინგის პროგრამის განხორციელება და ზედამხედველობა;
 - xiii. პროექტის მენეჯერისადმი ყოველდღიური ანგარიშების წარმოება და მიწოდება;
 - xiv. მონიტორინგის ღონისძიებების გატარების უზრუნველყოფა და შეფასების შედეგები; უზრუნველყოფა იმისა, რომ ყველა მაკორექტირებელი ან პრევენციული ღონისძიება დროულად ტარდება;
 - xv. პროექტის პერსონალის სრული ინფორმირება გარემოს დაცვით საკითხებზე;
 - xvi. სხვა შესაბამისი გეგმების შედგენა და შესაბამისი გაზომვების/კვლევების ჩატარება პროექტის განხორციელების პროცესში;
 - xvii. ქვე-კონტრაქტორებზე უშუალო ზედამხედველობა.
130. სამშენებლო და ზედამხედველი კომპანიების გარემოს დაცვის სპეციალისტებმა გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც სამშენებლო საქმიანობის დროს წარმოიქმნება, დაუყოვნებლივ უნდა მიაწოდონ მუნიციპალური განვითარების ფონდის უსაფრთხოების გუნდს; ძალისხმევის კოორდინირებისა და გავლენების დაუყოვნებლივი შერბილებისთვის დაიცვან გარემო და ადგილობრივი თემების ჯანმრთელობა.
131. თითოეული პროექტის გარემოსდაცვითი პერსონალის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია მე-2 ცხრილში.
132. განმახორციელებელი სააგენტოს მხარს უჭერს სამშენებლო ზედამხედველი კომპანია „ეპტისა“. სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი არის განხორციელების სააგენტოს კანონიერი წარმომადგენელი და იღებს სრულ პასუხისმგებლობას კონტრაქტორის აქტივობებზე და სამუშაოებზე პროფესიულ ზედამხედველობაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის სახელით. იგი უზრუნველყოფს, რომ კონტრაქტორები მკაცრად იცავდნენ დაწვრილებითი დიზაინის, ტექ. სპეციფიკაციების, გარემოსდაცვითი, სოციალური და გენდერული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს; იგი შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ადმინისტრირებას უწევს სამშენებლო ხელშეკრულებებს და უზრუნველყოფს, რომ ყველა სამუშაო სრულდება სამშენებლო ხელშეკრულებების დებულებების თანახმად.

133. სამშენებლო კომპანიას მოეთხოვება დანიშნოს გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის სრულ განაკვეთზე მომუშავე პერსონალის წევრი, რომელიც ჩართული იქნება ყველა სამუშაოს დასრულებამდე და უზრუნველყოფს უსაფრთხოების დოკუმენტების შესრულებას ზუსტად და შინაარსობრივად.

2.2.1. ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი

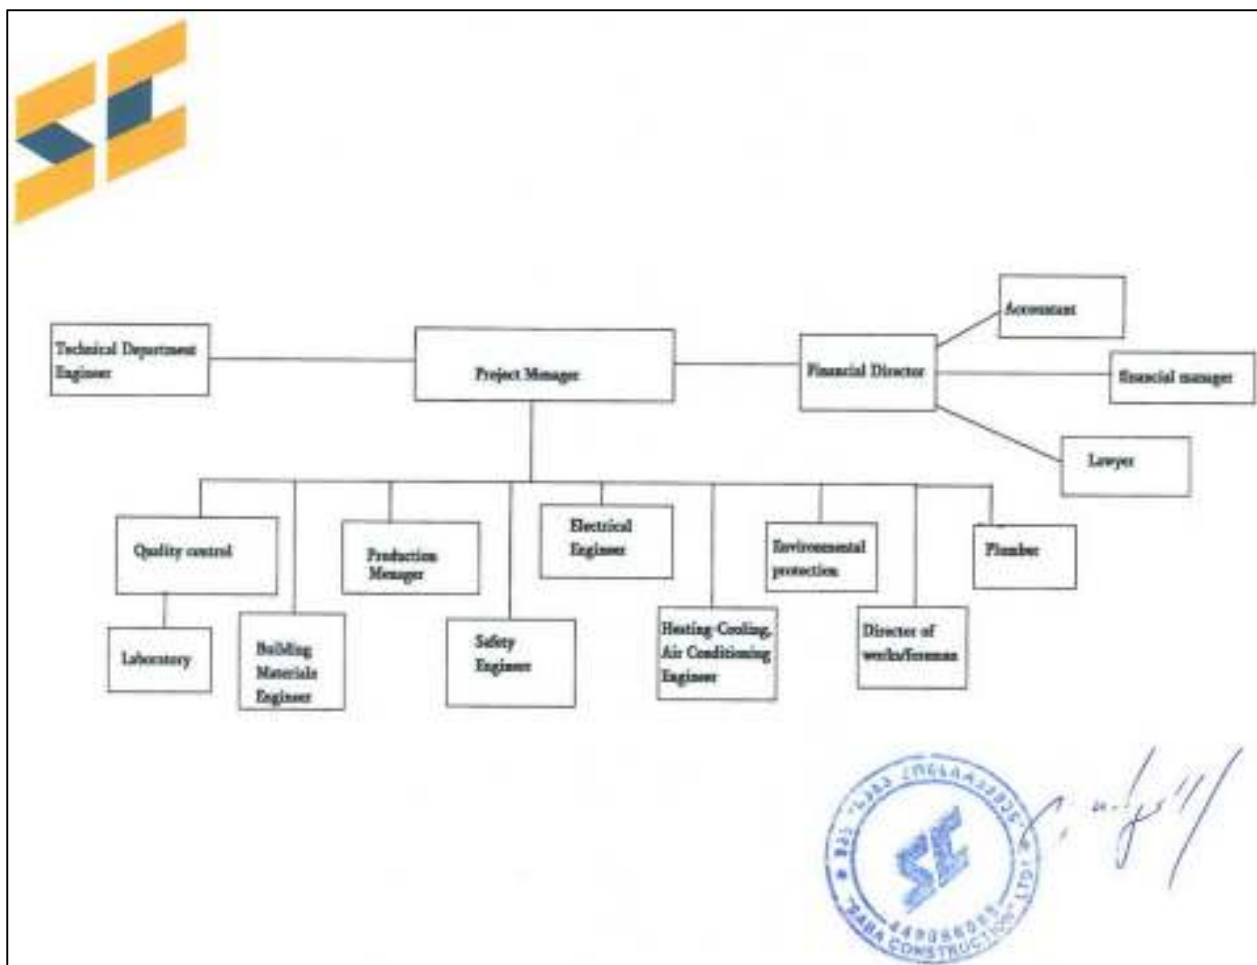
134. ზუგდიდის სპორტული კომპლექსის მშენებლობებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია „ნანტონგ სანჟან ჯორჯია“. თუმცა, კომპანიასთან ხელშეკრულება ამ დროისთვის შეჩერებულია.
135. ახალი სამშენებლო კომპანიის შესარჩევად, კონტრაქტი გაფორმდა 2023 წ. 10 ივლისს. დარჩენილ სამუშაოებს დაასრულებს სამშენებლო კომპანია - შპს „საბა ქონსტრაქშენი“, რომელმაც უკვე დაიწყო აქტიური სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოები. ამჟამად მიმდინარეობს სამშენებლო ობიექტის მოწყობა, დროებითი ნაგებობების მონტაჟი და დოკუმენტაციის მომზადება/წარმოდგენა.

2.2.2. ქუთაისის საცურაო აუზი

136. ქუთაისის საცურაო აუზის სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, მოეწყო და გამწვანდა გარე პერიმეტრი, დაიხაზა საპარკინგე ზონები. საცურაო აუზი, ისევე როგორც სავარჯიშო დარბაზი, სრულად ფუნქციონირებს. სამშენებლო კომპანიას ამჟამად აქვს დეფექტების აღმოფხვრის ერთწლიანი პერიოდი.

სურათი 30. სამშენებლო კომპანია „საბა ქონსტრაქშენის“ საორგანიზაციო გრაფიკი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

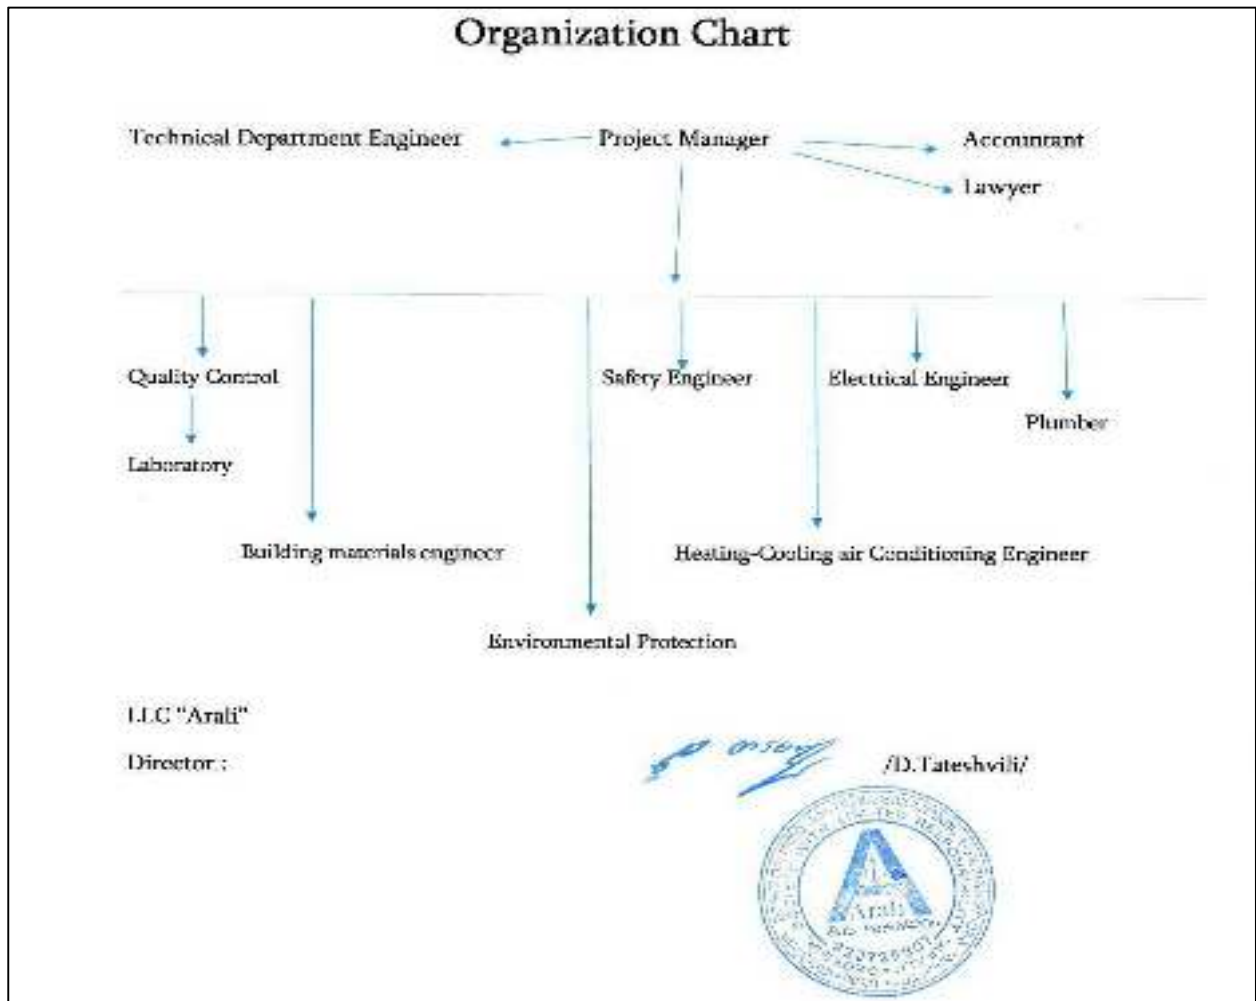


2.2.3. რუსთავის და ახალციხის სპორტული კომპლექსი

137. რუსთავის სპორტული კომპლექსი მშენებლობის პროექტის შესრულებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია შპს „არალი“. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია IEE/EMP შესრულებასა და კარგ სამშენებლო პრაქტიკაზე. აღნიშნული ვალდებულების შესრულებისათვის კონტრაქტორიმ შექმნა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების (HSES) გუნდი და ჩამოაყალიბა პროცედურები და სრულ განაკვეთზე დანიშნა ლიცენზირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების მენეჯერი (ბიძინა ბერიძე) პროექტის შესრულების პროცესის მანძილზე. ხსენებული მენეჯერი ადგილზე იქნება ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში და შეიმუშავებს მონიტორინგის ანგარიშებს საპროექტო ღონისძიებების გატარების განმავლობაში.
138. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი შპს „არალმა“ მოამზადა კონკრეტული სამშენებლო ობიექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (SSEMP), ხმაურის და ვიბრაციის მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის და აღდგენის გეგმა და ობიექტის მართვის გეგმა, რომელიც დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ დაიშვება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არ განიხილავს და გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 31. სამშენებლო კომპანია შპს „არალის“ საორგანიზაციო გრაფიკი LLC



2.2.4. საბავშვო ბაღი ძველ ანაგაში (სიღნაღი), საბავშვო ბაღი ქვემო ბოდბეში (სიღნაღი), საბავშვო ბაღი ჭიაურში (ლაგოდეხი)

139. ძველ ანაგაში (სიღნაღი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის, ქვემო ბოდბეში (სიღნაღი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის და ჭიაურში (ლაგოდეხი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტების განხორციელებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია შპს „ინსტალი“. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია IEE/EMP შესრულებასა და კარგ სამშენებლო პრაქტიკაზე. აღნიშნული ვალდებულების შესრულებისათვის კონტრაქტორიმ შექმნა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების (HSES) გუნდი და ჩამოაყალიბა პროცედურები და სრულ განაკვეთზე დანიშნა ლიცენზირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების მენეჯერი პროექტის შესრულების პროცესის მანძილზე. ხსენებული მენეჯერი ადგილზე იქნება ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში და შეიმუშავებს მონიტორინგის ანგარიშებს საპროექტო ღონისძიებების გატარების განმავლობაში.
140. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი შპს „ინსტალმა“ მოამზადა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP), რომელიც შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ შესრულდება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არ განიხილავს და არ გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე.

სურათი 32. სამშენებლო კომპანია შპს „ინსტალის“ საორგანიზაციო გრაფიკი LLC.



2.2.5. საბავშვო ბაღი ქუთაისში, საბავშვო ბაღი კურდღელაურში (თელავი)

141. კურდღელაურში (თელავი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის და ქუთაისში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტების განხორციელებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია „სათავე პლუს“. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია IEE/EMP შესრულებასა და კარგ სამშენებლო პრაქტიკაზე. აღნიშნული ვალდებულების შესრულებისათვის კონტრაქტორმა შექმნა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების (HSES) გუნდი და ჩამოაყალიბა პროცედურები და სრულ განაკვეთზე დანიშნა ლიცენზირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების მენეჯერი (ნინია უთმელიძე) - პროექტის შესრულების პროცესის მანძილზე. ხსენებული მენეჯერი ადგილზე იქნება ხელშეკრულების განხორციელების განმავლობაში და შეიმუშავებს მონიტორინგის ანგარიშებს საპროექტო ღონისძიებების გატარების განმავლობაში.
142. პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების (IEE)/გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP) მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი შპს „არალმა“ მოამზადა კონკრეტული სამშენებლო ობიექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (SSEMP), ხმაურის და ვიბრაციის მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის და აღდგენის გეგმა და ობიექტის მართვის გეგმა, რომელიც დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ შესრულდება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არ განიხილავს და გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე.

სურათი 33. სამშენებლო კომპანია „სათავე პლუსის“ საორგანიზაციო გრაფიკი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.2.6. საბავშვო ბავშვთა ცენტრში, საბავშვო ბავშვთა ცენტრში, საბავშვო ბავშვთა ცენტრში, საბავშვო ბავშვთა ცენტრში

143. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი შპს „აბეკას“ მოამზადა სამშენებლო ობიექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP), რომელიც დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ დაიშვება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განხორციელების სააგენტო არ განიხილავს და არ გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე.
144. კონტრაქტორმა, IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, ჩაატარა და ხმაურისა და ვიბრაციის, ნიადაგის დაბინძურების, ჰაერის დაბინძურების, სველე ფლორისა და ფაუნის სველე კვლევები და შედეგების საფუძველზე, წარმოდგენილი SSEMP-ის პარალელურად, მუშავდება შემდეგი გეგმები: საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმა, ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების და ანტი-COVID-19 გეგმები, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, ბანაკის ადგილის მართვის გეგმა, აღდგენის გეგმა.
145. სრულ განაკვეთზე მომუშავე გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (ES) მენეჯერი იმყოფება ადგილზე. იგი კვალიფიცირებულია და მინიმუმ აქვს სერტიფიკატები საქართველოს კანონებში, წესებსა და რეგულაციებში. პერსონალი ჩართული იქნება ყველა სამუშაოს დასრულებამდე და უზრუნველყოფს SSEMP-ს, სხვა მოთხოვნილი გეგმების და გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სხვა სახელშეკრულებო დებულებების შესრულებას.

სურათი 34. სამშენებლო კომპანია „აბეკას“ საორგანიზაციო გრაფიკი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

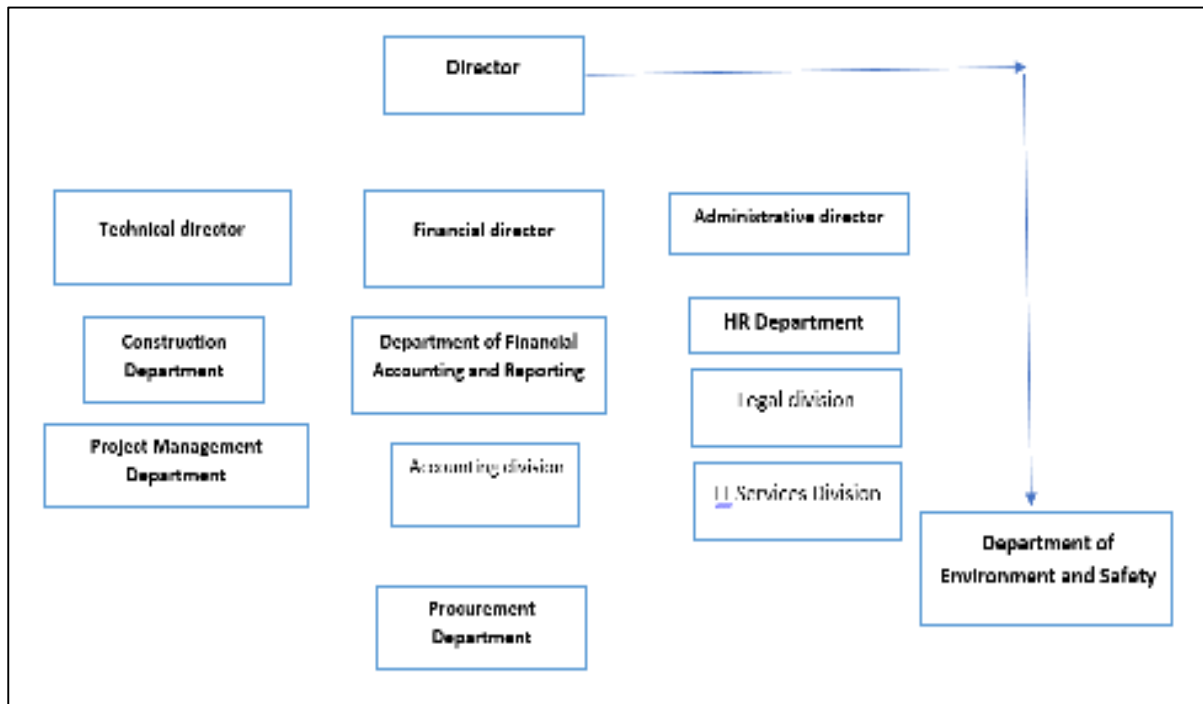


2.2.7. საბავშვო ბაღი ვარდისუბანში, საბავშვო ბაღი წინწყაროში, საბავშვო ბაღი შამგონაში, საბავშვო ბაღი დარჩელში

146. ვარდისუბანში (თელავი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის, წინწყაროში (თეთრი წყარო) საბავშვო ბაღის მშენებლობის და შამგონაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტების განხორციელებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია შპს „პროდუს ინვესტმენტ“.
147. კომპანიამ უკვე შეასრულა გარემოს დაცვის მართვისა და შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტრატეგია და პროცედურები, რომლებიც გამოიყენება სოფ. წინწყაროში საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროცესში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პროექტის განხორციელება გარემოს დაცვითი და შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად. გარემოს დაცვითი და შრომის უსაფრთხოების სტრატეგიისა და პროცედურების გასატარებლად, კომპანიამ დანიშნა უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯერები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან პროექტის განხორციელების თითოეულ სტადიაში და ასევე უზრუნველყოფენ IEE და SSEHSMP პირობების შესრულების მონიტორინგს და ანგარიშგებას კლიენტთან, როგორც ეს გათვალისწინებულია ხელშეკრულებაში.
148. შპს „პროდუს ინვესტმენტის“ გუნდმა მოამზადა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა (SSEHSMP), რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინა ზედამხედველ კომპანიას (SC) და მუნიციპალური განვითარების ფონდს. სამშენებლო სამუშაოების დაწყება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი დაამტკიცებს აღნიშნულ დოკუმენტს და გასცემს სამუშაოების დაწყების ნებართვას.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 35. სამშენებლო კომპანია „პროდუს ინვესტმენტის“ საორგანიზაციო გრაფიკი



2.2.8. საბავშვო ბაღი დიდიჭყონში, საბავშვო ბაღი სუფსაში, საბავშვო ბაღი ხაჯალიაში, საბავშვო ბაღი აგარაში

149. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორმა შპს „ჯორჯიან კონსტრუქშენ გრუპმა“ მოამზადა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP), რომელიც დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ დაიწყება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არ განიხილავს და არ გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე,
150. კონტრაქტორმა, IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, ჩაატარა ხმაურისა და ვიბრაციის, ნიადაგის დაბინძურების, ჰაერის დაბინძურების, საველე ფლორისა და ფაუნის საველე კვლევები და შედეგების საფუძველზე, წარმოდგენილი SSEMP-ის პარალელურად, მუშავდება შემდეგი გეგმები: საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმა, ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების და ანტი-COVID-19 გეგმები, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, (სამშენებლო) ბანაკის ადგილის მართვის გეგმა, აღდგენის გეგმა.
151. სრულ განაკვეთზე მომუშავე HSES მენეჯერები იმყოფებიან ადგილზე. ისინი კვალიფიცირებულები არიან და მინიმუმ აქვთ სერტიფიკატები საქართველოს კანონებში, წესებსა და რეგულაციებში. პერსონალი ჩართული იქნება ყველა სამუშაოს დასრულებამდე და უზრუნველყოფს SSEMP-ს, სხვა მოთხოვნილი გეგმების და გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სხვა სახელშეკრულებო დებულებების შესრულებას.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 36. სამშენებლო კომპანია „ჯორჯიან კონსტრაქშენ გრუპის“ საორგანიზაციო გრაფიკი



2.2.9. საბავშვო ბაღი ფოთში, საბავშვო ბაღი სენაკში

152. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი შპს „პრაიმ ბეტონმა“ მოამზადა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP), რომელიც დაფუძნებულია დეტალურ საინჟინრო პროექტზე და გარემო პირობების შეფასებაზე. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი სამუშაო არ დაიშვება, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განხორციელების სააგენტო არ განიხილავს და არ გასცემს ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე,
153. კონტრაქტორმა, IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, ჩაატარა და ხმაურისა და ვიბრაციის, ნიადაგის დაბინძურების, ჰაერის დაბინძურების, საველე ფლორისა და ფაუნის საველე კვლევები და შედეგების საფუძველზე, წარმოდგენილი SSEMP-ის პარალელურად, მუშავდება შემდეგი გეგმები: საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმა, ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების და ანტი-COVID-19 გეგმები, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, ბანაკის ადგილის მართვის გეგმა, აღდგენის გეგმა.
154. სრულ განაკვეთზე მომუშავე HSES მენეჯერი (ბესიკ ებანოიძე) იმყოფება ადგილზე. იგი კვალიფიცირებულია და მინიმუმ აქვს სერტიფიკატი საქართველოს კანონებში, წესებსა და რეგულაციებში. პერსონალი ჩართული იქნება ყველა სამუშაოს დასრულებამდე და უზრუნველყოფს SSEMP-ს, სხვა მოთხოვნილი გეგმების და გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სხვა სახელშეკრულებო დებულებების შესრულებას.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

[illegible]

155. 2021 წლის 23 დეკემბერს, პროექტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას (N: LCIP/CW/015-2020) მუნიციპალური განვითარების ფონდს და შპს „ინსის“ და შპს „ჯავას“ ერთობლივ საწარმოს შორის. 2022 წლის 24 იანვარს, სამშენებლო კომპანიას მიეცა ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყების ნებართვა.
156. პროექტისთვის შემუშავებული IEE წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ამგვარად, სამშენებლო კომპანია პასუხისმგებელია პროექტით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნის შესრულებაზე.
157. ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელზეც კონტრაქტორი უსაფრთხოების მოთხოვნებს გაეცნო (იხ. სურ. 39).

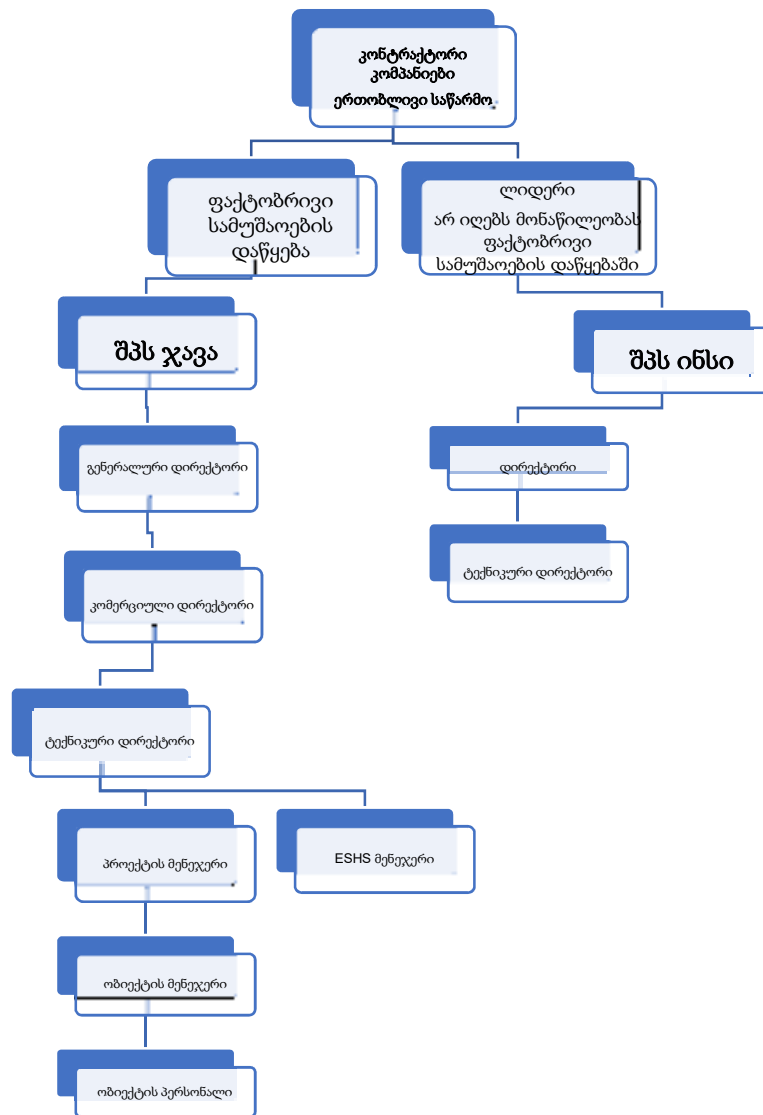
შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



158. IEE/EMP მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორმა - შპს „ჯავას“ და შპს „ინსის“ ერთობლივმა საწარმომ მოამზადა ობიექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP) და მისი ქვე-გეგმები და წარუდგინეს ისინი განმახორციელებელ სააგენტოს. 2022 წლის 24 იანვარს, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გასცა ავტორიზაცია სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე.
159. IEE მოთხოვნების შესაბამისად, სამშენებლო კომპანიამ დანიშნა გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის პერსონალი ხელშეკრულების მანძილზე (იხ. ცხრ. 3 და სურ. 37). პერსონალის საკვანძო პასუხისმგებლობა შემდეგია (თუმცა არ შემოიფარგლება ჩამოთვლილით): სხვა გეგმებთან ერთად SSEMP-ს ეფექტური შესრულების უზრუნველყოფა მშენებლობის განმავლობაში, ასევე იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა სამუშაო სრულდება ყველა მოქმედი გარემოსდაცვითი/სოციალური/ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით; პერსონალი ჩართულია საჩივრების დაკმაყოფილების პროცესში, ობიექტის ჩანაწერების წარმოებაში, განხორციელების სააგენტოსა და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტისათვის ანგარიშგებაში გარემოსდაცვითი ინციდენტების/გაჟონვების შესახებ, მათ შორის საკითხების გადაწყვეტის შესახებ ანგარიშგება; მომზადებული გეგმების შესრულების შესახებ ყოველთვიური ანგარიშგება, რეგულარული ინსტრუმენტული გაზომვების ჩატარება და ა.შ.

სურათი 39. სამშენებლო კომპანიის საორგანიზაციო გრაფიკი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



2.2.11. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში

160. ფარცხისში (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი) საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის შესრულებისთვის შერჩეულია სამშენებლო კომპანია შპს „ბალავარი“. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია IEE/EMP შესრულებასა და კარგ სამშენებლო პრაქტიკაზე. აღნიშნული ვალდებულების შესრულებისათვის კონტრაქტორმა შექმნა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების (HSES) გუნდი და ჩამოაყალიბა პროცედურები და სრულ განაკვეთზე დანიშნა ლიცენზირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების მენეჯერი პროექტის შესრულების პროცესის მანძილზე. ხსენებული მენეჯერი (დავით დონაძე) ადგილზე იქნება ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში და შეიმუშავებს მონიტორინგის ანგარიშებს საპროექტო ღონისძიებების გატარების განმავლობაში.
161. IEE/EMP მოთხოვნებთან შესაბამისად, სამშენებლო კომპანიამ მოამზადა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP) და მისი ქვე-გეგმები. აღსანიშნავია, რომ

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

არც ერთი სამუშაო არ დაიშვებოდა, სანამ მუნიციპალური განვითარების ფონდი - პროექტის განხორციელების სააგენტო არ განიხილავდა და არ გასცემდა ავტორიზაციას სამშენებლო საქმიანობის გაგრძელებაზე,

სურათი 40. სამშენებლო კომპანიის საორგანიზაციო გრაფიკი

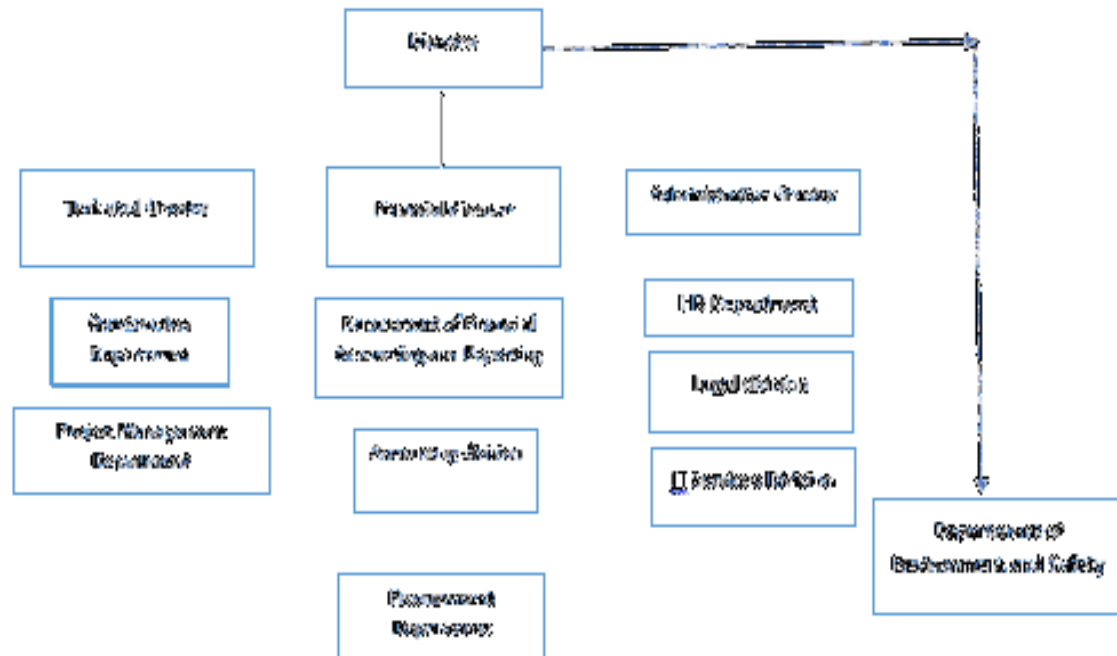


2.2.12. ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა

162. ზუგდიდში, ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე შეირჩა სს „მეთაგ ინშაათ თიჯარეთის“ ფილიალი საქართველოში. კომპანია სამშენებლო სამუშაოებს მასსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის 2022 წლის 8 სექტემბერს გაფორმებული NLCIP/CW/018-2022 ხელშეკრულების ფარგლებში განახორციელებს.
163. გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების სტრატეგიისა და პროცედურების გასატარებლად, კომპანიამ დანიშნა უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯერები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან პროექტის განხორციელების თითოეულ სტადიაში და ასევე უზრუნველყოფენ IEE და SSEMP პირობების შესრულების მონიტორინგს და ანგარიშგებას დამკვეთთან, როგორც ეს გათვალისწინებულია ხელშეკრულებაში. ქვემოთ მოცემული სურათი აღწერს კომპანიის ორგანიზაციულ სტრუქტურას.
164. ამ პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორმა შეიმუშავა სამშენებლო მოედნის გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (SSEMP) და მისი ქვე-გეგმები. ეს დოკუმენტები განიხილა და პირობითად დაამტკიცა მშენებლობის ზედამხედველმა კომპანიამ (SCS), 2022 წლის 30 ნოემბერს. კონტრაქტორი აგრძელებს მუშაობას ამ გეგმების მიხედვით.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 41. სს „მეტაგ ინშაათ თიჯარეთის“ საქართველოს ფილიალის საორგანიზაციო გრაფიკი



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ცხრილი 2. სპორტული კომპლექსების, საბავშვო ბაღების და ურბანული განახლების პროექტების გარემოსდაცვითი პერსონალის სია

ორგანიზაცია	სახელი	თანამდებობა	ტელეფონი	ელ-ფოსტა
სესხის გამცემი - აზიის განვითარების ფონდი	ნინეტ პაჯარილაგა	გარემოს დაცვის უფროსი სპეციალისტი პორტფოლიო, შედეგები, უსაფრთხოება და გენდერის განყოფილება		ndjenchuraev@adb.org
	ნინო ნადაშვილი	უსაფრთხოების ასოცირებული ოფიცერი აგზ (ADB) დავების მოგვარების მექანიზმი (GRM)	995577440990	nnadashvili@adb.org
	გიორგი კობალაძე	გარემოსდაცვითი კონსულტანტი		Gkobaladze.consultant@adb.org
სესხის მიმღები - მუნიციპალური განვითარების ფონდი	მარიამ სარსევანიძე	გარემოს დაცვის სპეციალისტი	555388863	msarsevanidze@mdf.org.ge
	ნინიკო ისაკაძე	გარემოს დაცვის სპეციალისტი	593624567	nisakadze@mdf.org.ge
	ზაზა მოისწრაფიშვილი	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (HS) სპეციალისტი	577 77 00 75	zmoistsrapishvili@mdf.org.ge
სამშენებლო ზედამხედველი კომპანია - ეპტისა	სოფო ბერიშვილი	გარემოს დაცვის მთავარი სპეციალისტი	599 27 00 49	sophiko1@hotmail.com
	გიორგი შალამბერიძე	გარემოს დაცვის არა-მთავარი სპეციალისტი	577 04 65 26	giorgishal@gmail.com

	მამუკა შაორშაძე	გარემოს დაცვის მთავარი სპეციალისტი	595 116 071	m.shaorshadze@gmail.com
	ნიკა გოგიტიძე	გარემოს დაცვის არა-მთავარი სპეციალისტი	598 78 32 32	nikagogitidze88@gmail.com
	მაკა ბურჯანაძე	გარემოს დაცვის არა-მთავარი სპეციალისტი	599 500 770	mburjanadze@yahoo.com
	გიორგი ბერაძე	ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი	574 09 55 22	G.beradze@gergili.ge
	ნათია კარკუზაევი	ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტი	599 27 00 49	karkuzaevi@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს საბა კონსტრაქშენი</u>	ნიკო ჯაშიაშვილი	ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის (HSES) მენეჯერი	577 990 325	niko.jashiashvili@mail.ru
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს „არალი“</u>	ლევან კობახიძე	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (H&E) მენეჯერი	544 446 999	l.kobxa1980@gmail.com
	ბიძინა ბერიძე	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (ES) მენეჯერი	595 000 669	bidzina02@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - სათავე პლუს</u>	ნინია უთმელიძე	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (E&S) მენეჯერი	591 517 512	niniautmelidze@gmail.com
	თათია გრიგალაშვილი	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (HS) მენეჯერი	599 60 76 65	tatiagrigalashvili57@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს „ინსტალი“</u>	დათო შევარდნაძე	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (E&S) მენეჯერი	595 334 437	dshevardnadze@gmail.com

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	ვახტანგ სახოკია	H&S მენეჯერი	599557950	sakhokia@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს „აბეკა“</u>	თამარ ფურელიანი	HSE მენეჯერი	598 471 700	tamarifureliani@yahoo.com
	დავით მჟავანაძე	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (E&S) მენეჯერი	577 618 740	davit.mzhavanadze7@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს „პროდუს ინვესტმენტ“</u>	ანა კვარაცხელია	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (E&S) მენეჯერი	558 658 386	akvaratskhelia@gamil.com
	ნინო ენდელაძე	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (HS) მენეჯერი	595087977, 596999920	endeladzenini@gmail.com
	ზაზა ხვიტია		592092522	z.khvitia@gmail.com
სამშენებლო კომპანია - ერთობლივი საწარმო „ჯავა“ შპს ინსი	მაგდა კირთაძე	გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების (E&S) მენეჯერი	593751198	m.kirtadze@javaltd.ge
	თამაზ ჯავახიშვილი	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (HS) მენეჯერი	574 191 960	Tazo.javaxishvili@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს „ჯორჯიან კონსტრაქშენ გრუპ“</u>	ბესო ებანოიძე	ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის (HSES) მენეჯერი	599 119 893	bebanoidze@gmail.com
<u>სამშენებლო კომპანია - შპს პრაიმ ბეტონი</u>	თინათინ ჟიჟიაშვილი	გარემოს დაცვის მენეჯერი	577 380 113	tikozhizhiashvili@yahoo.com
	გიორგი მაკალათია	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების (HS) მენეჯერი	591282068	safety@primeconcrete.ge

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შპს „ბალავარი“	მიხეილ დონაძე	ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის (HSES)	591 03 02 28	mdonadze@balavaridevelopment. ge
შპს მეთაგ ინსაათი თიჯარათის ფილიალი	ანა კვარაცხელია	გარემოს დაცვის სპეციალისტი	558 65 83 86	ana.kvaratskhelia.em@gmail.co m
	ზაზა კვიცია	ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტი	591 608 398	<u>z.khvitia@gmail.com</u>

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.3. პროექტის ღონისძიებები მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში

2.3.3. ზუგდიდის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის მიმდინარეობა ანგარიშგების პერიოდში

166. ანგარიშგების პერიოდში სამშენებლო სამუშაოები შეჩერებულია

2.3.4. ქუთაისის საცურაო აუზის მშენებლობა

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
რკინაბეტონის და ლითონის სამშენებლო სამუშაოები	100
კედლები და ტიხრები	100
სახურავის მოწყობა	100
კარ-ფანჯრის სამონტაჟო სამუშაოები	100
სახურავზე ბოილერის ოთახის მოწყობა	100
იატაკის მოწყობა	100
ფასადის სამუშაოები	100
ტრიბუნების მოწყობა 528 ადგილი	100
საუნის მოწყობა	100
ტრამპლინების მოწყობა	100
სარდაფის კიბის მოწყობა	100
დრენაჟის მოწყობა	100
მეხამრიდი	99
დამიწება	100
წყალმომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა	100
საკანალიზაციო შიდა ქსელის მოწყობა	100
დიდი საცურაო აუზის ტექნოლოგიური ნაწილი	100
პატარა საცურაო აუზის ტექნოლოგიური ნაწილი	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

გათბობის გაგრილების სისტემები	100
ჰაერის კონდიცირება - სავენტილაციო სისტემები	99
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა	99
სუსტი დენები (კომპიუტერიზაცია, ტელეფონიზაცია, სახანძრო სიგნალიზაციის კონტროლი, უსაფრთხოების სიგნალიზაცია და სათვალთვალო კამერა)	100
ტუმბოს (დანადგარის) სამშენებლო სამუშაოები	98
წყალმომარაგების გარე ქსელი	99
კანალიზაციისა და გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოები	100
ადგილის ვერტიკალური დაგეგმვა	100
გზების და სკვერების მოწყობა	100
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და ეზოს სკამების მოწყობა	100
სადრენაჟე არხის მოწყობა	100
საცურაო აუზის განათების მოწყობის სამუშაოები	100
ტერიტორიის შემოღობვა	100

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი MST-642 MST-642 - 1
- ამწე XCMG/QY70K - 1
- ავტო ბასკეტი A3 – 1
- ავტო ურიკის მაკრატელი - 1
- ავტოთვიტმცლელი MAN- 1
- კომპაქტორი – 1
- ბეტონის ტუმბო - 1
- ელ. მიქსერი ტუმბოთი - 1
- დამტვირთველი Manitou - 1
- მიკრო სატვირთო მანქანა „Mitsubishi“ - 1
- მიქსერი და ტუმბო - 1.

სამუშაო ძალა ობიექტზე

167. ობიექტზე დასაქმებულია 37 ადამიანი.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 42. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ფლაგშტოკების კაბელების და შკივების ფიქსაცია, ბურთის სფეროების შედუღება მილების თავზე, ნაგებობების შეღებვა : 07/2022	საქვებში შემავალი მილების შეფუთვა - მეტალის ჩარჩოს მოწყობა და დაფარვა ალუკაბონდის ფილებით: 06/2023

2.3.5. რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშების პერიოდში

საპროექტო სამუშაოები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	97
სადირკველების მოწყობა	99
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	96
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	99
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	98
ღობის მოწყობა	97
ბოილერის შენობის მოწყობა	70

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

პირველი სართულის გარე კედლების მოწყობა	98
მე-2 სართლის გარე კედლების მოწყობა	97
შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა	98
შიდა მობათქაშების სამუშაოები	95
ფასადის შელესვა	98
კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა	98
ელ. კომუნიკაციების მოწყობა	95
გათბობის, ვენტილაციის და საჰაერო კონდიციონერების მოწყობა	58
წყლის სისტემების მოწყობა	97
შიდა საინჟინრო ქსელების დაერთება გარე ქსელებზე	65
იატაკების მოწყობა	40
შეღებვა	0
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	95

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ინვენტარი - ინსტრუმენტები
- სივრცითი ხარაჩოები - 4000მ²
- კედლის ხარაჩოები - 4000მ²
- საავტომობილო ურიკა - 2
- ელექტრო შედუღების აპარატები - 6
- პნევმატური ხელსაწყოები - 1
- მიქსერები - 3
- ექსკავატორები - 2
- ავტოთვიმცლელი - 3
- პერფორატორი - 4

სამუშაო ძალა ობიექტზე

168. ობიექტზე დასაქმებულია 65 ადამიანი.

სურათი 43. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ფასადის სამუშაოები: 06/2023	გადახურვის სამუშაოები/ხარაჩოების მოწყობის პროცესი: 06/2023

საპროექტო სამუშაოები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	80
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	0
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	69
პირველი სართულის გარე კედლების მოწყობა	76
მე-2 სართლის გარე კედლების მოწყობა	34
შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა	51
შიდა მობათქაშების სამუშაოები	25
ფასადის შელესვა	0
კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა	0
ელ. კომუნიკაციების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციის და საჰაერო კონდიციონერების მოწყობა	19

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

წყლის სისტემების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების დაერთება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შეღებვა	0
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- ბეტონის ტუმბო - 1
- ავტოთვითმცლელი - 1
- ბეტონის მიქსერი - 1
- ამწერ - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

169. ობიექტზე დასაქმებულია 2 ადამიანი.

სურათი 44. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ბეტონის შერევის პროცესი: 05/2023	ლესვითი სამუშაოები: 05/2023

2.3.5. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	75
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	20
ბოილერის შენობის მოწყობა	76
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	96.7
ფასადის ბათქაში	97.5
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	98.5
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	84
გათბობის, ვენტილაციისა და საჰაერო კონდიციონერების მოწყობა	68
წყლის ობიექტების მოწყობა	80
შიდა საინჟინრო ქსელების დაერთება გარე ქსელებზე	50
იატაკების მოწყობა	77
შეღებვის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ავტოთვითმცლელი - 1
- ელექტრო ხერხი – 1
- საარმატურო რკინის მღუნავი მანქანა - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

170. ობიექტზე დასაქმებულია 2 ადამიანი.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 45. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
სამღებრო სამუშაოები: 04/2023	დროებით დახურულია: 06/2023

2.3.6. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
საძირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	50
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	95
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	95
ფასადის ბათქაში	0
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	60

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ელექტრო ობიექტების მოწყობა	1
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	60
წყლის ობიექტების მოწყობა	50
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	35
იატაკების მოწყობა	90
შედგენის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	10

ადჭურვილობა ობიექტზე

- ელექტრო ხერხი - 3
- კუთსახები - 3
- ბურღი - 3
- წრიული ხერხი - 2
- პერფორატორი - 2
- შედუღების აპარატი - 1
- დურგლის ჩაქუჩი - 8

სამუშაო ძალა ობიექტზე

171. ობიექტზე დასაქმებულია 6 ადამიანი.

სურათი 46. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ფასადის სამუშაოები: 06/2023	ლესვითი სამუშაოები: 06/2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.3.7. საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	93
საძირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	98
ბოილერის შენობის მოწყობა	98
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	97
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	97
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	99
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	70
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	65
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	80
წყლის ობიექტების მოწყობა	80
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	40
იატაკების მოწყობა	50
შეღებვის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	70
ტერიტორიის გამწვანება	20

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ხელის ურიკა - 3

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- ავტოთვიტმცლელი - 1
- პატარა სატკეპნი - 1
- პერფორატორი -3
- ბურღი - 2
- ჩამჩა - 7

სამუშაო ძალა ობიექტზე.

172. ობიექტზე დასაქმებულია 19 ადამიანი.

სურათი 47. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
საბათქაშო სამუშაოები: 06/2023	პერიმეტრის შევება ხრემით: 06/2023

2.3.8. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	94
საძირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	85
ბოილერის შენობის მოწყობა	82
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	99
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	97
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	97
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	87
წყლის ობიექტების მოწყობა	96
შეღებვის სამუშაოები	80
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	64
ტერიტორიის გამწვანება	97

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი MST-642 - 1
- აძწე „Kamaz“ – 1
- ტრაქტორი JSB – 1
- აძწე - 1
- მანიპულატორი - 1.

სამუშაო ძალა ობიექტზე

173. ობიექტზე დასაქმებულია 17 ადამიანი.

სურათი 48. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

კაფელის და იატაკის ფილის დაგება: 05/2023	შემოღობვის მოწყობა: 05/2023
--	------------------------------------

2.3.9. საბავშვო ბაღის მშენებლობა სუფსაში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	100
ბოილერის შენობის მოწყობა	100
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	100
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	100
წყლის ობიექტების მოწყობა	100
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	100
იატაკების მოწყობა	100
შეღებვის სამუშაოები	100
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	100
ტერიტორიის გამწვანება	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- გრუნტის სატკეპნი - 1
- ტუმბო - 2
- ავტოთვითმცლელი - 2
- კუთხსახეხი - 2
- ელექტრო ხერხი - 1
- ავტოდამტვირთველი „ბოზკატი“ - 1
- მცირე დამტვირთველი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

174. ობიექტზე დასაქმებულია 31 ადამიანი.

სურათი 49. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ფასადის ხედი: 06/2023	მიმდინარეობს დალაგება: 06/2023

2.3.10. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	100
ბოილერის შენობის მოწყობა	100
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ელექტრო ობიექტების მოწყობა	100
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიცირების მოწყობა	100
წყლის ობიექტების მოწყობა	100
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	100
იატაკების მოწყობა	100
შედგენის სამუშაოები	100
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	100
ტერიტორიის გამწვანება	100

ადჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- გრუნტის სატკეპნი - 1
- ტუმბო – 1
- ავტოთვითმცლელი - 2
- კუთხსახეხი - 2
- არმატურის საჭრელი დანადგარი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

175. ობიექტზე დასაქმებულია 28 ადამიანი.

სურათი 50. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ფასადის ხედი: 06/2023	დასუფთავებულია სათანადოდ: 06/2023
-----------------------	-----------------------------------

2.3.11. საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდიჭყონში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	0
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	85
ღობის მოწყობა	95
გარე მონოლითური პანდუსის და კიბეების მოწყობა	65
ბოილერის შენობის მოწყობა	95
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	65
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	95
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	60
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	45
წყლის ობიექტების მოწყობა	90
ჭაბურღილი	55
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	45
იატაკების მოწყობა	55
შეღებვის სამუშაოები	60
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ტერიტორიის გამწვანება	55
-----------------------	----

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- ავტოთვიტმცლელი - 1
- არმატურის მჭრელი მექანიზმი – 1
- არმატურის მჭრელი მექანიზმი – 1
- მანიპულატორი - 1
- არმატურის მჭრელი მექანიზმი - 1.

სამუშაო ძალა ობიექტზე

176. ობიექტზე დასაქმებულია 26 ადამიანი.

სურათი 51. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
გარე კედლების შემოსვა: 06/2023	შიდა გზების, ქვიშა-ხრეშის საძირკვლის მოწყობა: 06/23

2.3.12. საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	95
საძირკვლების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ბოილერის შენობის მოწყობა	95
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	95
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	95
წყლის ობიექტების მოწყობა	90
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	80
იატაკების მოწყობა	95
შეღებვის სამუშაოები	100
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	95
ტერიტორიის გამწვანება	85

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ავტოთვითმცლელი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

177. ობიექტზე დასაქმებულია 78 ადამიანი.

სურათი 52. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ხედი ფასადზე: 06/2023	ტერიტორიის კეთილმოწყობა: 06/2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.3.13. საბაგეშო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სამირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	100
ბოილერის შენობის მოწყობა	100
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	100
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	97
წყლის ობიექტების მოწყობა	100
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	95
იატაკების მოწყობა	100
შეღებვის სამუშაოები	100
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	100
ტერიტორიის გამწვანება	97

აღჭურვილობა ობიექტზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- ჩამჩა -2

სამუშაო ძალა ობიექტზე

178. ობიექტზე დასაქმებულია 2 ადამიანი.

სურათი 53. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ფასადი: 06/2023	შიდა ხედი: 06/2023

2.3.14. საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
საძირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	100
ბოილერის შენობის მოწყობა	100
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	95
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	100
წყლის ობიექტების მოწყობა	100
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	100
იატაკების მოწყობა	95
შეღებვის სამუშაოები	90
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	90
ტერიტორიის გამწვანება	90

აღჭურვილობა ობიექტზე

არ არის.

სამუშაო ძალა ობიექტზე

179. ობიექტზე დასაქმებულია 4 ადამიანი.

სურათი 54. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
იატაკის ფილების დაგება: 05/2023	სათანადოდ დასუფთავებული: 05/2023

2.3.15. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების
-----------------------	---------------

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სამირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	70
ღობის მოწყობა	90
ბოილერის შენობის მოწყობა	70
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	90
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	90
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	90
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	40
წყლის ობიექტების მოწყობა	90
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	10
შეღებვის სამუშაოები	70
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	60
ტერიტორიის გამწვანება	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ბურღი – 2
- კუთხსახეხი - 3
- ექსკავატორი - 1
- წრიული ხერხი – 1
- პერფორატორი - 2

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- შედუღების აპარატი - 1
- დურგლის ჩაქური - 5.

სამუშაო ძალა ობიექტზე

180. ობიექტზე დასაქმებულია 10 ადამიანი.

სურათი 55. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ფასადის შეღების პროცესი: 06/2023	კანალიზაციის მილების მოწყობა სველ ადგილებში: 06/2023

2.3.16. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	0
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	70
ღობის მოწყობა	90
გარე მონოლითური პანდუსის და კიბეების მოწყობა	85

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ბოილერის შენობის მოწყობა	75
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	100
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	75
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	65
წყლის ობიექტების მოწყობა	90
ჭაბურღილი	36
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	40
შეღებვის სამუშაოები	70
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	55
ტერიტორიის გამწვანება	40

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- ელექტრო გენერატორი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

181. ობიექტზე დასაქმებულია 16 ადამიანი.

სურათი 56 მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
არმსტრონგის ჭერის მოწყობა: 06/2023	კედლების დაფარვა კერამიკული ფილებით სველ წერტილებში: 05/2023

2.3.17. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყარში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	60
ღობის მოწყობა	90
ბოილერის შენობის მოწყობა	80

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	97
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	97
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	90
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	70
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	50
წყლის ობიექტების მოწყობა	35
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	30
იატაკების მოწყობა	40
შედლების სამუშაოები	10
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	70
ტერიტორიის გამწვანება	15

აღჭურვილობა ობიექტზე

- კომპაქტორი – 1
- აღჭურვილობა ლესვითი სამუშაოებისთვის - 1
- ხელის ელექტრო ინსტრუმენტები - 1
- კუთხსახეხი - 2

სამუშაო ძალა ობიექტზე

182. ობიექტზე დასაქმებულია 20 ადამიანი.

სურათი 57. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ლიფტის მოწობის სამუშაოები: 05/2023	კედლების გათეთრება: 05/2023

2.3.18. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	97
სამირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	100
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	75
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	70
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	90
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	50
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	80
ფასადის ბათქაში	0
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	80
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	50
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	60
იატაკების მოწყობა	0
შეღებვის სამუშაოები	0
ბოილერი, სახანძრო წყლის ავზი	40
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 2
- ექსკავატორი - 1
- კომპაქტორი - 1
- ბეტონის მიქსერი - 1
- ბეტონის ტუმბო - 1
- შედუღების აპარატი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

183. ობიექტზე დასაქმებულია 22 ადამიანი.

სურათი 58 მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ლესვითი სამუშაოები: 06/2023	ფასადის მოწყობის პროცესი: 05/2023
-----------------------------	-----------------------------------

2.3.19. საბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	80
სადირკველების მოწყობა	100
საყრდენი კედლები	70
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	90
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	0
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	0
სახურავის მოწყობა	0
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	0
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	0
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	0
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	0
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	0
ფასადის ბათქაში	0
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	0
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შედგენის სამუშაოები	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 2
- ბეტონის მიქსერი – 1
- ბეტონის ტუმბო - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

184. ობიექტზე დასაქმებულია 17 ადამიანი.

სურათი 59. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
არმატურის და ბადის მოწყობა: 06/2023	სამშენებლო მასალების მოტანა: 06/2023

2.3.20. საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	10
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	0
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	100
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	100
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	100
ფასადის ბათქაში	100
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	80
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	60
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შეღებვის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 2
- მიქსერი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

185. ობიექტზე დასაქმებულია 10 ადამიანი.

სურათი 60. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ელ. სამონტაჟო სამუშაოები: 05/2023	მეტალის ნაწილების ელ. შედუღება: 05/2023

2.3.21. ახალციხის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
საძირკვლების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	98
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	98
სახურავის მოწყობა	5
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	0
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	98
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	95
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	95
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	70
ფასადის ბათქაში	0
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	2

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შედლების სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	100

ადჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი JCB– 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 1
- ბეტონის მიქსერი - 5
- ბეტონის ტუმბო - 1
- შედულების აპარატი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

186. ობიექტზე დასაქმებულია 47 ადამიანი.

სურათი 61. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



შიდა ლესვითი სამუშაოები: 06/2023

შიდა პერიმეტრის გასუფთავება: 06/2023

2.3.22. საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	90
სამირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	80
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	95
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	25
სახურავის მოწყობა	0
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	0
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	0
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	0
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	0
ფასადის ბათქაში	0
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	0
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შედგენის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

ადჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი– 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 1
- ბეტონის მიქსერი - 5
- ბეტონის ტუმბო - 1
- შედულების აპარატი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

187. ობიექტზე დასაქმებულია 13 ადამიანი.

სურათი 63. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
სვეტების დაბეტონების სამუშაოები: 06/2023	სვეტების ამოყვანის სამუშაოები: 06/2023

2.3.23. საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	70
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	100
სახურავის მოწყობა	10
ღობის მოწყობა	5
ბოილერის შენობის მოწყობა	60
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	60
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	95
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	90
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	85
ფასადის ბათქაში	5
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	20
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	30
იატაკების მოწყობა	0
შეღებვის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

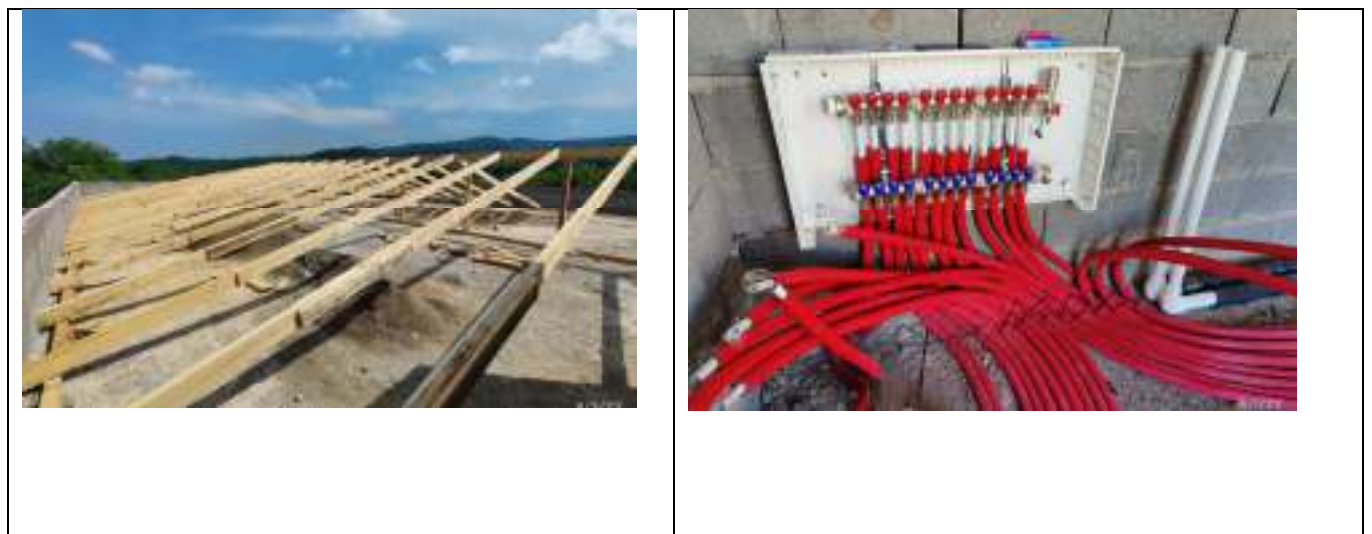
აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი – 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი -2
- ბეტონის მიქსერი - 1
- ბეტონის ტუმბო - 1
- ამწე - 1
- შედულების აპარატი – 2

სამუშაო ძალა ობიექტზე

188. ობიექტზე დასაქმებულია 82 ადამიანი.

სურათი 64. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სახურავის მოწყობა: 06/2023	გათბობის მიღების მოწყობა: 06/2023
----------------------------	-----------------------------------

2.3.24. საბავშვო ბაღის მშენებლობა დარჩეულში

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

პროექტის ღონისძიებები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
მიწის სამუშაოები	100
სადირკველების მოწყობა	100
კონსტრუქციული სამუშაოები ქვედა სართულზე	0
კონსტრუქციული სამუშაოები 1-ელ სართულზე	100
კონსტრუქციული სამუშაოები მე-2 სართულზე	40
სახურავის მოწყობა	0
ღობის მოწყობა	0
ბოილერის შენობის მოწყობა	30
გარე კედლების მოწყობა 1-ელ სართულზე	40
გარე კედლების მოწყობა მე-2 სართულზე	100
შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	50
შიდა საბათქაშე სამუშაოები	0
ფასადის ბათქაში	60
კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	0
ელექტრო ობიექტების მოწყობა	0
გათბობის, ვენტილაციისა და ჰაერის კონდიციონირების მოწყობა	0
წყლის ობიექტების მოწყობა	0
შიდა საინჟინრო ქსელების მიმაგრება გარე ქსელებზე	0
იატაკების მოწყობა	0
შედგენის სამუშაოები	0
სათამაშო მოედნების და ფარდულების მოწყობა	0
ტერიტორიის გამწვანება	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი – 1
- თვითმცლელი სატვირთო ავტომობილი - 1
- ბეტონის მიქსერი - 1
- ბეტონის ტუმბო - 1
- ამწე - 1
- შედუღების აპარატი – 2

სამუშაო ძალა ობიექტზე

189. ობიექტზე დასაქმებულია 17 ადამიანი.

სურათი 65. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ფოტო მასალა

	
ბლოკების დაწყობა: 05/2023	ლესვითი სამუშაოები: 05/2023

2.3.25. ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია

სამშენებლო საქმიანობა და პროექტის პროგრესი ანგარიშგების პერიოდში

190. მიმდინარე პროექტები ანგარიშგების პერიოდში:

- თეატრი
- ავტობუსების სადგური
- ადმინისტრაციული შენობა
- მოედანი თეატრთან, საკანალიზაციო ქსელის სისტემა, გამწმენდი ნაგებობა, პარკი
- კლასტერი 4: #20, #21, #22, #23-24, #25, #26, #29, #30;
- კლასტერი #5: #31, #32, #33, #34, #35-36, #37, #40, #41
- კლასტერი #6: #44-42
- კლასტერი #7: #47, #48, #49.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

საპროექტო სამუშაოები	ღონისძიებების პროგრესი (%)
ადგილობრივი ადმინისტრაციის ოფისი	21
თეატრი	20.5
წყალგამწმენდი ნაგებობა	38
ავტობუსის სადგური	20
სარეკრეაციო პარკი	22
შენობა # 20	15
შენობა # 21	15
შენობა # 22	80
შენობები # 23- 24	41
შენობა # 29	97
შენობა # 30	21
შენობა # 34	22
შენობა # 35-36	15
შენობა # 37	37
შენობა # 44	25
შენობა # 47	39
შენობა # 48	25
შენობა # 49	10

სურათი 66. ანგარიშგების პერიოდში მიმდინარე სამუშაოების და მოქმედი სამუშაო ტერიტორიის არსებული მდგომარეობა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ადმინისტრაციული შენობა

	
ლიობების მოწყობა ადმინისტრაციულ შენობაზე, საპროექტო ნიშნულის შესაბამისად	ლიობების მოწყობა საპროექტო ნიშნულზე

ველისციხის ცენტრალური პარკი

	
ღერძის მოწყობის სამუშაოები	სტადიონის საძირკვლის გამაგრების მოწყობა

ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

	
საძირკვლის მოწყობა და 2 ტიპის ბილიკის გამაგრება	2 ტიპის ბილიკის დაბეტონება

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

თეატრი

	
სკამების ჩარჩოს მოწყობა თოჯინების თეატრში	მეორე სართულზე, ღიობების შევსება ფანჯრების ზემოთ - პენოპლასტის ფილებით

შენობა #22

	
ძველი შენობის სახურავის დემონტაჟი	ახალი სან. კვანძის მოწყობა

შენობები - #23-24

	
---	--

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ხის აივნის მოწყობა	ხის აივნის მოწყობა
--------------------	--------------------

შენობა - #26

	
აივნის ფილები მოეწყო სახლზე, ფასადის მხრიდან.	სამუშაოები შეჩერებულია. მაცხოვრებელი უარს ამბობს უსაფრთხო ადგილზე გადასვლაზე.

შენობა - #29


დასავლეთ ფასადის სახურავის შეფუთვა თუნუქის ფურცლებით

შენობა - #30

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
სახურავის კონსტრუქციული მოწყობა	სახურავის კონსტრუქციული მოწყობა

შენობა - #47


შენობის ფასადის მოპირკეთება აგურებით

შენობა - #48

	
სარტყელის მოწყობა შენობის დასავლეთ ნაწილში	აგურების ამოყვანა შენობის ფასადზე.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ავტოთვითმცლელი – 7
- სამსხვერველა - 9
- ბურღი -12
- მბრუნავი ჩაქუჩი - 11
- ელექტრო გენერატორი -12
- ექსკავატორი - 1
- კომპაქტორი - 1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

191. ობიექტზე დასაქმებულია 100 ადამიანი.

2.3.26. ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა ზუგდიდში

192. მოცემული ანგარიშგების პერიოდში, ოქტომბრის თვეში, „ეპტისამ: დაიწყო ზედამხედველობითი სამუშაოები ზუგდიდის ბიბლიოთეკაში.

ცხრილი 3. მიმდინარე აქტივობების პროგრესი

ფაქტობრივი დაწყება	ფაქტობრივი დასრულება	%	აქტივობა
-	-	100 %	საწყისი სამუშაოები, მიწის სამუშაოები, ვერტიკალური დაგეგმვა
7.11.22	12.11.22	100 %	ორმოს ამოთხრა
07.11.22	12.11.22	100 %	ბეტონის ფილის ბალასტის მასალიანი ბალიშების მომზადება
21.11.22	26.11.22	100 %	ფილის დაარმატურება (სახელოსნოში მუშაობა)
		0 %	საყრდენი კედლების და ტიხრების მოწყობა
13.02.23	18.02.23	100 %	300 მმ სისქის (Mk-1) მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა
19.12.22	24.12.22	30 %	300 მმ სისქის (Mk-2) მონოლითური რკინა-ბეტონის კედლის მოწყობა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

13.03.23	18.03.23	100 %	მონოლითური რკინა-ბეტონის სვეტი 1(17); 2(3); 3(1); SV-4 (1); 5(2).
-	-	0 %	სახურავის მოწყობა
-	-	0 %	კარების, ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა
-	-	0 %	ბოილერის სამშენებლო სამუშაოები
-	-	0 %	ელექტრო სამუშაოები
-	-	0 %	იატაკების მოწყობა
07.11.22	12.11.22	80 %	შემოღობვა
13.02.23	18.02.23	100 %	მონოლითური რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილა - 0.15 მარკის
23.01.23	28.01.23	100 %	დრენაჟის მოწყობა საძირკვლის გარშემო
23.01.23	28.01.23	62 %	კედლების თერმო-იზოლაცია
13.03.23	18.03.23	100 %	რკინა-ბეტონის კიბე #2
13.03.23	18.03.23	100 %	მონოლითური რკინა-ბეტონის რიგელი Mr-1

აღჭურვილობა ობიექტზე

- ექსკავატორი - 1
- ავტოთვიტმცლელი -1
- კომპაქტორი -1
- ამწე -1
- ბურღი -3
- შედუღების აპარატი -1

სამუშაო ძალა ობიექტზე

დასაქმებულთა მაქსიმალური რაოდენობა: კვალიფიციური -10 და არაკვალიფიციური 90.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სურათი 67. ანგარიშგების პერიოდში მიმდინარე სამუშაოების და მოქმედი სამუშაო ტერიტორიის არსებული მდგომარეობა



2.4. პროექტის გეგმის ცვლილებების აღწერა

193. ანგარიშგების პერიოდში, ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და ველისციხის ურბანული განახლების ტექნიკური პროექტების ცვლილება ან მოდიფიკაცია არ განხორციელებულა.
194. მას შემდეგ, რაც საბავშვო ბაღების მშენებლობისთვის შემუშავებული საწყისი გარემოსდაცვითი გამოკვლევები (IEE) მომზადდა საბავშვო ბაღების შაბლონის დიზაინის საფუძველზე, IEE განახლებულია/გადახედილია დეტალური საინჟინრო დიზაინის (DED) შესაბამისად და გამოქვეყნებულია MDF-ის ვებგვერდზე. გარდა ამისა, IEE-ების განახლებასთან ერთად, CC-ის SSEMP და მისი ქვეგეგმები შესაბამისად გადაიხედება.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

3. გარემოს დაცვის ღონისძიებები

3.1. გარემოს დაცვის უსაფრთხოების ღონისძიებების ზოგადი აღწერა

195. ობიექტის ზედამხედველობა და ინსპექციები, ისევე, როგორც სამშენებლო საქმიანობის შესაბამისობის მონიტორინგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომლებითაც EMP/SSEMP მოთხოვნების დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფთ. სამშენებლო და საზედამხედველო კომპანიების გარემო დაცვის გუნდები რეგულარულად ატარებენ პროექტის შესრულების მუდმივი ზედამხედველობისა და მონიტორინგს.
196. ანგარიშგების პერიოდში, მშენებლობის ზედამხედველი კომპანიის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტები (“Eptisa Servicios de Ingenieria S. L”) რეგულარულად სტუმრობდნენ პროექტის ობიექტებს საქართველოს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ ნაწილში, გარემოსდაცვითი/ჯანმრთელობის/უსაფრთხოების პირობების მონიტორინგისა და შემარბილებელი ზომების განხორციელების მიზნით. ყოველი ვიზიტის დროს გარემოსდაცვითი სპეციალისტი ამზადებს გარემოსდაცვითი შეუსაბამობის ანგარიშს (საჭიროების შემთხვევაში) და ითხოვს შესაბამის მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმებს სამშენებლო კომპანიებისაგან. გარემოსდაცვითი სპეციალისტები რეგულარულად სტუმრობენ პროექტის ადგილებს.
197. ზედამხედველი კონსულტანტი კონტრაქტორისთან ერთად მუშაობს კოორდინირებულად, მაგალითად, ანგარიშგების პერიოდში ზედამხედველმა და კონტრაქტორმა მიიღეს გადაწყვეტილებები, როგორ გაამრავლონ და მოუარონ პალმის ხეებს, რომლებიც არის თეატრის ადმინისტრაციული შენობიდან. აღნიშნულ პროცესს კოორდინაციას უწევდა ზედამხედველი კონსულტანტი 2023 წ. იანვარ-ივნისის პერიოდში. პალმის ხეები შენარჩუნებულია დაზიანების გარეშე.
198. „Eptisa Servicios de Ingenieria S.L“-ის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტები მონიტორინგის მიზნით თვეში რამდენჯერმე სტუმრობენ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს პროექტების ობიექტებს.
199. ვიზიტისა და მონიტორინგის მიზანია მშენებლობაზე ზედამხედველობა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ყველა არსებული კრიტიკული თუ არაკრიტიკული დარღვევების იდენტიფიცირება და მათ აღმოფხვრაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. ასევე, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კუთხით საქართველოს კანონმდებლობით მოთხოვნილი ყველა საჭირო დოკუმენტაციის შემოწმება და განხილვა და პერსონალისთვის ტრენინგებისა და ხელსაწყოების ტარების შემოწმება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში.
200. „ეპტისას“ ზედამხედველობის კონსულტანტების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის ინსპექტირება ჩატარდა სამუშაო აქტივობის დროს უსაფრთხოების ზომების მდგომარეობის მონიტორინგის, კარგი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ცუდი დაკვირვებების, შეუსაბამობების, გაცდენების, დოკუმენტების შესამოწმებლად და რეკომენდაციების მიცემის მიზნით, პროექტის, უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების შესასრულებლად;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

201. დეტალური ინფორმაცია ვიზიტებისა და აღმოჩენების შედეგების, შემარბილებელი საკითხების შესახებ წარმოდგენილია შემდეგ თავებში.

3.2. ობიექტის ინსპექცია / აუდიტი

202. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას სამშენებლო კომპანიის გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტები აწარმოებდნენ სამშენებლო უბნების რეგულარულ შემოწმებასა და მონიტორინგს. აღნიშნული შემოწმებების მიზანია ობიექტის შესაბამისობის უზრუნველყოფა არსებულ სტანდარტებთან, რეგულაციებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან.

203. მშენებელი კონტრაქტორების, ზედამხედველი კომპანიების გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტები ახორციელებენ საიტების რეგულარულ ინსპექტირებას და მონიტორინგს, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების პროცესში.

204. ზედამხედველი კონსულტანტები ახორციელებენ ობიექტების ყოველდღიურ და ყოველკვირეულ ვიზიტებს, არსებული მდგომარეობის ასახვის მიზნით. ვიზიტების საფუძველზე ხდება კონტრაქტორის მიერ ყოველდღიური ანგარიშების შემუშავება მიმდინარე გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ და გაიცემა ყოველკვირეული ანგარიშები, რომელიც აჯამებს ადგილზე არსებულ ვითარებას. ყველა ეს ანგარიში ერთიანდება და მზადდება ყოველთვიური ანგარიშები, რომლებიც იგზავნება მგფ-ში. ზემოაღნიშნულის გარდა, ზედამხედველობის კონსულტანტი ასევე გასცემს ინსტრუქციის ანგარიშებს და აკვირდება მათ შესრულებას ხელშეკრულების გათვალისწინებით. ნებისმიერი შეუსაბამოების შემთხვევაში, შეუსაბამობის ანგარიშები გაიცემა მშენებლობის ზედამხედველი კონტრაქტორის მიერ.

205. მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტი კომპანია ამზადებს ყოველთვიური პროგრესის ანგარიშებს (საკონტროლო სიების მეშვეობით), სადაც შესულია კონკრეტული ობიექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა და მისი ქვეგეგმების შესრულება, მისგან გადახრები და ჩამოთვლილი ყველა HSE ინციდენტები და შემთხვევები, რომლებიც განხორციელების დროს მოხდა; აბარებს პერიოდულ ანგარიშებს მონიტორინგის მონაცემების და ლაბორატორიული ანალიზის საფუძველზე.

206. გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც სამშენებლო საქმიანობის დროს წარმოიქმნება, დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს განმახორციელებელი სააგენტოს გუნდს; ძალისხმევის კოორდინირებისა და გავლენების დაუყოვნებლივი შერბილებისთვის დაიცვან გარემო და ადგილობრივი თემების ჯანმრთელობა.

207. სამშენებლო კომპანიის გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის (EHS) პერსონალი უზრუნველყოფდნენ უსაფრთხოების დოკუმენტების ეფექტურად შესრულებას და მიიღეს ყველა საჭირო გარემოსდაცვითი ნებართვა (რაც საჭიროა ანგარიშების პერიოდში) პროექტების განსახორციელებლად, ასევე, კოორდინირებული იყო გარემოსდაცვითი და ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მშენებლობის ზედამხედველ კომპანიასა და აღმასრულებელ სააგენტოს შორის, განხორციელდა მონიტორინგის პროგრამების იმპლემენტაცია და ზედამხედველობა, როგორც ამას მოითხოვს საწყისი გარემოსდაცვითი გამოკვლევა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

3.3. საკითხებზე თვალყურის დევნა (შეუსაბამობის შეტყობინებების საფუძველზე)

208. ანგარიშების პერიოდში გამოვლინდა ზოგადი შეუსაბამობები:

- i. სამშენებლო მოედანი ყველა მხრიდან არ არის შემოღობილი;
- ii. სამშენებლო ნარჩენები მთლიანად არ არის გატანილი;
- iii. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არის სათანადოდ დასაწყობებული;
- iv. სამშენებლო მოედანი არ არის სათანადოდ მოწყობილი;
- v. მშენებლობის ადგილზე არ მოიპოვება დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები;
- vi. სამშენებლო ობიექტზე ხეები დაუცველია;
- vii. არ დგას სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი.

საბავშვო ბაღები და სპორტული კომპლექსები

209. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ანგარიშების პერიოდში მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი აღმოჩენები და შეუსაბამობები.

ცხრილი 4. ანგარიშების პერიოდში მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი აღმოჩენები და შეუსაბამობები

N	პროექტი	მნიშვნელოვანი აღმოჩენები (შეუსაბამობები)
1.	ქუთაისის საცურაო აუზი	- გარემოსდაცვითი დოკუმენტაცია სამშენებლო ტერიტორიაზე არ არის; - სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი. ობიექტი შიგნიდან უკეთესად უნდა მოეწყოს; უნდა მოხდეს მასალების რეგულარული განცალკევება/დასაწყობება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებისგან; - სამშენებლო ტერიტორია დაბინძურებულია სხვადასხვა სახის ნარჩენებით: სახიფათო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით; - უნდა მოხდეს ქვიშის გადახურვით უზრუნველყოფა, მტვრით დაბინძურების პრვენციისთვის; - კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ფოტო მასალა, შეუსაბამობების აღმოფხვრის დადასტურების მიზნით; - აუცილებელია სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის დროებითი ტერიტორიის მოწყობა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

2.	ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი	პროექტი შეჩერებულია
3.	ახალციხის სპორტული კომპლექსი	• სამშენებლო ობიექტი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის რეცხვის ფაქტი; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები); • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშე დასაწყობებული; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული.
4.	რუსთავის სპორტული კომპლექსი	• ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშე წარმოდგენილი; • ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის გამორეცხვის ფაქტი; • სამშენებლო ობიექტზე აღინიშნება საწვავის და საპოხი მასალების დაღვრის ადგილები; • სამშენებლო ობიექტი არ არის შემოღობილი ყველა მხრიდან; • საყოფაცხოვრები ნარჩენების კონტეინერი შესაბამისი წარწერის გარეშე და სახიფათო ნარჩენების ახლოს არის განთავსებული; შერეული ნარჩენები კონტეინერშია განთავსებული; • სახიფათო ნარჩენები არ არის გატანილი შესაბამისად (ადგილზე არ არის აუცილებელი დოკუმენტაცია); • რეციკლირებადი ნარჩენების კონტეინერი (ობიექტზე) არ არის; • სამშენებლო ობიექტი სათანადოდ მოწყობილი არ არის; • სამშენებლო მასალები და შერეული ნარჩენები სამშენებლო ობიექტის საზღვრებს გარეთ არის განთავსებული და კომპანიას არ აქვს დროებითი უფლება, რომ გამოიყენოს აღნიშნული ტერიტორია; • ბენზინი/დიზელი არ არის სათანადოდ განთავსებული; • ჯართი არ არის სათანადოდ განთავსებული; • სახიფათო ნარჩენების განთავსების ადგილი არ არის საკმარისი გენერირებული სახიფათო ნარჩენებისთვის; • ნარჩენების კონტეინერები რეციკლირებადი ნარჩენებისთვის, ობიექტზე არ არის.
5.	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	• სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია სათანადოდ უნდა მოეწყოს; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი მოწყობილი არ არის. სანიტარული მდგომარეობა მძიმეა.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• სამშენებლო ტერიტორიაზე არსებული ხეები არ არის შემოსაზღვრული; • ჯართი არ არის სათანადოდ განთავსებული; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები); • გარემოს დაცვის მენეჯერმა სამშენებლო ობიექტი რეგულარულად უნდა მონახულოს; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
6.	ფოთის საბავშვო ბაღი	• წარმოსადგენია ინფორმაცია ნარჩენების გატანის შესახებ; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • აუცილებელია სახიფათო ნარჩენების სათანადოდ განთავსება; • აუცილებელია წყლის ტუმბოების შესაბამისად განთავსება; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები).
7.	სუფსის საბავშვო ბაღი	• სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • დაბალი ხარისხის ადმინისტრაციული მოწყობა; ნარჩენების არასათანადო მართვა; • სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ქვიშა/ხრეში არ არის გადახურული; • სამშენებლო ობიექტზე ბიოტუალეტი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
8.	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	• დაბალი ხარისხის ადმინისტრაციული მოწყობა; ნარჩენების არასათანადო მართვა; • სამშენებლო ტერიტორიაზე აკრძალულია ცეცხლის დანთება; • სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • სამშენებლო ობიექტზე ბიოტუალეტი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
9.	სენაკის საბავშვო ბაღი	• სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • აუცილებელია წყლის ტუმბოების სათანადოდ განთავსება; • დაბალი ხარისხის ადმინისტრაციული მოწყობა;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• აუცილებელია სახიფათო ნარჩენების შესაბამისად განთავსება; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები).
10.	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	• ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის გარეცხვის ფაქტი; • სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი არ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. კონტეინერში განთავსებულია შერეული ნარჩენები; • სამშენებლო ობიექტი არ არის მოწყობილი სათანადოდ; • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები.
11.	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	• ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • სამშენებლო ობიექტზე ბიოტუალეტი არ არის; • სამშენებლო ობიექტი ყველა მხრიდან შემოღობილი არ არის; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები.
12.	ბანძის საბავშვო ბაღი	• სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის; • ბეტონის გასარეცხი ადგილი ტერიტორიაზე გამოყოფილი არ არის; • წარმოსადგენია ინფორმაცია ნარჩენების გატანის შესახებ; • ხეები სამშენებლო ტერიტორიაზე შემოღობილი არ არის; • შესაბამისი კონტეინერები სამშენებლო ტერიტორიაზე წარმოდგენილი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები); • გარემოს დაცვის მენეჯერმა რეგულარულად უნდა მოინახულოს ობიექტი; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
13.	დიდიჭყონის საბავშვო ბაღი	• აუცილებელია სახიფათო ნარჩენების შესაბამისად განთავსება; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• ბეტონის გასარეცხი ადგილი ტერიტორიაზე გამოყოფილი არ არის; • ხეები სამშენებლო ტერიტორიაზე შემოღობილი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები); • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი ღოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
14.	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	• ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა; • ხეები სამშენებლო ტერიტორიაზე შემოღობილი არ არის; • სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი არ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. შერეული ნარჩენები სახიფათო (ნარჩენების) კონტეინერშია განთავსებული. • ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არის სათანადოდ დასაწყობებული. • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი. • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბეტონის გასარეცხი ორმო მოწყობილი არ არის. • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები.
15.	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	• ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა; • ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის გარეცხვის ფაქტი; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის; • სამშენებლო ტერიტორიაზე აკრძალულია ცეცხლის დანთება; • სამშენებლო ობიექტი არ არის შემოღობილი ყველა მხრიდან; • სამშენებლო ტერიტორიაზე აღინიშნება საწვავის და საპოხი მასალების დაღვრის ადგილები; • რეციკლირებადი ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერები ობიექტზე არ არის; • სამშენებლო ობიექტი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • სამშენებლო ტერიტორიაზე სახიფათო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერი არ არის; • სამშენებლო ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები).
16.	ჭითაწყარის საბავშვო ბაღი	• ხეები სამშენებლო ტერიტორიაზე არ არის შემოღობილი; ხეები დაზიანებულია; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• ნიადაგის ზედა და ქვედა ფენები შერეულია და არ არის დასაწყობებული სათანადოდ; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბეტონის გარეცხვის ადგილი მოწყობილი არ არის; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის. სანიტარული მდგომარეობა მძიმეა; • სამშენებლო ტერიტორიაზე შესაბამისი კონტეინერები არ არის; • გარემოს დაცვის მენეჯერმა რეგულარულად უნდა მოინახულოს ობიექტი; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
17.	რუხის საბავშვო ბაღი	• უნდა მოხდეს სახიფათო ნარჩენების შესაბამისად დასაწყობება; • სამშენებლო ტერიტორია საერთოდ არ არის მოწყობილი; • ტერიტორია საშინლად დაბინძურებულია შერეული ნარჩენებით (საყოფაცხოვრებო, სამშენებლო და სახიფათო ნარჩენები); • ქვიშა/ხრეში გადახურვის გარეშეა; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ განთავსებული; • სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია ობიექტზე გამოყოფილი არ არის; • ობიექტზე უნდა იმყოფებოდეს გარემოს დაცვის მენეჯერი; • სამშენებლო ობიექტზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
18.	დარჩელის საბავშვო ბაღი	• სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის. სანიტარული მდგომარეობა მძიმეა; • ნიადაგის ზედა და ქვედა ფენები შერეულია და არ არის დასაწყობებული სათანადოდ; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები).
19.	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	• საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერი სახიფათო ნარჩენების კონტეინერთან ახლოს არის განთავსებული; • არსებული სამშენებლო მექანიზმის განთავსება - არასათანადო; • სამშენებლო ტერიტორია არ არის შესაბამისად მოწყობილი.
20.	შამგონას საბავშვო ბაღი	• სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი - ადმინისტრაციული თვალსაზრისით; • წარმოსადგენია ინფორმაცია ნარჩენების გადაცემის შესახებ; • სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ადგილები სამშენებლო ტერიტორიაზე გამოყოფილი არ არის;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• სამშენებლო ტერიტორია არ არის სათანადოდ მოწყობილი - ადმინისტრაციული თვალსაზრისით; • სამშენებლო ტერიტორიაზე შესაბამისი გარემოსდაცვითი დოკუმენტები წარმოდგენილი არ არის.
21.	კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	• ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის გარეცხვის ფაქტი; • ხეები სამშენებლო ტერიტორიაზე შემოღობილი არ არის; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • ჯართი არ არის სათანადოდ განთავსებული; • შედუღების ღეროები არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • არსებული სამშენებლო მექანიზმი არ არის განთავსებული სათანადოდ; • სამშენებლო მოედანი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • რეციკლირებადი ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერები (ობიექტზე) არ არის.
22.	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	• სახიფათო ნარჩენების განთავსების დროებითი ადგილი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ქვიშა-ხრეში არ არის გადახურული; • ხის ნარჩენები არ არის სათანადოდ დასაწყობებული; • შესაძლოა დაზიანდეს სამშენებლო მოედნის გარეთ არსებული ხე; • სამშენებლო მოედანი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები.
23.	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	• სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის; • ქვიშა-ხრეში არ არის გადახურული; • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერი არ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. შერეული ნარჩენები განთავსებულია კონტეინერში; • ადმინისტრაციული მოწყობა - დაბალი ხარისხის; • სამშენებლო ტერიტორიაზე სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი არ არის; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები). • კომპანიას წარმოსადგენი აქვს შეთანხმებები; • სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის; • ქვიშა-ხრეში გადახურვის გარეშეა; • სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი არ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ. შერეული ნარჩენები განთავსებულია კონტეინერში.
24.	აგარის საბავშვო ბაღი	• სამშენებლო ტერიტორიაზე ბიოტუალეტი არ არის; • ხის ნარჩენები სათანადოდ განთავსებული არ არის;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• ობიექტზე აღინიშნება ბეტონის გარეცხვის ფაქტი; • ადმინისტრაციული მოწყობა - დაბალი ხარისხის; სამშენებლო მოედანი არ არის სათანადოდ მოწყობილი; • ჯართი არ არის სათანადოდ განთავსებული; • არსებული მექანიზმი არ დგას სათანადოდ; • საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი კონტეინერი არ არის სათანადო; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის სახიფათო ნარჩენების კონტეინერი; • სამშენებლო ობიექტზე არ არის დაღვრილი საწვავისა და საპოხის აღმოსაფხვრელი საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, სპეციალური კონტეინერები).
--	--	---

210. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ანგარიშების პერიოდში საკითხების მონიტორინგის აქტივობების შეჯამება.

ცხრილი 5. მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება

	პროექტი	პროექტისთვის საკითხების საერთო რაოდენობა	მოგვარებული საკითხების რაოდენობა	მოგვარებული საკითხების პროცენტული რაოდენობა
1.	ქუთაისის საცურაო აუზი	6	6	100%
2.	ზუგდიდის სპორტული კომპლექსი	-	-	-
3.	ახალციხის სპორტული კომპლექსი	6	4	66%
4.	რუსთავის სპორტული კომპლექსი	14	7	50%
5.	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	9	4	44%
6.	ფოთის საბავშვო ბაღი	6	3	50%
7.	სუფსის საბავშვო ბაღი	6	6	100%

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

8.	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	5	5	100%
9.	სენაკის საბავშვო ბაღი	5	2	40%
10.	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	4	2	50%
11.	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	6	3	50%
12.	ბანძის საბავშვო ბაღი	11	5	45%
13.	დიდიჭყონის საბავშვო ბაღი	8	4	50%
14.	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	7	3	42%
15.	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	12	4	33%
16.	ჭითაწყარის საბავშვო ბაღი	10	5	50%
17.	რუხის საბავშვო ბაღი	8	5	62%
18.	დარჩელის საბავშვო ბაღი	3	2	66%
19.	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	3	3	100%
20.	შამგონას საბავშვო ბაღი	5	3	60%
21.	კურდელაურის საბავშვო ბაღი	8	5	62.5%
22.	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	6	3	50%
23.	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	10	5	50%
24.	აგარის საბავშვო ბაღი	9	4	44%

ველისციხის ურბანული განახლება

211. ველისციხის ურბანული განახლების პროექტზე, სამშენებლო კომპანიას, მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტს და განმახორციელებელ სააგენტოს აქვთ მჭიდრო კოორდინაცია. ეს ასახულია მშენებლობის ზედამხედველი კონსულტანტის ინსტრუქციის ანგარიშგებაში. ინსტრუქციის ანგარიშგებას დროულად პასუხობს „ჯავა-ინსის“ ერთობლივი საწარმო.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

212. ანგარიშების პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო თვითნაკეთი ტუალეტების შეცვლა ბიოტუალეტებით, რომლებსაც რეგულარულად ასუფთავებს მესამე მხარე. შესაბამისად, წინა ანგარიშების პერიოდთან შედარებით, 2023 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში, გაუმჯობესდა კოორდინაცია და თანამშრომლობა მშენებლობის ზედამხედველ კომპანიასა და კონტრაქტორს შორის და მხარეებს შორის არსებული ყველა საკითხი მოგვარდა.

ცხრილი 6. მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება

პროექტისთვის საკითხების საერთო რაოდენობა	
მოსაგვარებელი საკითხების რაოდენობა	0
მოგვარებული საკითხების რაოდენობა	3
მოგვარებული საკითხების პროცენტული რაოდენობა	80%
მოსაგვარებელი საკითხები აღნიშნული ანგარიშების პერიოდში	0
მოგვარებული საკითხები აღნიშნული ანგარიშების პერიოდში	3

საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა ზუგდიდში

213. ზუგდიდის ბიბლიოთეკის პროექტზე სამუშაოები ოქტომბერში დაიწყო და მხარეებს ძალიან მჭიდრო კოორდინაცია აქვთ პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (SSEMP) შემუშავებისას. წინა თვესთან შედარებით, გარემოსდაცვითი მართვის საკითხები გაუმჯობესებულია, თუმცა კონტრაქტორთან კომუნიკაციის პრობლემა კვლავ აქტუალურია. 2023 წ. ივნისში, მათ წარმოადგინეს ანა კვარაცხელია (გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების სპეციალისტი), გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯერის პოზიციაზე. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული გამოასწორებს არსებულ მდგომარეობას და კონტრაქტორის რეაგირება ყოველთვიურ ანგარიშებსა და ინსტრუქციებზე იქნება დროული და არსებითი ხასიათის. მშენებლობის ზედამხედველი კონტრაქტორი თავის მხრივ, დამოუკიდებლად ახორციელებს სამშენებლო ტერიტორიის ყოველკვირეულ მონიტორინგს და აწარმოებს შესაბამის ანგარიშგებას.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ცხრილი 7: მიმდინარე პერიოდისთვის საკითხების მონიტორინგის აქტივობის შეჯამება

პროექტისთვის საკითხების საერთო რაოდენობა	
მოსაგვარებელი საკითხების რაოდენობა	2
მოგვარებული საკითხების რაოდენობა	0
მოგვარებული საკითხების პროცენტული რაოდენობა	20%
მოსაგვარებელი საკითხები აღნიშნული ანგარიშგების პერიოდში	2
მოგვარებული საკითხები აღნიშნული ანგარიშგების პერიოდში	0

3.4. გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება გარემოზე ან რისკები

214. არსებული მდგომარეობით, ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და ველისციხის ურბანული განახლების პროექტების ტექნიკურ პროექტებში რაიმე სახის ცვლილება ან მოდიფიკაცია არ განხორციელებულა. პროექტის შემუშავების პროცესში წარმოებული შეფასების და კომპლექსური მონიტორინგის შედეგად, გაუთვალისწინებელი ზემოქმედება არ გამოვლენილა, რაც ადასტურებს ზემოქმედების შერბილების პოტენციური რისკების დაგეგმვის და აღსრულების ეფექტიანობას და უზრუნველყოფს პროექტის დაუბრკოლებელი განხორციელების პროცესს. თუმცა, მონიტორინგის გაგრძელება აუცილებელია, პროექტის მიმდინარეობის დროს წარმოქმნილი შესაძლო გამოწვევების დაუყოვნებლად აღმოფხვრისათვის.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

4 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის შედეგები

4.1 მიმდინარე პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის მიმოხილვა

სპორტული კომპლექსები და საბავშვო ბაღები

215. მუნიციპალური განვითარების ფონდი სამშენებლო კომპანიებისგან მოითხოვს, რომ მათ სამშენებლო საქმიანობა გარემოს დაცვის მართვის გეგმის შესაბამისად შეასრულონ, რომლის მიხედვითაც შემუშავდა SSEMP.
216. EMP/SSEMP მოთხოვნების საფუძველზე, პროექტების მონიტორინგის ზომებში შედის სამშენებლო ადგილის ზედამხედველობა, ნებართვების გადამოწმება, კონტრაქტორების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი და გარემოზე ზემოქმედების სპეციფიკური მონიტორინგი, როგორიცაა ხმაური, მტვერი, ნიადაგის დაბინძურება, ლანდშაფტის სტრუქტურა, სამშენებლო ნარჩენები, ფლორა და ფაუნა, წყლის დაბინძურება, ჰაერის ემისიები და ა.შ, რასაც ახორციელებს კონტრაქტორის გარემოს დაცვის სპეციალისტი.
217. ანგარიშების პერიოდში ჩატარდა შემდეგი გარემოსდაცვითი გაზომვები:
- ვიბრაციის მონიტორინგის ტესტი;
 - ხმაურის მონიტორინგის ტესტი
 - ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ტესტი;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

გარემოსდაცვითი ხარისხობრივი მაჩასიათებლების გაზომვები							
N	მდებარეობა/პროექტი	თარიღი	მდებარეობა	ხმაური დბ	ვიბრაცია მმ/წმ	მტვერი	
						PM2.5 (µg/m3)	PM10 (µg/m3)
1	ქუთაისის საცურო აუზი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	41.1	<0.1	22	27
			N2 მდებარეობა	43.1	<0.1	24	31
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	53.8	<0.1	19	26
			N2 მდებარეობა	58.9	<0.1	23	29
		24.04.2023	N1 მდებარეობა	56.1	<0.1	26	33
			N2 მდებარეობა	59.4	<0.1	38	39
2	ზუგდიდის სპორტკომპლექსი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	54.9	<0.1	22	26
			N2 მდებარეობა	49.4	<0.1	22	26
		-	-	-	-	-	-
3	ახალციხის სპორტკომპლექსი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	49.7	<0.1	28	24
			N2 მდებარეობა	51.1	<0.1	42	44
		03.03.2023	N1 მდებარეობა	47	<0.1	100	-
			N2 მდებარეობა	48	<0.1	150	-
		27.04.2023	N1 მდებარეობა	52	<0.1	12	24
			N2 მდებარეობა	55	<0.1	14	23
		28.05.2023	N1 მდებარეობა	46	<0.1	18	26
			N2 მდებარეობა	50	<0.1	15	22
		06.06.2023	N1 მდებარეობა	46	<0.1	10	27
			N2 მდებარეობა	48	<0.1	18	32
4	რუსთავის სპორტკომპლექსი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	68.7	<0.1	30	28
			N2 მდებარეობა	54.1	<0.1	36	35
		22.03.2023	N1 მდებარეობა	61	<0.1	18	41
			N2 მდებარეობა	57	<0.1	22	43

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		26.04.2023	N1 მდებარეობა	57	<0.1	30	47
			N2 მდებარეობა	62	<0.1	25	39
		26.05.2023	N1 მდებარეობა	58	<0.1	18	12
			N2 მდებარეობა	66	<0.1	25	28
		28.06.2023	N1 მდებარეობა	53	<0.1	32	28
			N2 მდებარეობა	55	<0.1	38	29
5	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	57	<0.1	90	7
			N2 მდებარეობა	57.9	<0.1	12	10
		01.04.2023	N1 მდებარეობა	58.5	0.03	7	13
			N2 მდებარეობა	50.5	0.02	5	20
		29.04.2023	N1 მდებარეობა	58.5	0.13	3	2
			N2 მდებარეობა	54.6	0.13	9	7
		27.05.2023	N1 მდებარეობა	46.4	0.42	17	27
			N2 მდებარეობა	50.4	0.42	12	27
6	ფოთის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	46.8	<0.1	21	21
			N2 მდებარეობა	-	-	-	-
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	57.8	<0.1	62	-
			N2 მდებარეობა	49.7	<0.1	37	-
7	სუფსის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	49.6	0.18	6	20
			N2 მდებარეობა	65	0.17	-	-
		-	-	-	-	-	-
8	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	52.6	0.17	2	4
			N2 მდებარეობა	52.9	0.16	-	-
		-	-	-	-	-	-
9	სენაკის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	47.5	<0.1	21	21
			N2 მდებარეობა	-	-	-	-

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		16.03.2023	N1 მდებარეობა	61.3	<0.1	74	-
			N2 მდებარეობა	48.9	<0.1	41	-
10	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	48.27	0.23	4.25	8.25
			N2 მდებარეობა	52	0.39	7	11.5
		04.04.2023	N1 მდებარეობა	48.2	0.102	7	14
11	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	57.7	0.34	3.5	8.5
			N2 მდებარეობა	39	0.66	2.3	4.5
		04.04.2023	N1 მდებარეობა	43.9	0.095	5	12
12	ბანძას საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	43.5	<0.1	32	32
			N2 მდებარეობა	43.2	<0.1	28	28
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	57.4	<0.1	29	-
			N2 მდებარეობა	49.5	<0.1	23	-
13	დიდი ჭყონის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	46.5	0.18	6	11
			N2 მდებარეობა	51.4	0.19	5	10
		01.04.2023	N1 მდებარეობა	57.7	0.05	3	50
			N2 მდებარეობა	45.7	0.05	4	7
		27.06.2023	N1 მდებარეობა	65.1	1.53	2	2
			N2 მდებარეობა	47.7	1.52	4	3
14	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	41.4	0.24	4.5	6.75
			N2 მდებარეობა	54.3	0.23	9.75	14.5
		04.04.2023	N1 მდებარეობა	47.7	0.110	6	22
15	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	44.7	<0.1	26	26
			N2 მდებარეობა	43.9	<0.1	25	25
		17.03.2023	N1 მდებარეობა	54.3	<0.1	19	-
			N2 მდებარეობა	46.2	<0.1	16	-

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		30.05.2023	N1 მდებარეობა	52.7	<0.1	27	41
			N2 მდებარეობა	47.3	<0.1	26	38
16	ჭითაწყაროს საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	48.2	<0.1	29	29
			N2 მდებარეობა	48	<0.1	27	27
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	54.3	<0.1	24	-
			N2 მდებარეობა	49.0	<0.1	22	-
17	რუხის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	47.1	<0.1	38	38
			N2 მდებარეობა	46.4	<0.1	39	39
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	53.8	<0.1	35	-
			N2 მდებარეობა	48.6	<0.1	36	-
18	დარჩელის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	39.2	<0.1	19	19
			N2 მდებარეობა	-	-	-	-
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	60.1	<0.1	69	-
			N2 მდებარეობა	48.4	<0.1	41	-
19	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	46.2	<0.1	21	21
			N2 მდებარეობა	-	-	-	-
		17.03.2023	N1 მდებარეობა	63.2	<0.1	59	-
			N2 მდებარეობა	47.1	<0.1	32	-
20	შამგონას საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	48.9	<0.1	9	21
			N2 მდებარეობა	44	<0.1	6	17
		16.03.2023	N1 მდებარეობა	59.4	<0.1	71	-
			N2 მდებარეობა	47.7	<0.1	42	-
21	კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდებარეობა	65.3	0.19	10	28
			N2 მდებარეობა	48.3	0.17	-	-
		26.03.2023	N1 მდებარეობა	56.1	<0.1	16	39

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

			N2 მდეზარეობა	45.4	<0.1	16	26
		28.04.2023	N1 მდეზარეობა	57.1	0.06	4	4
			N2 მდეზარეობა	44	0.06	10	7
		30.05.2023	N1 მდეზარეობა	54.8	0.01	10	27
			N2 მდეზარეობა	46.2	0.01	9	27
22	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდეზარეობა	51	0.002	7.5	10.5
			N2 მდეზარეობა	44	0.001	11.6	16.2
		06.04.2023	N1 მდეზარეობა	65	<0.1	98	2
			N2 მდეზარეობა	53	<0.1	11	0.5
		09.06.2023	N1 მდეზარეობა	63	<0.1	88	20
			N2 მდეზარეობა	54	<0.1	18	5
23	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდეზარეობა	47.1	<0.1	21	21
			N2 მდეზარეობა	-	-	-	-
		17.03.2023	N1 მდეზარეობა	61.9	<0.1	67	-
			N2 მდეზარეობა	46.8	<0.1	39	-
		26.04.2023	N1 მდეზარეობა	46.9	<0.1	45	-
			N2 მდეზარეობა	46.5	<0.1	44	-
24	აგარას საბავშვო ბაღი	ამოსავალი	N1 მდეზარეობა	38.2	0.22	11	17
			N2 მდეზარეობა	40.8	0.18	10	15
		09.04.2023	N1 მდეზარეობა	47	0.05	5	2
			N2 მდეზარეობა	45.8	0.05	7	3
		29.06.2023	N1 მდეზარეობა	64	1.5	6	5
			N2 მდეზარეობა	51.4	1.5	9	5

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ველისციხის ურბანული განახლება

218. სამშენებლო კომპანია ვალდებულია სამშენებლო საქმიანობა შეასრულოს საწყისი გარემოსდაცვითი გამოკვლევის, გარემოს შეფასებისა და მიმოხილვის ჩარჩოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რომლის მიხედვითაც შემუშავდა SSEMP და ქვე-გეგმები. ანგარიშების პერიოდის განმავლობაში, CSC-მა CC-თან ერთად განაახლა SSEMP დოკუმენტი და შესაბამისი მენეჯმენტის გეგმები, რათა ისინი უფრო კონკრეტული და ფუნქციონალური გახადონ სამშენებლო სამუშაოების დროს.
219. პროექტის განხორციელების დროს დაფიქსირდა შეუსაბამოებები (რომელიც მოხსენებული იყო CC-ს ინსტრუქციის ანგარიშების (IR) და შესაბამისი მაკორექტირებელი ქმედების ანგარიშების (CAR) მეშვეობით). მხარეებს შორის კომუნიკაცია კარგად არის სტრუქტურირებული და პასუხებიც კარგად არის მიღებული.
220. ანგარიშების პერიოდში ყოველთვიურად ტარდებოდა შემდეგი გარემოსდაცვითი გაზომვები
- ვიზრაციის მონიტორინგის ტესტი;
 - ხმაურის მონიტორინგის ტესტი
 - ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ტესტი.
221. შპს ჯავამ და სამეცნიერო-კვლევითმა ფირმამ „გამამ“ გააფორმეს ხელშეკრულება სოფ. ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებული გარემოს დაცვით გაზომვის შესახებ.

სურათი 62 აზომვითი პუნქტები სოფელ ველისციხეში¹



222. ანგარიშების პერიოდში, საკვლევ არეალში ჩატარებულმა ინსტრუმენტულმა გაზომვებმა აჩვენა, რომ:

¹ წითელი წრეები მიუთითებს აზომვით პუნქტებზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- მნიშვნელოვანი გადახრები არ გამოვლენილა;
- ატმოსფერულ ჰაერში გაზომილი მტვრის (PM2.5, PM10) მაჩვენებლები ოქტომბერში მუსიკალური სკოლის შენობასთან დასაშვებ ზღვრებში არ იყო;
- ექვსივე წერტილში ხმაურის საშუალო ეკვივალენტური დონე, რომელიც მიღებულია 15 წუთიანი უწყვეტი ხმაურის დონის გაზომვისას, აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეს. ეს იმიტომ, რომ აღნიშნული აზომვითი პუნქტები მდებარეობს სოფელ ველისციხის ცენტრში და დატვირთულია როგორც ტრანსპორტით, ასევე ხალხით, ხმაურის დონის მთავარი მიზეზი სწორედ აღნიშნული ფაქტორებია; ექვსივე გამოკვლეულ პუნქტში არ იყო ვიბრაციული რხევები.

223. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ოქტომბრის თვეში არსებული მტვრის ნორმების გადაჭარბების შემდეგ გატარებულმა შემარბილებელმა ზომებმა, როგორიცაა გზების მორწყვა და მოძრაობის ქვედა სიჩქარის ლიმიტების გაზრდა, დადებითი გავლენა იქონია გაზომვაზე მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში.

224. მტვრის მაღალი დონის შესამცირებლად კონტრაქტორმა დაიწყო ტერიტორიის ინტენსიური მორწყვა და მტვრის გავრცელების შემცირება მუსიკის სახლის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, სოფლის ცენტრში, სადაც ხმაური აღემატება დაშვებულ დონეს და ეს მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების გამო არ არის, კონტრაქტორი ამ ტერიტორიაზე გადაადგილებისას ამცირებს სიჩქარეს.

პრეზიდენტის ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა ზუგდიდში

225. საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, ზედამხედველი კონსულტანტი ფოკუსირებული იყო კონტრაქტორის მიერ ჩატარებული ხმაურისა და ვიბრაციის გაზომვების მონიტორინგზე. ივნისის ბოლომდე, ობიექტზე მუდმივად წვიმდა, რამაც შესაბამისად შეარბილა მტვერთან დაკავშირებული პრობლემები. ვიბრაციის მაჩვენებელი ისევ შესაბამისობაშია ამოსავალ პირობებთან, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ტერიტორია გზას წარმოადგენს, სადაც მუდმივად სახეზეა ხმაურიცა და ვიბრაციაც. შესაბამისად, პროექტის ზემოქმედება ხმაურისა და ვიბრაციის კუთხით, პრობლემას არ წარმოადგენს.

226. ივნისის შეხვედრაზე, ზედამხედველმა კონსულტანტმა სიტყვიერად გააფრთხილა კონტრაქტორი ივლის-აგვისტოში განეხორციელებინა ქუჩების მორწყვის პროცედურა, მოსალოდნელი მაღალი ტემპერატურის გათვალისწინებით.

4.2 მატერიალური რესურსების გამოყენება

4.2.1 მიმდინარე პერიოდი

227. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია მონაცემები ელექტროენერგიის, წყლის, გაზისა და საწვავის გამოყენების შესახებ ყველა მიმდინარე პროექტზე მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ცხრილი 8: მატერიალური რესურსების გამოყენება (1 იანვარი – 30 ივნისი)

კონტრაქტორი	პროექტები	ელექტროენერგია (კვტ)	გაზი (მ³)	წყალი (მ³)	საწვავი (ლ)
არალი საბა კონსტრაქშენ	რუსთავის სპორტული კომპლექსი ახალციხის სპორტკომპლექსი	26910	0	1311	9684
	ქუთაისის საცურაო აუზი	2423	0	126	0
სათავე+	ქუთაისის საბავშვო ბაღი კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	46220	6300	4167	13560
ჯორჯიან კონსტრაქშენ გრუპი		3790	0	207	4402
	სუფსის/ხაჯალიის/დიდი ქყონის/აგარის საბავშვო ბაღები	4186	0	238	1926
ბალავარი	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	4800	0	0	450
პროდუს ინვესტმენტ	წინწყაროს საბავშვო ბაღი ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი დარჩელის საბავშვო ბაღი შამგონას საბავშვო ბაღი	515	0	200	0
		9568	0	0	0
		10255	0	0	0
		4569	0	0	0
		9688	0	0	0
ინსტალი	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	1800	0	475	840
	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	2450	0	680	1045
	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	1820	0	535	1130
აბეკა	ჭაბუკიანის/ბანძას/ჭითაწყარის/რუხის საბავშვო ბაღები	1600	0	580	1100
პრაიმ ბეტონი	ფოთის საბავშვო ბაღი	9340	270	194	6000
	სენაკის საბავშვო ბაღი	8046	90	172	21500
შპს ჯავა და ინსი	ველისციხის განახლება	15668	0	0	23816
სს მეთაგ ინშაათ თიჯარეთის ფილიალი საქართველოში	ზუგდიდის ახალგაზრდული ცენტრი	12656	0	0	0

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

4.3. ნარჩენების მართვა

მიმდინარე პერიოდი

სპორტული კომპლექსები და საბავშვო ბაღები

228. უწყვეტი სამუშაოები წარმოქმნიან სხვადასხვა სახის ნარჩენებს: საყოფაცხოვრებო, სახიფათო და სამშენებლო.

229. სამშენებლო კომპანიებმა მოამზადეს ნარჩენების მართვის გეგმები.

230. სამშენებლო კომპანიები სახიფათო ნარჩენებს დროებით საყრდენებზე აგროვებენ და გადასცემენ მათ ლიცენზირებულ ოპერატორებს, რომლებსაც აქვთ სახიფათო ნარჩენებთან მუშაობისთვის გარემოსდაცვითი ნებართვა. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები სპეციალურ კონტეინერებში გროვდება და ხელშეკრულების საფუძველზე ისინი პერიოდულად გააქვს ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურს. სახიფათო ნარჩენების არე დაცულია ბეტონის იატაკითა და გადახურვით.

231. სამშენებლო ნარჩენები გროვდება სამშენებლო მოედანზე არსებულ სპეციალურ იზოლირებულ არეებში და იყოფა სახიფათო, საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებით. სამშენებლო კომპანიებმა ნარჩენების გასატანად კომპანიებთან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ანგარიშგების პერიოდში წარმოქმნილი ნარჩენების სავარაუდო რაოდენობა.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
1.	ქუთაისის საცურაო აუზი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	-	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	-	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	-	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
2.	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	200 კ გ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	43 კ გ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	12 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
3.	ფოთის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	600 კ გ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კ გ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	2000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
4.	სუფსის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	1500 კ გ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	25 კ გ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	3000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
5.	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	1500 კ გ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	25 კ გ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	3000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
6.	სენაკის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	550 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	15 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	2000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შეესების მიზნით
7.	ბანძის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	30 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	320 მ ³	განთავსებულია მუნიციპალურ ტერიტორიაზე
8.	დიდიჭყონის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	1500 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	25 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	3000 მ ³	განთავსდა მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე
9.	შამგონას საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	400 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	300 მ ³	განთავსდა მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე
10.	ჭითაწყარის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	50 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	550 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევისების მიზნით
11.	რუხის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	20 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	100 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევისების მიზნით
12.	დარჩელის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	700 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	20 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	1000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევისების მიზნით
13.	ზუგდიდის სპორტკომპლექსი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	-	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	-	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	-	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევისების მიზნით
14.	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	-	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	-	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	-	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
15.	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	-	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	-	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	-	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
16.	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	70 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	150 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
17.	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	600 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	20 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	1100 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
18.	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	-	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	-	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	-	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შეესების მიზნით
19.	კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	200 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	43 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	12 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შეესების მიზნით
20.	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	300 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	45 მ ³	განთავსებულია მუნიციპალურ ტერიტორიაზე
21.	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	400 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	15 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	50 მ ³	განთავსებულია მუნიციპალურ ტერიტორიაზე
22.	აგარის საბავშვო ბაღი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	1500 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	25 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

N	პროექტი	ნარჩენები	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
		ინერტული ნარჩენები	3000 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
23.	ახალციხის სპორტკომპლექსი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	21250 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	0 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	0 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით
24.	რუსთავის სპორტული კომპლექსი	მუნიციპალური შერეული ნარჩენები	30000 კგ	განთავსდა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში
		სახიფათო ნარჩენები	20 კგ	განთავსდა სათანადოდ მოწყობილ დროებით შესანახ ადგილას
		ინერტული ნარჩენები	0 მ ³	განთავსებულია სამშენებლო ტერიტორიაზე შევსების მიზნით

პრეზიდენტის ბიბლიოთეკის მშენებლობა ზუგდიდში

232. ნარჩენების განკარგვის პრაქტიკა ზუგდიდის პროექტისათვის კარგად არის ორგანიზებული და გაკონტროლებული. კონტრაქტორს გააჩნია ნარჩენების მართვის გამართული გეგმა, რომელსაც ზედმძივნით მისდევს და რომელსაც მჭიდრო მონიტორინგს უწევს ზედამხედველი კონსულტანტი. პროექტის მსვლელობაში წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები სათანადოდ არის განთავსებული მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერებში.

233. მოცემულ ტერიტორიაზე სახეზე არ არის ნარჩენების აკუმულაცია, რაც მიუთითებს მყარი ნარჩენების მართვის ეფექტურ ძალისხმევაზე. გარდა ამისა, კონტრაქტორმა პროექტიური ნაბიჯები გადადგა სახიფათო ნარჩენების დასასაწყობებლად კონკრეტული ტერიტორიის განპიროვნების მიმართულებით და ხელშეკრულებაც გააფორმა სახიფათო ნარჩენების გატანაში სპეციალიზირებულ კომპანიასთან.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღსანიშნავია, რომ წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების მოცულობა ჭარბი არ ყოფილა და შესაბამისად მისი გატანის საჭიროება ხშირად არ წარმოიშვებოდა ხოლმე. ზემოხსენებული იმის დემონსტრირებას ახდენს, რომ კონტრაქტორმა ვალდებულება აიღო მინიმუმამდე დაიყვანოს სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა და ამგვარის არსებობის შემთხვევაში - ეფექტურად მართოს მისი განკარგვის პროცესი.

ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი

234. სამშენებლო სამუშაოები წარმოქმნიან სხვადასხვა სახის ნარჩენებს: საყოფაცხოვრებო, სახიფათო (აზბესტის შემცველი მასალა) და სამშენებლო.
235. სამშენებლო კომპანიებმა მოამზადეს ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაამტკიცა. გეგმა განახლდა პროექტზე გამოყენებული ვარიაციების შესაბამისად, კერძოდ, ადმინისტრაციული შენობის ნაწილობრივი დანგრევა. საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ის ხელახლა იქნა წარმოდგენილი და განახლებული კონტრაქტორი კომპანიის მიერ და დამტკიცდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ.
236. სამშენებლო კომპანიებმა ასევე შეიმუშავა აზბესტის შემცველი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტმა განაახლა. გეგმა და გათვალისწინებული შემარბილებელი ზომები განიხილება დასაქმებულებთან და საზოგადოების ინფორმირებულობის ასამაღლებლად მიეწოდება ადგილობრივ მოსახლეობასაც.
237. სამშენებლო კომპანია სახიფათო ნარჩენებს აგროვებს დროებით საყრდენებზე და გადასცემს მათ ლიცენზირებულ ოპერატორს შპს „ეკო სერვის ჯორჯიას“, რომელსაც სახიფათო ნარჩენებთან მუშაობისთვის გარემოსდაცვითი ნებართვა გააჩნია.
238. სამშენებლო კომპანიებსა და შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას შორის ხელი მოეწერა სამშენებლო და სახიფათო ნარჩენების განკარგვის ხელშეკრულებას.
239. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები სპეციალურ კონტეინერებში გროვდება და ხელშეკრულების საფუძველზე ისინი პერიოდულად გააქვს ადგილობრივ მუნიციპალურ სამსახურს.
240. სამშენებლო ბანაკში სახიფათო ნარჩენების არე დაცულია ბეტონის იატაკითა და გადახურვით.
241. სამშენებლო ნარჩენები გროვდება სამშენებლო მოედანზე არსებულ სპეციალურ იზოლირებულ არეებში და იყოფა სახიფათო, საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენებად.

ცხრილი 9. წარმოქმნილი ნარჩენები ანგარიშგების პერიოდში

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ნარჩენების ტიპი (აღწერილობა და კლასიფიკაცია – მაგ., სახიფათო – არასაფრთხო)	ნარჩენების წყარო – რა საქმიანობამ წარმოქმნა ნარჩენები და სად	წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა	დამუშავების/განთავსების გზა – მიაწოდეთ ინფორმაცია ნარჩენების ხელახლა გამოყენების, გადამუშავებისა და ნაგავსაყრელზე ან დასაწვავად გაგზავნილი რაოდენობის შესახებ	ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილები
მშენებლობა და ნგრევა	ნარჩენები ძირითადად წარმოიქმნება საპროექტო ზონაში ნგრევის პროცესში(თეატრის შენობა, ადმინისტრაციის შენობა, ხელოვნების სკოლა, ცენტრალური პარკის ტერიტორია და საცხოვრებელი სახლები, ასევე სამშენებლო სამუშაოების დროს.	3 208,84 ტ	მთლიანი რაოდენობა გაიგზავნა ნაგავსაყრელზე	თელავის მუნიციპალური ნარჩენების ნაგავსაყრელი
აზბესტის ნარჩენები	სახლების ძველი სახურავების (აზბესტის სახურავების) შეცვლისას წარმოქმნილი ნარჩენები	6,680 ტ	სრულად გაიგზავნა ნაგავსაყრელზე გასატანად	თელავის მუნიციპალური ნარჩენები

242. აზბესტის ნარჩენების წარმოქმნის ალბათობის გამო, დეტალური პროექტირების ფაზაში, საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კოდექსის და IEE-ის საფუძველზე ფორმულირებული იქნა ყოვლისმომცველი აზბესტის განკარგვის გეგმა. აზბესტის განკარგვის მიმართულებით ჩამოყალიბებული მიდგომა მოიცავს:

- აზბესტის მასალის რუტინული ინსპექტირების განხორციელებას;
- დატრეინინგებული პერსონალის გამოყენებას აზბესტის უსაფრთხოდ მოხსნისა და განკარგვისათვის;
- აზბესტის ნარჩენების სხვა სამშენებლო ნაგვისაგან სათანადოდ დაცვას;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- d. აზბესტის ნარჩენების უსაფრთხოდ შეფუთვის ბოჭკოს გამოყოფის თავიდან ასაცილებლად;
- e. უსაფრთხო ტრანსპორტირების პროტოკოლის დაცვას თელავის უახლოეს ნაგავსაყრელზე ნარჩენების გასატანად;
- f. დეტალური ჩანაწერების წარმოებას.

243. ეს ზომები უზრუნველყოფს მარეგულირებელი მოთხოვნების მკაცრ დაცვას და ხაზს უსვამს აზბესტის პასუხისმგებლიანი და ეკოლოგიურად გააზრებული მართვისადმი ერთგულებას, მუშებისა და ადგილობრივი საზოგადოების კეთილდღეობის დასაცავად.

3.8 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

244. ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნახევარწლიური ანგარიშის მიზანია შეაჯამოს ობიექტის მდგომარეობა სამუშაოს დროს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კუთხით და რამდენად ეფექტურად იმართებოდა 2023 წლის ბოლო 6 თვეში (იანვარი - ივნისი) და განზრახვები გეგმებთან დაკავშირებით.

245. ანგარიშის მიზანია წარმოადგინოს მენეჯმენტის ღონისძიებების მიმოხილვა და უზრუნველყოს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომების ადეკვატურობა; ის ადგენს ძირითად საკონტროლო ზომებს და სისტემას, რათა აღწეროს მონაწილეთა მიდგომა რისკის მინიმიზაციისა და შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. იგი განიხილავს ამ პერიოდში განხორციელებულ აქტივობებს და განახლებულია ჩვენი სტრატეგიული მიმართულებების ასახვისთვის

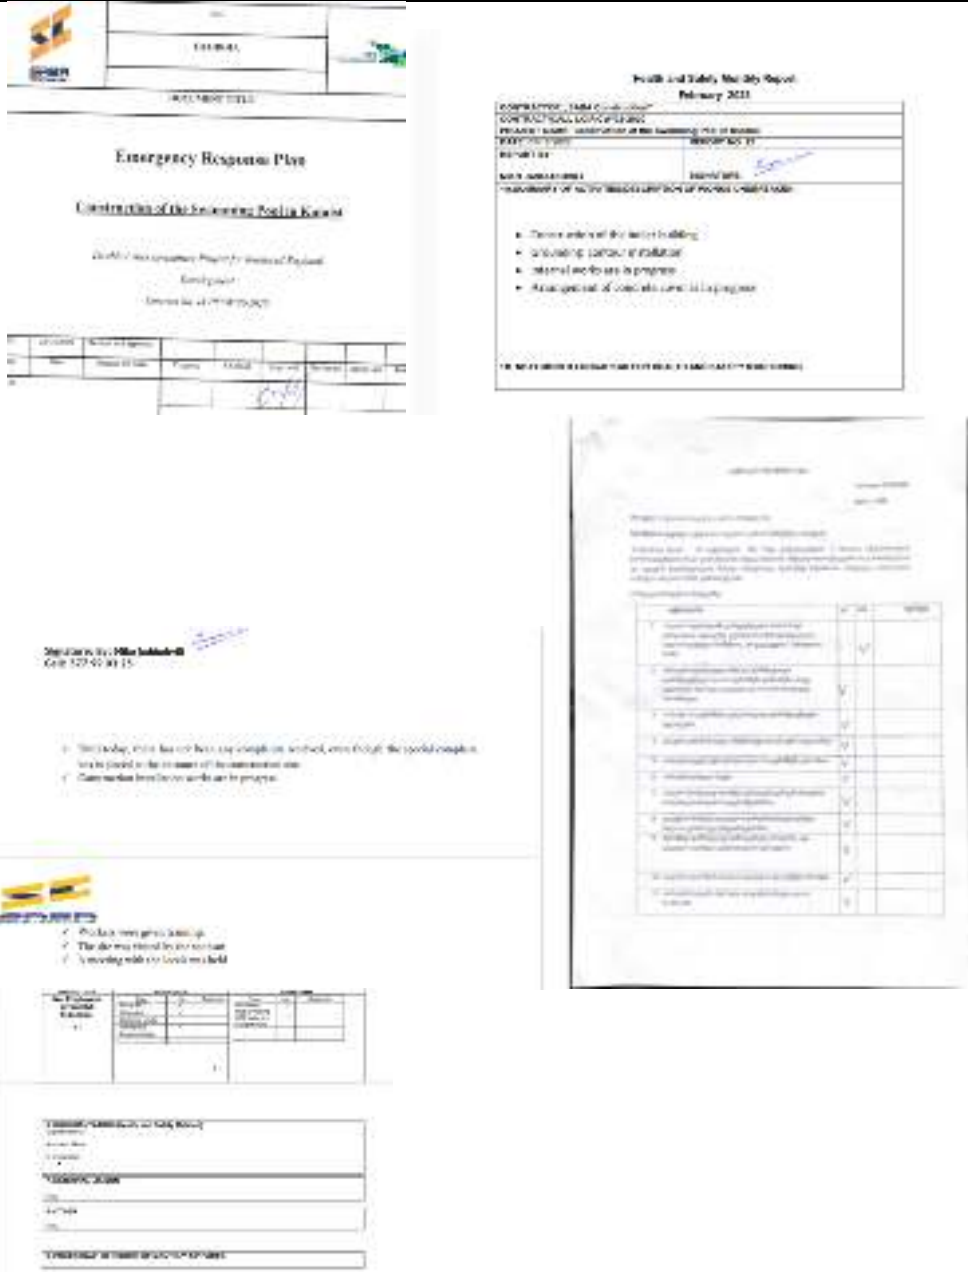
246. ამ პერიოდში, ეპტისას ზედამხედველი კონსულტანტების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ჩაატარა ქვემოთ ჩამოთვლილი უბნების შემოწმება; ადგილზე ვიზიტის მიზანია სამუშაო აქტივობების დროს უსაფრთხოების ზომების სტატუსის მონიტორინგი, კარგი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ცუდი დაკვირვებების, შეუსაბამობების, გადაცდენების აღმოჩენა, დოკუმენტების შემოწმება და რეკომენდაციების გაცემა პროექტის, უსაფრთხოების ნორმებისა და მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების მიზნით. .

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

პროექტი:	ოლიმპიური საცურო აუზის მშენებლობა ქუთაისში
ადგილის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება მოხდა: 23.01.2023; 09.02.2023; 10.03.2023; 25.04.2023; 23.05.2023; 09.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტები, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო და საჭიროებს განახლებას;

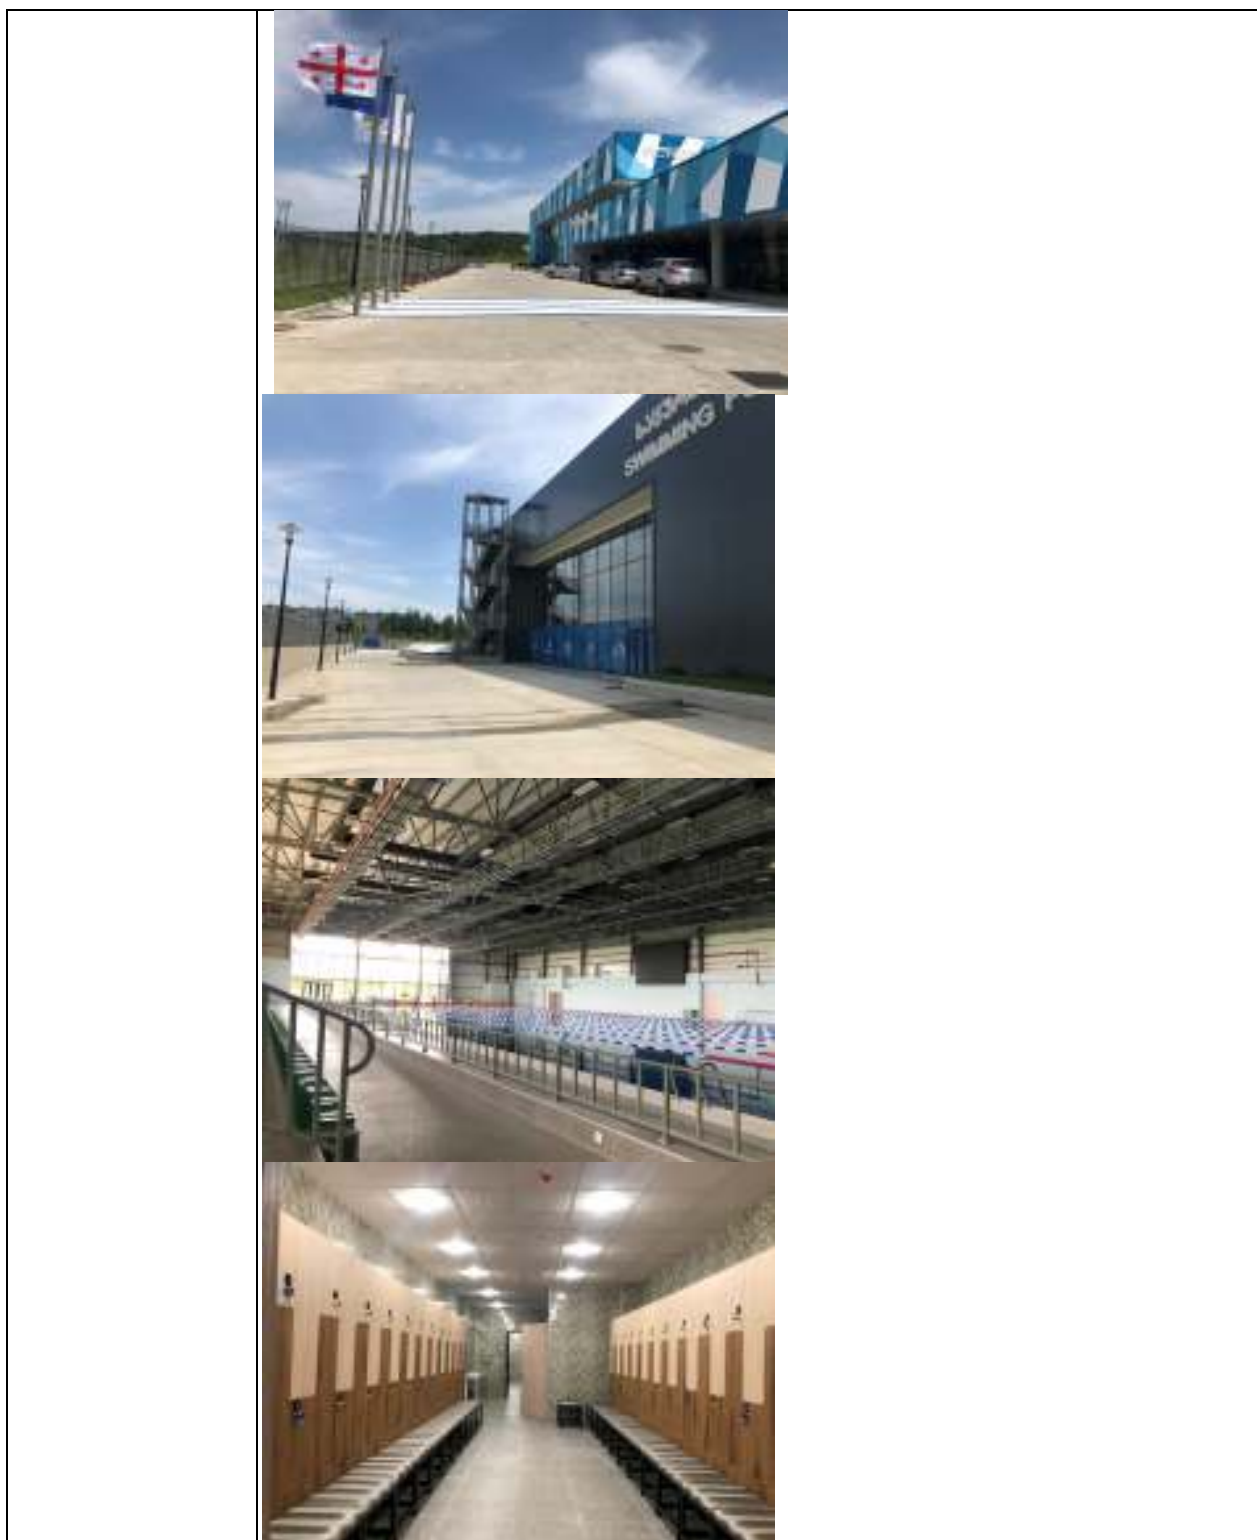
შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	 The collage contains several documents: Emergency Response Plan: Construction of the Enkentepe Reservoir. It includes a title page with a logo and a table of contents. Health and Safety Monthly Report: February 2021. It includes a table with columns for 'No.', 'Date', 'Description of the incident', 'Cause', 'Effect', 'Preventive measures', and 'Responsible person'. Safety Measures: A list of measures to be taken in case of an emergency, including: 1. Evacuation of the site 2. Notification of the authorities 3. First aid 4. Fire fighting 5. Pollution control 6. Security 7. Communication 8. Medical assistance 9. Transport 10. Accommodation 11. Food and drink 12. Entertainment 13. Other Table of Responsibilities: A table with columns for 'No.', 'Name', 'Position', 'Responsibility', and 'Signature'.
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს კონტრაქტორის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოები და გაცდენები)

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

საღმრჩენილი შეუსაბამობები	ამ პერიოდის განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოები თითქმის დამთავრებული იყო, თუმცა ზოგიერთ მონაკვეთებზე არ კონტროლდებოდა უცხო პირების შესვლა; ობიექტის შემოღობვის არარსებობა, ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება მართვადია; გამოვლინდა ღია ადგილები, მაგრამ კონტრაქტორმა დახურა ეს საკითხი, აიგო ღობე და ჭები დაიხურა. სიმაღლეზე მუშაობა, ამწევი სამუშაოები, უსაფრთხოების ბარიერები და სამაშველო ტროსი - გამოვლინდა უსაფრთხოების ღვედების ნაკლებობა და მუშაობა რეგულაციებთან შეუსაბამოდ, მაგრამ კონტრაქტორი იყო ინფორმირებული და ასრულებდა SC მოთხოვნას; ცხელი სამუშაოები - ელექტრო საკაბელო სისტემა მართვადია, ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია; ღია ჭაბურღილები დაფარულია, მაგრამ მაინც სჭირდება კონტროლი; მობილური ხარაჩოების სრული კომპლექტი არ არის - კონტრაქტორი აწვდის ხარაჩოებს, მაგრამ მუშაობისას საჭიროა თანამშრომლის კონტროლი და შემოწმება ყოველ 7 დღეში; აღჭურვილობა და ხელსაწყოები ადგილზე - კონტრაქტორი მართავს ღია შახტები - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული, კონტრაქტორი იყო დამთმობი; ღია არაუსაფრთხო თხრილები, არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში ნაწილობრივ გაუმჯობესებული და არასათანადოდ დაწყობილი - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული, კონტრაქტორი იყო ინფორმირებული; პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული კიბეები და ხარაჩოები ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია არაორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახი - ორგანიზებული დადებითი დაკვირვებები
--------------------------------------	---

მიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	 	
ჩატარებული ტრენინგები	ზოგადი ტრენინგი – 09.01.2023 სიმაღლეზე მუშაობა - 12.01.2023 ელექტროუსაფრთხოება – 25.01.2023 საგანგებო სიტუაციებში მოქმედება - 29.02.2023 ხარაჩოები - 12.01.2023 ცხელი სამუშაოები – 25.01.2023 აპწე - 15.01.2023 იარაღები და აღჭურვილობა - 25.01.2023 ერგონომიკა - 12.02.2023 ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები – 09.01.2023	

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება მოხდა: 23.01.2023; 09.02.2023; 10.03.2023; 25.04.2023; 23.05.2023; 09.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მენარდის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში მენარდემ წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტები, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო და საჭიროებს განახლებას; რისკის შეფასება არ შეესაბამება ობიექტის ამჟამინდელ მდგომარეობას; თანამშრომლების დაზღვევა წარმოდგენილი არ არის სახეზე არ არის იარაღების საბოლოო ტექნიკური აქტები ხარაჩოების სერტიფიკატები წარმოდგენილი არ არის ჩატარებული ტერინიგების განახლებული ნუსხა
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ტერიტორიის შემოღობვა - ტერიტორიის არასრული შემოღობვა, ზოგიერთი ადგილის გამოტოვებით - ნაწილობრივ შესრულებულია მესამე მხარის კონტროლი - ძირითადი მისასვლელი კონტროლირებადი, მაგრამ საფრთხე მაინც არსებობს სიმაღლეზე მუშაობა - გამოვლინდა უსაფრთხოების ღვედების ნაკლებობა და მუშაობა რეგულაციებთან შეუსაბამოდ აწევის აქტივობები ცხელი სამუშაოები - ელექტრო საკაბელო სისტემა - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული ღია ჭაბურღილები და თხრილები - გაუკონტროლებელია უსაფრთხოების ბარიერები - ნაწილობრივ მოწყობილი, ზოგიერთ ტერიტორიაზე არ არის → სამაშველო ტროსის ნაკლებობა კიბეზე და ფასადზე მუშაობისას - უსაფრთხოების სამაშველო ტროსის ნაკლებობა მობილური ხარაჩოების სრული ნაკრები არ არის, აღმოჩენილია თვითნაკეთი ხარაჩოები არასათანადო, დაზიანებული ფასადის ხარაჩო ადგილზე ამწეების დოკუმენტების ნაკლებობა არა უსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული - სამშენებლო მასალა არასათანადოდ შენახული პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული კიბეები - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული ხარაჩოები - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული არაორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახი



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - პროგრესშია, საჭიროებს კონტროლს ნიშნები მოძრაობის მართვის მიხედვით იარაღები არ არის უსაფრთხო მძიმე ტექნიკა - წარმოდგენილი ღია ხვრელები - საჭიროა კონტროლი არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე ცეცხლმაქრები არ მუშაობს დადებითი დაკვირვებები ნინდინარეობს ობიექტის დასუფთავება
	

პროექტი:	ბიბლიოთეკის მშენებლობა ზუგდიდში
ობიექტის დათვალიერება მოხდა:	11.01.2023 ; 17.02.2023; 22.03.2023; დაგეგმილია 26.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	HS ოფიცრის სერტიფიკატი წარდგენილია
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	დოკუმენტაციის წარდგენა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, კონტრაქტორი ამაზე მუშაობს სახეზე არ არის ობიექტზე არსებული იარაღების და აღჭურვილობის ტექნიკური აქტები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების განახლებული მოწოდება და მისი რისკის შეფასება თანამშრომლების დაზღვევა

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს კონტრაქტორის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ტერიტორიის შემოღობვა, მესამე მხარის შესასვლელი და მოძრაობის მენეჯმენტი იყო კრიტიკული, = გაუმჯობესებულია მეორე შესასვლელი ჩაკეტილი იყო, ხოლო ძირითადს - აკონტროლებს დაცვა; სიმაღლეზე მუშაობა, უსაფრთხოების ბარიერები და სამაშველო ტროსი - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია ღვედების, ბარიერების ნაკლებობა და მუშაობა რეგულაციებთან შეუსაბამოდ, - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია და საჭიროებს მუდმივ კონტროლს ცხელი სამუშაოები - ელექტრო საკაბელო სისტემა - მიმდინარეობს ღია ჭაბურღილები და ლაქები ფილაზე - მიმდინარეობს, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე, საჭიროებს ყოველდღიურ კონტროლს არაუსაფრთხო მისასვლელი ფილასთან - ორგანიზებულია არ არის უსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - საჭიროა კონტროლი კონტრაქტორის კომპეტენტური პირის მიერ სამშენებლო მასალა და ნარჩენები არ არის გამიჯნული, ამიტომ არ არის დაგროვილი სამშენებლო ზონაში, → არამედ წითელი ხაზების გარეთ; ღია შახტები - ორგანიზებულია სამშენებლო მასალა არასათანადოდ შენახული პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა - სჭირდება ყოველდღიური კონტროლი კონტრაქტორის HS-ის მიერ უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული ნიშნები მოძრაობის რეგულირების მიხედვით მძიმე ტექნიკა - აკლია შესაბამისი ანგარიშები და საკონტროლო სიები ღია და არადაცული ელექტრო კაბელები, რომლებიც მდებარეობს სველ გარემოში
ჩატარებული ტრენინგები	ხანძრის პროფილაქტიკა - 04.01.2023 ფუნქციები და პასუხისმგებლობები - 17.01.2023 პირველადი დახმარება - 31.01.2023 საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება - 14.02.2023 ზოგადი ტრენინგი 28.02.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები - 14.03.2023 ფოლადის სამუშაოები / ყალიბები - 27.03.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები - 10.-04.2023 უსაფრთხოების ბარიერები - 24.04.2023 ცხელი სამუშაოები - 07.05.2023 სიმაღლეზე მუშაობა - 21.05.2023 ხარაჩოები - 06.04.2023



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

დადებითი დაკვირვებები	  
--------------------------	---

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ადგილის დათვალიერება მოხდა: 23.01.2023; 09.02.2023; 10.03.2023; 25.04.2023; 23.05.2023; 09.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი ინფორმირებულია და მუშაობს ამაზე   

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ჩატარებული ტრენინგები	ფუნქციები და პასუხისმგებლობები – 01.05.2023 ხანძრის პროფილაქტიკა – 01.18.2023 ხარაჩოები - 02.01.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები- 14.02.2023 სიმაღლეზე მუშაობა – 21.05.2023 კიბის უსაფრთხოდ გამოყენება - 14.03.2023 უსაფრთხოების ბარიერები - 28.03.2023 ცხელი სამუშაოები – 11.04.2023 ნარჩენების განკარგვა - 09.05.2023 ფოლადის სამუშაოები - 23.05.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები - 06.06.2023

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყარში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება მოხდა: 11.01.2023; 17.02.2023; 18.03.2023; 24.04.2023 ; 18.05.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ	ამ პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი ინფორმირებულია და მუშაობს ამაზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღმოჩენილი შეუსაბამობები	დარღვევების აღწერა: ტერიტორიის შემოღობვა არ არის სათანადოდ განხორციელებული გეგმის მიხედვით, აკლია ნიშნები - მიმდინარე ობიექტის ზოგადი დასუფთავება - მიმდინარე ხვიშა-ხრეში - გადაუხურავი არაუსაფრთხო ელ.კაბელები - ნაწილობრივ გამოსწორებულია არ არის მოწყობილი უსაფრთხო ზონა თვითნაკეთი კიბეები და ხარაჩოები- მიმდინარე ღია თხრილები- შემოღობვის და ნიშნების არარსებობა - ნაწილობრივ გამოსწორებულია არეული, მოუწესრიგებელი საწყობი ხანძარსაშიშია არაორგანიზებული სახელოსნო, არარსებული ნიშნები არაუსაფრთხო ხელის იარაღები - აქტები წარმოდგენილია ცეცხლმაქრი უნდა შეიცვალოს ახლით არასაკმარისი განათების სისტემა თანამშრომლებისთვის ამწე მოწყობილობა არ კონტროლდება - ბარიერები არ შეესაბამება 477 რეგულაციებს, სახეზე არ არის სათანადო ფენილი ნარჩენების განკარგვა უსაფრთხო არ არის - აკლია სათანადო პლატფორმა და შესაბამისი მორწყვა მტვრის თავიდან ასაცილებლად;
ჩატარებული ტრენინგები	სიმაღლეზე მუშაობა 08.01.2023 ხანძრის პროფილაქტიკა – 20.01.2023 კიბის უსაფრთხოდ გამოყენება – 03.02.2023 ზოგადი უსაფრთხოება – 17.02.2023 უსაფრთხოების ბარიერები 03.02.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები- 19.03.2023 ფოლადის სამუშაოები / ყალიბები - 30.03.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები – 14.04.2023 სიმაღლეზე მუშაობა - 28.04.2023 ხარაჩოები – 12.05.2023 ელ.სამუშაოები - 08.06.2023



პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება მოხდა: 11.01.2023; 17.02.2023; 18.03.2023; 24.04.2023 ; 18.05.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი ინფორმირებულია და მუშაობს ამაზე  Handwritten table with 6 rows and 4 columns. The first column contains task numbers and descriptions in Georgian. The second column contains dates. The third column contains checkmarks. The fourth column contains names or initials.  Printed checklist with 6 items. Each item has a handwritten date and a checkmark.  Printed table with 2 columns. The first column contains technical specifications. The second column contains values.
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)


შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღმოჩენილი შეუსაბამობები	დარღვევების აღწერა: • დაზიანებული ფასადის ხარაჩოები - საფრთხის შემცველი პრაქტიკა • სიმაღლეზე მომუშავე თანამშრომელი დაცული არ არის, არსებობს ჩამოვარდნის რისკი • თვითნაკეთი მობილური ხარაჩო - მიმდინარე • თვითნაკეთი კიბე - მიმდინარე • ზოგადი გაწმენდის საჭიროება ობიექტზე, ნარჩენების კონტრაქტორს დროულად არ გააქვს ნარჩენები და არც აცალკევებს და აგროვებს სათანადოდ; • ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა, თანამშრომლები არ არიან აღჭურვილნი სათანადო იდს-თი; • უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის - მიმდინარე • სახიფათო ელექტროკაბელები - ჯერაც მიმდინარე • არაუსაფრთხო ხელის იარაღები - მიმდინარე • არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე • ცეცხლმაქრი უნდა შეიცვალოს ახლით • არასათანადო განათება თანამშრომლებისათვის • სიმაღლეზე მუშაობა -სახიფათო პრაქტიკა • დაუცველი ამწე საშუალება - ბარიერების, ნიშნებისა და სათანადო ფენილის გარეშე
ჩატარებული ტრენინგები	ხარაჩოები - 06.01.2023 ხანძრის პროფილაქტიკა - 20.01.2023 პირველადი დახმარება - 03.02.2023 ზოგადი უსაფრთხოება - 17.02.2023 უსაფრთხოების ბარიერები - 03.02.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები - 16.03.2023 ფოლადის სამუშაოები - 30.03.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები - 14.04.2023 სიმაღლეზე მუშაობა - 28.04.2023 ხარაჩოები - 12.05.2023 ელ. უსაფრთხოება - 08.06.2023



პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება მოხდა: 24.01.2023; 08.02.2023; 10.03.2023; 24.04.2023; 18.05.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი ინფორმირებულია და მუშაობს ამაზე       
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღმოჩენილი შეუსაბამობები	სიმაღლეზე მუშაობა, სამაშველო ტროსის - ნაკლებობა ნაწილობრივ გაუმჯობესდა, მაგრამ მაინც საჭიროა კონტროლი აწევის აქტივობები – კონტროლირებადი უსაფრთხოების ბარიერები - ფიქსირებული, მაგრამ არ არის რეგულაციების მიხედვით სამაშველო ტროსის ნაკლებობა - უსაფრთხოების სამაშველო ტროსის ნაკლებობა ღია შახტები - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული, მაგრამ საჭიროებს კონტროლს პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა - გაუმჯობესებული, თანამშრომლები აღჭურვილნი არიან და მოწოდების აქტი წარმოდგენილია თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული კიბეები - ნაწილობრივ გამოსწორებულია უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ორგანიზებულია ნიშნები მოძრაობის რეგულირების მიხედვით - გაუმჯობესებულია; დოკუმენტები წარმოდგენილია, ნიშნები დაყენებულია კონტრაქტორი საქმის კურსშია და აგზავნის გაუმჯობესებულ სამოქმედო გეგმას, ადგილი მართვადია; დადებითი დაკვირვებები 

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ჩატარებული ტრენინგები	იანვარი სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები თებერვალი ზოგადი უსაფრთხოება ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები თანამშრომლების ყოველდღიური ტერინინგი სიმაღლეზე მუშაობა მარტი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები ზოგადი უსაფრთხოება სიმაღლეზე მუშაობა ყალიბები კიბის უსაფრთხო გამოყენება აღჭურვილობა ობიექტზე აპრილი ხელსაწყოები აღჭურვილობა და ხელსაწყოები ობიექტზე მაისი შედულების და ცხელი სამუშაოები ფოლადის და ყალიბის სამუშაოები უსაფრთხო კიბე აღჭურვილობა და ხელსაწყოები ობიექტზე სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები ივნისი ზოგადი უსაფრთხოება ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა დარჩელში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	24.01.2023; 08.02.2023; 10.03.2023; 24.04.2023; 18.05.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	ამ პერიოდის განმავლობაში, კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი ინფორმირებულია და მუშაობს ამაზე
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები) შპს პრაიმეივს ჯორჯია განმარტება-შედეგების ანგარიშები ნაწილის კვლევა
აღმოჩენილი შეუსაბამობები გამოსახულება 3	3. დარღვევების აღწერა • უსაფრთხოების ბარიერები მოწყობილი არ არის - ჩამოვარდნის რისკი - მიმდინარე • სამაშველო ტროსის გარეშე მუშაობა ბლოკის სამუშაოებზე სახიფათო ზონაში - მიმდინარე • თვითნაკეთი ხარაჩო კრიტიკული ზონის დაუცველ ფილაზე • პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა - მიმდინარე • ნიშნების არარსებობა- მიმდინარე • დაუცველი ამწე საშუალება - ბარიერების, და სათანადო ფენილის გარეშე- მიმდინარე • თვითნაკეთი კიბე - მიმდინარე • თვითნაკეთი ხარაჩო - მიმდინარე • დაუცველი საჭრელი მანქანა - მიმდინარე • ხარაჩო დაზიანებულია, არსებობს ჩამოვარდნის რისკი; ამის გარდა, იგი სათანადოდ არ არის მოწყობილი, უსაფრთხოების წესების დარღვევა; • ხელნაკეთი პლატფორმა, ამის გარდა, იგი განთავსებულია სახიფათო ზონაში, კიბის უჯრედში - არსებობს გადმოვარდნის რისკი • უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის - მიმდინარე • თვითნაკეთი ხარაჩო ობიექტზე - მიმდინარე • სახიფათო ელ. კაბელები - მიმდინარე • არაუსაფრთხო ხელის იარაღები- მიმდინარე • არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე - მიმდინარე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ჩატარებული ტრენინგები	ხანძრის პროფილაქტიკა - 20.01.2023 პირველადი დახმარება - 02.03.2023 ზოგადი უსაფრთხოება – 17.02.2023 უსაფრთხოების ბარიერები – 03.02.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები- 16.03.2023 ფოლადის სამუშაოები = 30.03.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები - 14.04.2023 სიმაღლეზე მუშაობა - 28.04.2023 ხარაჩოები - 26.05.2023 ელ. უსაფრთხოება – 08.06.2023

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა შამგონაში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	11.01.2023; 17.02.2023; 18.03.2023; 24.04.2023 ; 18.05.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წარმოდგენილი დოკუმენტაცია 

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	<u>დარღვევების აღწერა</u> პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა; უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის; ცეცხლმაქრები ხელმისაწვდომი არ არის; ნიშნები სახეზე არ არის; ელ. კაბელები უსაფრთხო არ არის; არაუსაფრთხო ხელის იარაღები; არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე; ობიექტზე ცეცხლმაქრები ხელმისაწვდომი არ არის; ობიექტზე არ არსებობს პირველადი დახმარების პუნქტი;

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ არის; იხ. ზემოთ საანგარიშგებო პუნქტი 20.

დადებითი დაკვირვებები



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ჩატარებული ტრენინგები	ფუნქციები და პასუხისმგებლობები – 05.01.2023 ხანძრის პროფილაქტიკა = 18.01.2023 ხარაჩოები – 01.02.2023 ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები - 14.02.2023 სიმაღლეზე მუშაობა 28.02.2023 კიბის და ხარაჩოების უსაფრთხოდ გამოყენება 14.03.2023 უსაფრთხოების ბარიერები - 28.03.2023 ცხელი სამუშაოები – 11.04.2023 ელ. სამუშაოები - 25.04.2023 ნარჩენების გამოცალკევება - 09.05.2023 ფოლადის სამუშაოები - 23.05.2023 ჩატვირთვის სამუშაოები -06.06.2023

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდიჭყონში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	23.01.2023; 09.02.2023; 10.03.2023; 24.04.2023; 09.06.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების  სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წარმოდგენილია დოკუმენტაცია, რომელიც ამჟამად განხილვის პროცესშია საბოლოოდ დასამტკიცებლად 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამოებები	დარღვევების აღწერა დაუცველი ამწე საშუალება - მიმდინარე სიმაღლეზე მუშაობის არაუსაფრთხო პრაქტიკა - მიმდინარე ღია ლუკი; სახურავის და შესაბამისი ნიშნების თხრილები ღიაა არაუსაფრთხო ღია შახტები - მიმდინარე უსაფრთხოების ღვედის არქონა სახიფათო ზონა არ არის მონიშნული ფასადის ხარაჩოს ქვეშ  გარეშე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	ხარაჩოს მოწყობის არაუსაფრთხო პრაქტიკა, იგი არ არის სათანადოდ დამაგრებული, დარღვეულია უსაფრთხოების წესები; ამწესთან არ არის უსაფრთხოების ნიშნები და ბარიერები უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის არ არის ნიშნები სახიფათო ელ. კაბელები ობიექტზე არ არის ცეცხლმაქრი ობიექტზე არ არის პირველადი დახმარების საშუალება პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა, დაუცველი ჭები და ხვრელები	
ჩატარებული ტრენინგები	აპრილი – 23/04/2023 <u>ზოგადი უსაფრთხოება</u> <u>ხანძრის პროფილაქტიკა</u> <u>პირველადი დახმარება</u> <u>სიმაღლეზე მუშაობა</u> <u>პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა</u> <u>ელ. უსაფრთხოება</u> <u>ჩატვირთვის სამუშაოები</u> <u>კიბის და ხარაჩოების უსაფრთხო გამოყენება</u> <u>ცხელი სამუშაოები</u>	

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა სუფსაში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	24.01.2023; 08.02.2023; 24.03.2023; 25.04.2023; 16.06.2023
სერტიფიცირებულ ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი;
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წარმოდგენის პროცესშია

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის თვითნაკეთი კიბეების და ხარაჩოების გამოყენება ობიექტზე სახიფათო ელ. კაბელები არაუსაფრთხო ხელის იარაღები ცეცხლმაქრების არარსებობა ობიექტზე პირველადი დახმარების არარსებობა ობიექტზე	
დადებითი დაკვირვებები	  	
ჩატარებული ტრენინგები	<u>აპრილი</u> <u>ზოგადი უსაფრთხოება</u> <u>ხანძრის პროფილაქტიკა</u> <u>პირველადი დახმარება</u> <u>სიმაღლეზე მუშაობა</u> <u>პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა</u> <u>ელ. უსაფრთხოება</u> <u>ჩატვირთვის სამუშაოები</u> <u>კიბის და ხარაჩოს უსაფრთხოდ გამოყენება</u> <u>ცხელი სამუშაოები</u>	

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ხაჯალიაში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	24.01.2023; 08.02.2023; 24.03.2023; 25.04.2023; 16.06.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	მიმდინარე პროექტზე დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი; 
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარმოადგინა დოკუმენტაცია სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამოებები	სამუშაოების დასრულებამდე აღმოჩენილი იქნა შემდეგი შეუსაბამოებები; პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა, თანამშრომელნი არ არიან ხსენებულით აღჭურვილნი ფასადის ხარაჩო სათანადოდ არ არის მოწყობილი, არსებობს ჩამოვარდნის რისკი, უსაფრთხოების წესების დარღვევა; ამწე საშუალებას აკლია უსაფრთხოების ნიშნები უსაფრთხო ზონა ორგანიზებული არ არის თვითნაკეთი ხარაჩოების გამოყენება ობიექტზე სახიფათო ელ. კაბელები არაუსაფრთხო ხელის იარაღები ცეცხლმაქრების არარსებობა ობიექტზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	პირველადი დახმარების არარსებობა ობიექტზე არეული, საწყობი ხანძარსაშიშა არაორგანიზებული სახელოსნო გამაფრთხილებელი ნიშნების გარეშე არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე
ჩატარებული ტრენინგები	<u>აპრილი -24/04/2023</u> <u>ზოგადი უსაფრთხოება</u> <u>ხანძრის პროფილაქტიკა</u> <u>პირველადი დახმარება</u> <u>სიმაღლეზე მუშაობა</u> <u>პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა</u> <u>ელ. უსაფრთხოება</u> <u>ჩატვირთვის სამუშაოები</u> <u>კიბის და ხარაჩოს უსაფრთხოდ გამოყენება</u> <u>ცხელი სამუშაოები</u>


პროექტი:	რუსთავის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	20.01.2023; 07.02.2023; 21.03.2023; 15.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	კონტრაქტორმა დანიშნა კომპანია „Safety Line“ 2022 წლის მაისში,
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარმოადგინა ზოგიერთი მოთხოვნილი დოკუმენტი, მაგრამ მათი განახლება არ ხდება ყოველთვიურად გონივრულ ვადებში
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ობიექტის შემოღობვის ნაკლებობა - მიმდინარე ღია თხრილები და ორმოები ობიექტს მიღმა, ამის გარდა შემოუღობავია— სტატუსი მიმდინარე სიმაღლეზე მუშაობა - ბარიერების, უსაფრთხოების ღვედების ნაკლებობა, და მუშაობა რეგულაციების დაუცველად; უსაფრთხოების ღვედები დამაგრებულია რეგულაციების დაუცველად; გადასატანი ხარაჩოების არასრული კომპლექტაცია, თვითნაკეთი ხარაჩოები და კიბეები ობიექტზე მექანიზმების დოკუმენტაციის ნაკლებობა ობიექტზე - წარმოდგენილია ოპერატორის ავტორიზაცია, დანარჩენი დოკუმენტაცია არ არის ფილის უსაფრთხოება დაუცველია, მუშახელი იყენებს თვითნაკეთ კიბეს. ღია და სახიფათო თხრილები - საჭიროებს სათანადო ბარიერებს არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში სამშენებლო მასალა და ნარჩენები არ არის განცალკევებული სამშენებლო მასალა არ არის სათანადოდ დაწყობილი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ჯერ არ არის ორგანიზებული ნიშნები ტრანსპორტის რეგულირებისათვის მძიმე ტექნიკა – ანგარიშები და საკონტროლო ნუსხები ხელმისაწვდომი არ არის – წარმოდგენილია შეუვსებელი საკონტროლო ნუსხები; ღია ორმოები - კვლავ არ არის ორგანიზებული დაუცველი შახტები და ორმოები ღია და დაუცველი ელ. კაბელები სველ გარემოში დაკიდებული ხარაჩო - არ არის სათანადოდ ორგანიზებული სახიფათო ზონა მონიშნული არ არის	 
ჩატარებული ტრენინგები	16.01.2023 - სიმაღლეზე მუშაობა 16.02.2023 - პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა 16.03.2023 – სიმაღლეზე მუშაობა, საგანგებო სამუშაო გეგმა, ხელით ჩატვირთვა 18.04.2023 – პირველადი დახმარება, ინდივიდუალური უსაფრთხოების ზომები და მათი გამოყენება 15.05.2023- ხანძრის პროფილაქტიკა / სიმაღლეზე მუშაობა /ელ. უსაფრთხოება 20.06.2023 - სიმაღლეზე მუშაობა, ინდივიდუალური და კოლექტიური უსაფრთხოების საშუალებები, პირველადი დახმარება, შრომის კანონი	

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფოთში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	ბოლო 6 თვის განმავლობაში ობიექტის დათვალიერება განხორციელდა: 24.01.2023; 08.02.2023; 10.03.2023; 25.04.2023; 18.06.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი- განახლებული სერტიფიკატი წარმოდგენილი არ არის
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება. 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამოებები	• არ არის აწყობილი ხარაჩოების სრული ნაკრები, ამიტომ აკლია ხარაჩოების სერტიფიკატი და ტექნიკური აქტი - მიმდინარე • სიმაღლეზე მუშაობისას სამაშველო სარტყლის არარსებობა - მიმდინარე • ბარიერები არ არის დაფიქსირებული 477 რეგლამენტის მიხედვით, ზოგიერთ მონაკვეთში არ არის განთავსებული - მიმდინარე • ღია შახტები (აკლია იატაკი), სათანადო ბარიერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები • ხვრელები არ არის დაფარული • ლიფტის უჯრედში ბარიერი სწორად არ არის დამაგრებული • ღია ჭაბურღილი • თხრილი სათანადოდ არ არის შემოღობილი • ბასრი საგნები არ არის დაცული • საჭიროა ტერიტორიის ზოგადი გაწმენდა • სახიფათო ელექტრო კაბელები • ქვიშა არ არის დაფარული დადებითი დაკვირვებები

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
ჩატარებული ტრენინგები	იანვარი 2023 სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა თებერვალი 2023 ზოგადი უსაფრთხოება ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა თანამშრომლების ყოველდღიური ტრენინგი სიმაღლეზე მუშაობა მარტი 2023 ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა ზოგადი უსაფრთხოება სიმაღლეზე მუშაობა ყალიბები კიბის უსაფრთხო გამოყენება ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა აპრილი 2023 იარაღების კომპლექტი ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა და იარაღები მაისი 2023 შედულების და ცხელი სამუშაოები ფოლადის და ყალიბის სამუშაოები კიბის უსაფრთხო გამოყენება ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა და იარაღები სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა ივნისი 2023 ზოგადი უსაფრთხოება

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა
--	-----------------------------------

პროექტი::	სპორტკომპლექსის მშენებლობა ახალციხეში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	10.03.2023; 12.04.2023; 15.05.2023; 15.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წარმოდგენის პროცესშია
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	<u>დარღვევების აღწერა</u> 1. სიმაღლეზე მუშაობის არაუსაფრთხო პრაქტიკა - კონტრაქტორი მუშაობს ამ თემაზე 2. ხარაჩოს მოწყობის არაუსაფრთხო პრაქტიკა, 3. არაუსაფრთხო ფილა – უსაფრთხოების ბარიერების არარსებობა - მიმდინარე 4. აღმოჩენილია ხელნაკეთი კიბე – მიმდინარე 5. აღმოჩენილია ხელნაკეთი პლატფორმა - მიმდინარე 6. მუშახელი მუშაობს სიმაღლეზე უსაფრთხოების წესების და რეგულაციების დაუცველად. წარმოდგენილი არ არის აღჭურვილობის ტექნიკური ინსპექტირების სერტიფიკატი და საკონტროლო ნუსხა 7. უსაფრთხოების ღვედის არქონა 8. აღმოჩენილია ბასრი საგნები, შესაბამისი მონიშვნის და დაცვის გარეშე 9. ხარაჩო დაზიანებულია, არსებობს ჩამოვარდნის რისკი დარღვეულია უსაფრთხოების წესები;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	10. დაუცველი ამწე საშუალება ნიშნების და ძირის გარეშე 11. სახიფათო ზონა არ არის ორგანიზებული 12. არ არის ნიშნები 13. არეული არაორგანიზებული საწყობი ხანძარსაშიშია- აღმოფხვრილია 14. არაორგანიზებული სახელოსნო, ნიშნების გარეშე 15. სახიფათო ელ. კაბელები- მიმდინარე 16. არაუსაფრთხო ხელის იარაღები – აღმოფხვრილია 17. არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე 18. ობიექტზე არ არის ცეცხლმაქრი - აღმოფხვრილია 19. ობიექტზე არ არის პირველადი დახმარების საშუალება - აღმოფხვრილია 20. დაუცველი ფილა ბარიერების გარეშე – ჩავარდნის რისკი, კრიტიკული შეუსაბამობა 21. პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა,- შესრულებულია 22. თხრილები დიაა - შესრულებულია 23. ქვიშა-ხრეში დაუცველია – შესრულებულია
ჩატარებული ტრენინგები	თებერვალი 2023 სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა მარტი 2023 ხარაჩოები პირველადი დახმარება ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა ზოგადი უსაფრთხოება აპრილი 2023 იარაღების კომპლექტი ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა და იარაღები მაისი 2023 შედულების და ცხელი სამუშაოები



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	ფოლადის და ყალიბის სამუშაოები კიბის უსაფრთხო გამოყენება ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა და იარაღები სიმაღლეზე მუშაობა ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა
--	--

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	22.03.2023; 12.04.2023; 15.05.2023; 15.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	წარმოდგენის პროცესშია 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	<u>დარღვევების აღწერა</u> 1. ფილაზე მისასვლელი მიუღებელია 2. ღია ორმოები და დაუცველი ამწე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	3. ობიექტი სათანადოდ არ არის შეღობილი, სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის გეგმის მიხედვით, შე4საბამისად სახეზეა უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა 4. საჭიროა ობიექტის ზოგადი დასუფთავება 5. ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა, თანამშრომლები არ არიან აღჭურვილნი სათანადო ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით, კვლევის ფარგლებში დადგინდა რომ მათ არ ჩაუტარდათ ტრეინინგი ზემოხსენებულთან დაკავშირებით; 6. სახიფათო ზონა არ არის ორგანიზებული 7. არ არის ნიშნები 8. აღმოჩენილია ხელნაკეთი კიბე 9. ბოლო ფილას აკლია უსაფრთხოების ღვედი - ჩამოვარდნის რისკი 10. აღმოჩენილია ხელნაკეთი ხარაჩო 11. ბასრი საგნები 12. არეული არაორგანიზებული საწყობი ხანძარსაშიშია 13. არაორგანიზებული სახელოსნო, ნიშნების გარეშე 14. სახიფათო ელ. კაბელები 15. არაუსაფრთხო ხელის იარაღები 16. არასათანადოდ დამაგრებული ქვა საჭრელ მანქანაზე 17. ცეცხლმაქრი საჭიროებს ახლით შეცვლას
ჩატარებული ტრეინინგები	აპრილი -28/04/2023 <u>ზოგადი უსაფრთხოება</u> <u>ხანძრის პროფილაქტიკა</u> <u>პირველადი დახმარება</u> <u>სიმაღლეზე მუშაობა</u> <u>ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები</u> <u>ელ. უსაფრთხოება</u> <u>ჩატვირთვის სამუშაოები</u> <u>კიბეების და ხარაჩოების უსაფრთხოდ გამოყენება</u> <u>ცხელი სამუშაოები</u>

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა კურდღელაურში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	30.01.2023, 16.02.2023, 24.03.2023, 06.04.2023, 10.05.2023, 22.06.23
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი 
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით (რისკების შეფასება, მაკორექტირებელი ქმედებების ანგარიშები), ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება. 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამოებები	ობიექტის შეღობვა, ტრანსპორტის მოძრაობის კონტროლი მართვადია, ამ პერიოდის განმავლობაში აღმოჩნდა ღია წერტილები, მაგრამ კონტრაქტორმა დახურა ეს საკითხი და შეღობვის თემაც;

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.


გამოსახულება 1.	სიმაღლეზე მუშაობა, ამწე სამუშაოები, უსაფრთხოების ბარიერები და უსაფრთხოების ღვედი - არასაკმარისი უსაფრთხოების ბარიერები და უსაფრთხოების ღვედების არარსებობა შენობის მე-2-ე სართულზე. ცხელი სამუშაოები - ელ. კაბელების სისტემა მართვადია, ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია; ღია ჭები დაიხურა, მაგრამ მაინც საჭიროებს კონტროლს; ხარაჩოს არასრული კომპლექტაცია – კონტრაქტორმა მოიტანა ხარაჩოები, მაგრამ სამუშაოების დროს უნდა გააკონტროლოს თანამშრომლები და ჩაატაროს შემოწმება 7 დღეში ერთხელ;
------------------------	---

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	ობიექტზე არსებული აღჭურვილობა და იარაღები - კონტრაქტორი სიტუაციას მართავს ღია არაუსაფრთხო თხრილები, არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია და არასათანადოდ დაყრილი ხვიშა-ხრეში - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია, კონტრაქტორი დამყოლი იყო; ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა - რამდენიმეჯერ დაფიქსირდა შედუღების სამუშაოების წარმოება დამცავი სახის ფარის გარეშე. თვითნაკეთი და / ან დაზიანებული კიბეები და ხარაჩოები - არ გაუმჯობესებულა არაორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახები - ორგანიზებულია დადებითი დაკვირვებები  თითოეული აღმოჩენილი შეუსაბამობის სტატუსის აღწერა მოცემულია თანდართულ ანგარიშებში.
--	---

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	13.01.2023, 24.02.2023, 16.03.2023, 13.04.23, 03.05.2023, 13.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება. 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ობიექტის შეღობვა - სრულად შეღობილია. მესამე მხარის კონტროლი - ძირითადი მისასვლელი კონტროლდება სიმაღლეზე მუშაობა - ხარაჩოს არასრული კომპლექტაცია – კონტრაქტორმა მოიტანა ხარაჩოები, მაგრამ სამუშაოების დროს უნდა გააკონტროლოს თანამშრომლები და ჩაატაროს შემოწმება 7 დღეში ერთხელ; ხარაჩოები არ არის კარგ მდგომარეობაში. ხარაჩოების კიბეები, რელსები და შეერთებები უსაფრთხოების სტანდარტების შეუსატყვისია და სიტუაცია ძალზედ არაუსაფრთხოა.  ღია არაუსაფრთხო თხრილები, არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია და არასათანადოდ დაყრილი ხვიშა-ხრეში - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია, კონტრაქტორი დამყოლი იყო; - რამდენიმეჯერ დაფიქსირდა შედუღების სამუშაოების წარმოება დამცავი სახის ფარის გარეშე.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

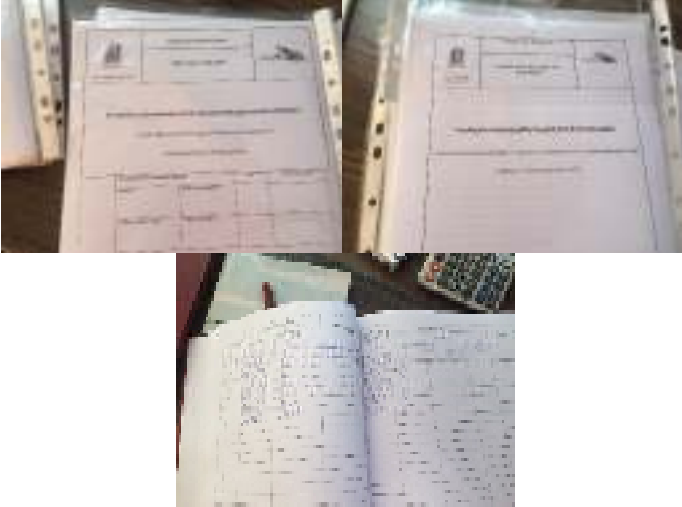
	თვითნაკეთი და / ან დაზიანებული კიბეები და ხარაჩოები - არ გაუმჯობესებულა არარეგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახები - ორგანიზებულია ცხელი სამუშაოები - ელ. კაბელების სისტემა მართვადია, ღია ჭები - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია არაუსაფრთხო ხვიშა-ხრეში - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია არასათანადოდ დაყრილი სამშენებლო მასალა  ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა – კარგი მდგომარეობა არარეგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახები – ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა – სამშენებლო მოედანზე დამონტაჟებულია სათანადო ფერის საკმარისი რაოდენობის გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და ა.შ. ნიშანი. ნიშნებზე აღნიშნული ინფორმაცია ადვილად წაკითხვადია და სათანადო ადგილზეა განთავსებული.  მძიმე ტექნიკა – წარმოდგენილია ღია ორმოები – კარგი მდგომარეობა, მაგრამ საჭიროებს კონტროლს დადებითი დაკვირვებები
--	--

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ვარდისუბანში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები:	30.01.2023, 16.02.2023, 24.03.2023, 06.04.2023, 10.05.2023, 22.06.23
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	ოფიცრის სერტიფიკატი წარმოდგენილი არ არის PS : (ინფორმაციისათვის, ადგილობრივი რეგულაციის თანახმად, 2022 წლის დეკემბერში, ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო გადაეხარებინა გამოცდა და გაეარა ტესტირება საქართველოს HS დეპარტამენტში); წარმოდგენილია მხოლოდ აქტი, აკლია სერტიფიკატი.
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ობიექტის შედგენა, მესამე მხარის წვდომა და ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება კარგ მდგომარეობაშია ცხელი სამუშაოები - ელ. საკაბელო სისტემა - ორგანიზებულია ღია ჭები და წერტილები ფილაზე - მიმდინარეობს, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე, საჭიროა ყოველდღიური კონტროლი სიმაღლეზე და ხარაჩოებზე მუშაობა – შესრულებულია. ობიექტზე სახეზეა თვითნაკეთი კიბეები და პლატფორმები.  არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - უნდა გაკონტროლდეს კონტრაქტორის კომპეტენტური წარმომადგენლის მიერ სამშენებლო მასალა და ნარჩენები არ არის განცალკევებული და შესაბამისად არ არის დაწყობილი სამშენებლო მოედანზე, არამედ წითელი ხაზების გარეთ; სამშენებლო მასალა სათანადოდ არ არის დაწყობილი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა – საჭიროებს ყოველდღიურ კონტროლს კონტრაქტორის HS მიერ უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა – არასაკმარისი უსაფრთხოების და გამაფრთხილებელი ნიშნები სამშენებლო მოედანზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	მძიმე ტექნიკა – სახეზე არ არის შესაბამისი ანგარიშები და საკონტროლო ნუსხები დადებითი დაკვირვებები 
--	---


პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები::	13.01.2023, 24.02.2023, 16.03.2023, 03.05.2023, 13.06.2023, 22.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	ოფიცრის სერტიფიკატი წარმოდგენილი არ არის PS : (ინფორმაციისათვის, ადგილობრივი რეგულაციის თანახმად, 2022 წლის დეკემბერში, ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო გადაებარებინა გამოცდა და გაეარა ტესტირება საქართველოს HS დეპარტამენტში); წარმოდგენილია მხოლოდ აქტი, აკლია სერტიფიკატი.
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

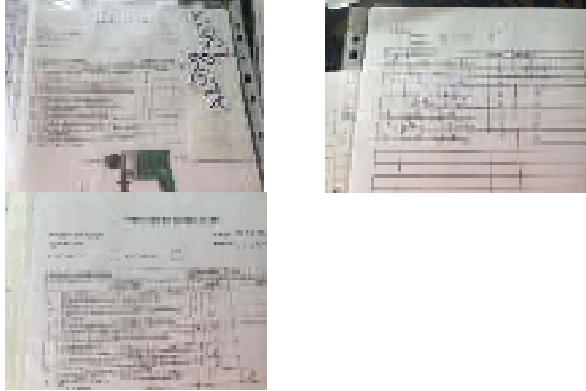
	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ობიექტის შედგენა, მესამე მხარის წვდომა და ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია სიმაღლეზე და ხარაჩოებზე მუშაობა – შესრულებულია. აწევის სამუშაოები - კონტროლდება ღია ორმოები – სახურავების გარეშე, ბარიკადირება და ნიშნები.  არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში სამშენებლო მასალა არასათანადოა და წყობილი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების ნაკლებობა – ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია თვითნაკეთი და / ან დაზიანებული კიბეები - ჯერ კიდევ სახეზეა, არ არის ორგანიზებული  არაორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახები – ორგანიზებულია უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - არასაკმარისია

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	დადებითი დაკვირვებები 
--	---

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქვემო ბოდბეში
ობიექტის დათვალიერების თარიღები::	13.01.2023, 16.02.2023, 16.03.2023, 13.04.2023, 29.05.2023, 07.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	ოფიცრის სერტიფიკატი წარმოდგენილია PS : (ინფორმაციისათვის, ადგილობრივი რეგულაციის თანახმად, 2022 წლის დეკემბერში, ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო გადაეხარებინა გამოცდა და გაეარა ტესტირება საქართველოს HS დეპარტამენტში); წარმოდგენილია მხოლოდ აქტი, აკლია სერტიფიკატი. 
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

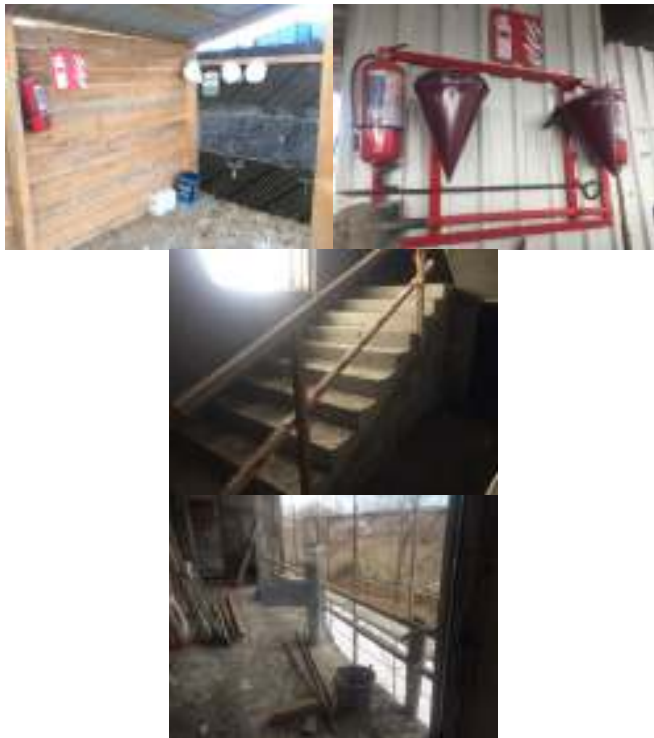
	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ობიექტის შეღობვა, მესამე მხარის კონტროლი, გაცემულია ინსტრუქცია მაკონტროლებელი კომპეტენტური პირის განპიროვნების თაობაზე სიმაღლეზე მუშაობა, ბარიერების და უსაფრთხოების ღვედების ნაკლებობა – კონტრაქტორი მართავს, მაგრამ ჯერ დასრულებული არ არის; ღია ჭები - დახურულია, მაგრამ საჭიროებს კონტროლს სახეზე არ არის მონიშვნის სისტემა, კიბეები, სრული ფენილი და ფეხის ფიცრები. ხარაჩოები შესაბამისობაში არ არის უსაფრთხოების სტანდარტებთან და სიტუაცია ძალზედ არაუსაფრთხოა. აგრეთვე, პერსონალი მუშაობისას არ იყენებს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს.  ღია არაუსაფრთხო თხრილები – მიმდინარე არაუსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - მიმდინარე სამშენებლო მასალა სათანადოდ არ არის დაწყობილი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.




უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ორგანიზებულია
ნიშნები ტრანსპორტის მოძრაობის შესაბამისად
არაუსაფრთხო იარაღები - მიწოდებულია კონტრაქტორის მიერ, მაგრამ უნდა
გაკონტროლდეს მათი სათანადოდ გამოყენება თანამშრომლების მიერ,
ჩასატარებელია მეტი ტრენინგები;

დადებითი დაკვირვებები



პროექტი:	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ობიექტის დათვალიერების თარიღები::	13.01.2023, 16.02.2023, 16.03.2023, 13.04.2023, 29.05.2023, 07.06.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი PS : (ინფორმაციისათვის, ადგილობრივი რეგულაციის თანახმად, 2022 წლის დეკემბერში, ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო გადაებარებინა გამოცდა და გაეარა ტესტირება საქართველოს HS დეპარტამენტში); წარმოდგენილია მხოლოდ აქტი, აკლია სერტიფიკატი. 
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამოებები და გადაცდენები)

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ტერიტორიის შემოღობვა, ტრანსპორტის მენეჯმენტი - გაცემულია ინსტრუქციები დასაორგანიზებლად სიმაღლეზე მუშაობა, ბარიერების და სამაშველო ტროსის ნაკლებობა - ორგანიზებულია;  ხარაჩოები - არ არის წარმოდგენილი ხელნაკეთი კიბეები და პლატფორმები უნდა გაიტანონ სამშენებლო ტერიტორიიდან და შეიცვალოს ახლით (ქარხნულით).  ღია შახტები - ჯერ არ არის დასრულებული ღია არა უსაფრთხო თხრილები - ორგანიზებულია არა უსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - პროგრესშია სამშენებლო მასალა არასათანადოდ შენახული - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია
-------------------------------------	---

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.




პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა- გაუმჯობესებული უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული ნიშნები ტრანსპორტის მოძრაობის მართვის მიხედვით არა უსაფრთხო იარაღები - კონტრაქტორი აწვდის, მაგრამ უნდა გააკონტროლოს თანამშრომლის მიერ სათანადო გამოყენება, სჭირდება მეტი ტრენინგის ჩატარება;

დადებითი დაკვირვებები



პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში
----------	-----------------------------------

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ადგილის დათვალიერების თარიღები:	13.01.2023, 16.02.2023, 16.03.2023, 13.04.2023, 29.05.2023, 07.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი PS : (ინფორმაციისათვის, ადგილობრივი რეგულაციის თანახმად, 2022 წლის დეკემბერში, ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო გადაებარებინა გამოცდა და გაეარა ტესტირება საქართველოს HS დეპარტამენტში); წარმოდგენილია მხოლოდ აქტი, აკლია სერტიფიკატი. 
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე 
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯერთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ადგილის შემოღობვა, მესამე მხარის შემოსასვლელი - კარგი მდგომარეობა სიმაღლეზე მუშაობა, სამაშველო ტროსის ნაკლებობა - არ არის ორგანიზებული აწევის აქტივობები - კონტროლირებადი

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



ღია ჭაბურღილები - არ არის ორგანიზებული
 უსაფრთხოების ბარიერები - არ არის ორგანიზებული
 ღია არა უსაფრთხო თხრილები - არ არის ორგანიზებული



ღია შახტები - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული, მაგრამ საჭიროებს კონტროლს
 არა უსაფრთხო ქვიშა-ხრეში- მიმდინარეობს



სამშენებლო მასალა არასათანადოდ შენახული
 პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა - რამდენჯერმე დაფიქსირდა, პერსონალი არ იყენებდა პერსონალური დაცვის აღჭურვილობას
 თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული კიბეები - ჯერ კიდევ ადგილზეა, არ არის ორგანიზებული
 უსაფრთხოების ნიშნების ნაკლებობა - ნაწილობრივ გაუმჯობესებული
 ნიშნები ტრანსპორტის მოძრაობის მართვის მიხედვით
 ავარიული გასასვლელები - არ არის კარგ მდგომარეობაში
 ელექტრული მავთულები მოძრაობის ადგილებზე სამშენებლო მოედანზე.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	  დადებითი დაკვირვებები   
--	--

პროექტი:	საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში
ადგილის დათვალიერების თარიღები:	30.01.2023, 16.02.2023, 24.03.2023, 13.04.2023, 10.05.2023, 22.06.23
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	HS ოფიცრის სერტიფიკატი ჯერ არ არის წარდგენილი პს: (გაცნობეთ ადგილობრივი რეგლამენტით 2022 წლის დეკემბერში ყველა HS ოფიცერი ვალდებული იყო ხელახალი გამოცდა ჩაებარებინა საქართველოს HS დეპარტამენტში); მხოლოდ აქტია წარდგენილი, სერტიფიკატი - არა;
კონტრაქტორის მიერ	არ არის ორგანიზებული

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები გამოსახულება 3	ადგილის შემოღობვა, მესამე მხარის შესასვლელი - არ არის შემოღობილი ადგილის სრული ტერიტორია სიმაღლეზე მუშაობა - გამოვლინდა ბარიერების და სამაშველო ტროსის ნაკლებობა ცხელი სამუშაოები - ელექტრო საკაბელო სისტემა - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული - კრიტიკული ღია ჭაბურღილები - არ არის დაფარული და ორგანიზებული  უსაფრთხოების ბარიერები და სამაშველო ტროსი - არ არის დაფიქსირებული არ არის მარკირების სისტემა, კიბეები, ფენილი და ფეხის ფიცრები. ხარაჩო არ შეესაბამება უსაფრთხოების სტანდარტებს და სიტუაცია სახიფათოა. პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის გამოუყენებლობა სამუშაოების დროს  ღია არა უსაფრთხო თხრილები - სჭირდება შესაბამისი ბარიერები არ არის დაფარული ქვიშა-ხრეში სამშენებლო მასალა და ნარჩენები არ არის სათანადოდ გამიჯნული

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის ნაკლებობა – ნაწილობრივ გაუმჯობესებული
 თვითნაკეთი ან/და დაზიანებული კიბეები - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული
 არაორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახი
 ადგილზე უსაფრთხოების ნიშნები არ არის
 ნიშნები მოძრაობის მართვის მიხედვით
 იარაღები არ არის უსაფრთხო
 მძიმე ტექნიკა - აკლია შესაბამისი ანგარიშები და საკონტროლო სიები
 ღია ხვრელები - ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზებული
 ღია და არადაცული ელექტრო კაბელები, რომლებიც მდებარეობს სველ გარემოში



დადებითი დაკვირვებები

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



პროექტი:	ველისციხის ურბანული განახლება
ადგილის დათვალიერების თარიღები:	05.01.2023, 12.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023, 15.02.2023, 21.02.2023, 01.03.2023, 07.03.2023, 23.03.2023, 28.03.2023, 04.04.2022, 20.04.2022, 05.05.2023, 19.05.2023, 01.06.2023, 16.06.2023
სერტიფიცირებული ოფიცერი ადგილზე	დანიშნულია ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სერტიფიცირებული ოფიცერი
კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	კონტრაქტორმა წარადგინა მოთხოვნილი დოკუმენტაცია; სამუშაო ეტაპის მიხედვით, ზოგიერთ მათგანს განახლება სჭირდება, კონტრაქტორი მუშაობს ამ საკითხზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	
SC ინსპექტირების ანგარიშები 6 თვის განმავლობაში	ყოველთვიურად Eptisa HS მენეჯერი სტუმრობს ადგილს, ატარებს შეხვედრებს მენარდის უმაღლეს მენეჯმენტთან და HS ოფიცერთან; იხილეთ თანდართული დოკუმენტები (ინსპექტირების ანგარიშები, შეუსაბამობები და გადაცდენები)
აღმოჩენილი შეუსაბამობები	ტერიტორიის შემოღობვა - მთლიანად შემოღობილია სიმაღლეზე მუშაობისას დამცავი ბარიერები - ნაწილობრივ გაუმჯობესებულია, მობილური ხარაჩოების სრული ნაკრები არ არის, აღმოჩენილია თვითნაკეთი ხარაჩოები - მიცემულია ინსტრუქცია ორგანიზებისათვის რეკომენდაციების შესაბამისად  ბასრი საგნები - კარგ მდგომარეობაშია თანამშრომელი იყენებს თვითნაკეთ და არა ორგანიზებულ კიბეს. ღია არა უსაფრთხო თხრილები - გაუმჯობესებულია

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



არ არის უსაფრთხო ქვიშა-ხრეში - გაუმჯობესებულია
 სამშენებლო მასალა და ნარჩენები გამოიჯნულია ერთმანეთისგან
 პერსონალური დაცვის აღჭურვილობა - შეინიშნება პერსონალი, რომელიც არ
 იყენებს პერსონალური დაცვის აღჭურვილობას
 ორგანიზებული სასადილო და გამოსაცვლელი ოთახი
 მძიმე ტექნიკა - შესაბამისი ანგარიშები და საკონტროლო სიები კარგ
 მდგომარეობაშია
 სახანძრო სტენდი, ჩამქრობი, პირველადი დახმარების ნაკრები - ყველა
 ლოკაციაზე არის კარგ მდგომარეობაში
 ავარიული გასასვლელები - ყველა ლოკაციაზე არის კარგ მდგომარეობაში
 სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებულია საკმარისი რაოდენობის
 გამაფრთხილებელი, საგანგებო, ამკრძალავი და საჩვენებელი ნიშნები
 შესაბამისი ფერებით. ნიშნებზე განთავსებული ინფორმაცია ადვილად
 იკითხება, ნიშნები განთავსებულია შესაბამის ადგილებზე.

დადებითი დაკვირვებები



შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.



3.9. ტრენინგები

248. მშენებელმა კონტრაქტორებმა მუშებისთვის HSE ტრენინგი ჩაატარეს უსაფრთხოების ზომებთან და თითოეული სამუშაოს სპეციფიკაციებთან დაკავშირებით.

249. HSE ტრენინგები ჩაატარეს სამშენებლო კომპანიებმა. წარმოებდა ტრენინგის ჩანაწერები, რომლებიც ყოველთვიურ ანგარიშებში აისახა. პერსონალი აქტიურად იყო ჩართული EHS მოთხოვნების შესრულების და მეთოდების გაგებაში

ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი

N	პროექტი	ტრენინგის დასახელება	თარიღი
1	ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • საწყისი გარემოსდაცვითი კურსი	12.04.2023

ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და ახალგაზრდული ცენტრის პროექტი

N	პროექტი	ტრენინგის დასახელება	თარიღი
1	ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და ახალგაზრდული ცენტრის პროექტი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულებები მშენებლობის პროცესში; • ქვევის კოდექსის ვალდებულებები; • ნარჩენების განკარგვა და განცალკევება; • საწყისი გარემოსდაცვითი კურსი;	09.01.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

	სახიფათო ნარჩენები და მათი განკარგვა.	
--	---	--

საბავშვო ბაღები და სპორტული კომპლექსები

N	პროექტი	ტრენინგის დასახელება	თარიღი
1.	ქუთაისის საცურო აუზი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: - ნარჩენების განკარგვა - დაბინძურების თავიდან აცილება - საწვავის დაღვრაზე რეაგირება - ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა - ხემცენარეების დაცვა	02.05.2023
2.	რუსთავის სპორტული კომპლექსი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: - ნარჩენების განკარგვა - დაბინძურების თავიდან აცილება - საწვავის დაღვრაზე რეაგირება - ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა - ხემცენარეების დაცვა	28.04.2023
3.	ქუთაისის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: - ნარჩენების განკარგვა - დაბინძურების თავიდან აცილება - საწვავის დაღვრაზე რეაგირება - ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა - ხემცენარეების დაცვა	02.05.2023
4.	ფოთის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: - ნარჩენების განკარგვა - დაბინძურების თავიდან აცილება - საწვავის დაღვრაზე რეაგირება - ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა - ხემცენარეების დაცვა	04.05.2023
5.	სუფსის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: ნარჩენების განკარგვა	04.05.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	
6.	ხაჯალიას საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	04.05.2023
7.	სენაკის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	03.05.2023
8.	ძველი ანაგის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
9.	ქვემო ბოდბის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
10.	ბანძის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა	02.05.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• ხემცენარეების დაცვა	
11.	დიდიჭყონის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	02.05.2023
12.	ჭიაურის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
13.	ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
14.	ჭითაწყარის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	03.05.2023
15.	რუხის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	04.05.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

16.	დარჩელის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	03.05.2023
17.	ვარდისუბნის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
18.	შამგონას საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	03.05.2023
19.	კურდღელაურის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	01.05.2023
20.	ფარცხისის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	28.04.2023
21.	წინწყაროს საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე:	28.04.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

		• ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	
22.	აგარის საბავშვო ბაღი	გარემოსდაცვითი ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: • ნარჩენების განკარგვა • დაბინძურების თავიდან აცილება • საწვავის დაღვრაზე რეაგირება • ნიადაგის ზედა ფენის/ქვედა ფენის შენახვა • ხემცენარეების დაცვა	27.04.2023

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

5. გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (SEMP) ფუნქციონირება

5.1 გარემოს დაცვის მართვის გეგმის (SEMP) მიმოხილვა

სპორტული კომპლექსები და საბავშვო ბაღები

250. როგორ ზემოთ აღინიშნა, კონტრაქტორები სამშენებლო საქმიანობის გარემოს დაცვით მონიტორინგს SSEMP შესაბამისობაში ასრულებენ, EMP/SSEMP მოთხოვნების საფუძველზე, პროექტების მონიტორინგის ზომებში შედის სამშენებლო ადგილის ზედამხედველობა, ნებართვების გადამოწმება, კონტრაქტორების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი და გარემოზე ზემოქმედების სპეციფიკური მონიტორინგი, როგორიცაა ხმაური, მტვერი, ნიადაგის დაბინძურება, ლანდშაფტის სტრუქტურა, სამშენებლო ნარჩენები, ფლორა და ფაუნა, წყლის დაბინძურება, ჰაერის ემისიები და ა. შ.
251. კონტრაქტორს აქვს უნარი სრულად შეასრულოს SSEMP მოთხოვნების. SSEMP მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგს ახორციელებენ კონტრაქტორის ზედამხედველობის კონსულტანტის და მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოს მართვის სპეციალისტები.
252. მას შემდეგ, რაც საბავშვო ბაღების მშენებლობისთვის შემუშავებული საწყისი გარემოსდაცვითი კვლევები (IEE) მომზადდა საბავშვო ბაღების შაბლონური დიზაინის საფუძველზე, IEE განახლებულია/გადახედილია დეტალური საინჟინრო პროექტის (DED) შესაბამისად და გამოქვეყნებულია MDF-ის ვებგვერდზე. გარდა ამისა, IEE-ების განახლებასთან ერთად, CC-ის SSEMP და მისი ქვეგეგმები შესაბამისად გადაიხედება

ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა ზუგდიდში

253. ველისციხის სამშენებლო კომპანიამ შეიმუშავა გარემოს დაცვის მართვის გეგმა და ქვე-გეგმები: წინასამშენებლო ანგარიში, აზბესტის მართვის გეგმა, ბანაკის მართვის გეგმა, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა (COVID-19 ზომების ჩათვლით), ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმის, საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმის, ნარჩენების მართვის გეგმის (გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული) და ნიადაგის ზედა ფენის მართვის გეგმის მიხედვით. SSEMP შეთანხმდა MDF-თან 24 იანვარს და მოგვიანებით განახლდა 2022 წლის ივნისში.
254. როგორ ზემოთ აღინიშნა, კონტრაქტორები სამშენებლო საქმიანობის გარემოს დაცვით მონიტორინგს SSEMP შესაბამისობაში ასრულებენ. EMP/SSEMP მოთხოვნების საფუძველზე, პროექტების მონიტორინგის ზომებში შედის სამშენებლო ადგილის ზედამხედველობა, ნებართვების გადამოწმება, კონტრაქტორების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი და გარემოზე ზემოქმედების სპეციფიკური მონიტორინგი, როგორიცაა ხმაური, მტვერი, ნიადაგის დაბინძურება, ლანდშაფტის სტრუქტურა, სამშენებლო ნარჩენები, ფლორა და ფაუნა, წყლის დაბინძურება, ჰაერის ემისიები და ა. შ.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

255. კონტრაქტორს აქვს უნარი სრულად შეასრულოს SSEMP მოთხოვნების. SSEMP შესრულების მონიტორინგს ახორციელებენ სამშენებლო კომპანია, სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი და განმახორციელებელი სააგენტოს კომიტეტი.
256. ანგარიშგების პერიოდში, აზიის განვითარების ბანკის მოთხოვნების თანახმად, მუნიციპალური განვითარების ფონდი და სამშენებლო ზედამხედველობის კონსულტანტი განიხილავენ და ხელახლა ამოწმებენ SSEMP და ქვე-გეგმებით გათვალისწინებული თავიდან არიდებისა და შერბილების ზომების სათანადოობას.
257. შესაბამისობა SEMP დოკუმენტთან და კონტრაქტორსა და ზედამხედველ კონსულტანტს ერთმანეთთან მჭიდრო კოორდინაცია აქვთ. CSC ამოწმებს შესაბამისობას და თუ რაიმე გადახრა იქნება, ეს აისახება CSC-ის ინსტრუქციის ანგარიშგებაში. ინსტრუქციის ანგარიშგებას დროულად პასუხობს შპს ჯავა-ინსი. ნებისმიერ გადახრა დროულად გამოსწორებულია კონტრაქტორის მიერ. ანგარიშგების პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო კაკლის ხის შენარჩუნება პარკის ტერიტორიაზე და მისი იმ სახით და იმ ადგილას დატოვება, სადაც ის ამჟამად იზრდება. წინა ანგარიშგების პერიოდთან, 2022 წლის იანვარ-ივნისთან შედარებით, გაუმჯობესდა კოორდინაცია და თანამშრომლობა SCS-სა და კონტრაქტორს შორის.
258. ზუგდიდის ბიბლიოთეკის პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის ოქტომბერში სკ-მ სამშენებლო სამობილიზაციო სამუშაოები დაიწყო. ამ პერიოდის განმავლობაში, სკ-მ შეიმუშავა SSEMP დოკუმენტი, ბანაკის ადგილის მართვის გეგმა, ხმაურისა და ვიბრაციის მართვის გეგმა და ნარჩენების მართვის გეგმა. ეს დოკუმენტები განიხილა და პირობითად დაამტკიცა SCS-მა 2022 წლის 30 ნოემბერს. კონტრაქტორი აგრძელებს მუშაობას ამ გეგმების მიხედვით.
259. თუმცა ზედამხედველ კონსულტანტსა და კონტრაქტორს ჰქონდათ გადავადებები კონტრაქტორის ყოველთვიური ანგარიშის და ინსტრუქციების ანგარიშგებაზე პასუხების წარმოდგენის კუთხით. 2023 წლის 28 მარტს, მგფ-ს, კონტრაქტორსა და ზედამხედველ კონსულტანტს შორის შედგა შეხვედრა გარემოსდაცვით და ანგარიშგების საკითხებთან დაკავშირებით, და სიტუაცია ოდნავ გაუმჯობესდა. აგრეთვე, 2023 წლის ივნისიდან დაინიშნა ახალი გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების მენეჯერი, იმედია რომ ამის შედეგად გამოსწორდება კომუნიკაციის პრობლემა მხარეებს შორის.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

6. კარგი პრაქტიკა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა

6.1. კარგი პრაქტიკა

სპორტული კომპლექსები და საბავშვო ბაღები

260. როდესაც გარემოსდაცვითი კონსულტანტი სამშენებლო ობიექტზე იმყოფება, განიხილება რამდენიმე დამატებითი კარგი პრაქტიკა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შეუფერხებელი და პროდუქტიული ჩართულობა. ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე ძირითადი პრაქტიკა:

- წინასწარი ვიზიტის დაგეგმვა: ადგილზე ვიზიტამდე ჩართულია საფუძვლიან დაგეგმვაში არასაკვანძო ექსპერტებთან (აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველო). კონტრაქტორის გარემოსდაცვით მენეჯერს წინასწარ ეცნობება, რათა დაესწროს ადგილზე ვიზიტს და ჩაატაროს ერთობლივი აუდიტი. მკაფიო კომუნიკაცია მიზნის, ფარგლების და სასურველი შედეგების შესახებ ობიექტზე ვიზიტის დროს. მიაწოდეთ მათ ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია, მონაცემები ან დოკუმენტები მშენებელი კონტრაქტორის ორგანიზაციის გასაცნობად.
- ობიექტის გაცნობა: ჩამოსვლისთანავე, გამოეყოს დრო გარემოსდაცვით კონსულტანტს, რათა გაეცნოს კონტრაქტორის ტერიტორიის ფიზიკურ მდებარეობას და სამშენებლო ასპექტებს. უზრუნველყოს მათთვის მოკლე შესავალი პროექტის გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესახებ და ახსნას კონკრეტული პროცესები ან პროცედურები.
- ღია საკომუნიკაციო არხები: მკაფიო და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება კონტრაქტორის პერსონალთან და საიტის მენეჯერთან. წახალისეთ ღია დიალოგი და რეგულარული შემოწმებები ნებისმიერი კითხვის ან პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.
- ქტიური დაკვირვება: საიტის მენეჯერთან ერთად ხდება ობიექტის პერიმეტრის შემოწმება, არსებული მდგომარეობის შეფასება და სიტყვიერი მითითებების მიცემა. მას აცნობებენ, რომ ეს ყველაფერი დაფიქსირებული იქნება სპეციალურ გარემოსდაცვით ანგარიშში, რომელიც 2-3 დღეში ოფიციალურად გაიგზავნება შემდგომი შესწორებისთვის. ეს მას მეტ მოტივაციას აძლევს, განახორციელოს მაქსიმალური კონტროლი და რაც შეიძლება მალე დაიწყოს დარღვევების გამოსწორება.
- დოკუმენტაცია და ანგარიშგება: ობიექტებზე დათვალიერებისას დეტალური ინფორმაცია ფიქსირდება რვეულში, რაც ეხმარება გარემოსდაცვით სპეციალისტს ამომწურავი ანგარიშის მომზადებაში.

261. კარგი გარემოსდაცვითი პრაქტიკა:

- კარგი პრაქტიკა: ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება
 - ენერგეტიკული აუდიტის ჩატარება მაღალი ენერგიის მოხმარების სფეროების გამოსავლენად.
 - ენერგოეფექტური მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის განახლება.
 - ჭკვიანი თერმოსტატების და ენერგიის მართვის სისტემების დაყენება.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

- კარგი პრაქტიკა: ნარჩენების შემცირება და გადამუშავება
 - ქაღალდის, პლასტმასის, მინის და სხვა გადამუშავებადი მასალების გადამუშავების ყოვლისმომცველი პროგრამის განხორციელება.
 - თანამშრომლების წახალისება, რომ მინიმუმამდე დაიყვანონ ქაღალდის გამოყენება და აირჩიონ ციფრული დოკუმენტაცია.
 - პარტნიორობა გადამამუშავებელ კომპანიებთან ნარჩენების სათანადო განკარგვისა და გადამუშავების უზრუნველსაყოფად.
- კარგი პრაქტიკა: მდგრადი ტრანსპორტირება
 - თანამშრომლების წახალისება, გამოიყენონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტოსადგომი ან ველოსიპედი სამუშაოზე მოსვლისას.
 - ელექტრომობილების დამტენი სადგურების უზრუნველყოფა და ელექტრო ან ჰიბრიდული მანქანების გამოყენების ხელშეწყობა.
 - ლოგისტიკის ოპტიმიზაცია საწვავის მოხმარების შესამცირებლად და გამონაბოლქვის შესამცირებლად.
- კარგი პრაქტიკა: გარემოსდაცვითი განათლება და ცნობიერება
 - ტრენინგის და რესურსების უზრუნველყოფა თანამშრომლებისთვის, რათა დაინერგოს ეკოლოგიაზე ორიენტირებული ქცევა.

262. სამშენებლო კომპანიებს შუსაბამოების გათვალისწინებით მიეცათ HSE პირობების გაუმჯობესების რეკომენდაცია, რათა SSEMP-ზე უკეთესი გარემოს დაცვით პირობებისთვის მიეღწიათ და შეექმნათ კარგი სამუშაო პრაქტიკის საფუძველი უფრო უსაფრთხო გარემოსთვის.

263. კონტრაქტორებს პერიოდულად უტარდებათ გარემოსდაცვითი ტრენინგები მათი ცოდნის ამაღლებისა და პროექტის, დონორი (აზიის განვითარების ბანკი) კომპანიისა და ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობის გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისად.

ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა ზუგდიდში

264. ურბანულ გარემოში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია ნარჩენების მართვის ყოვლისმომცველი გეგმის განხორციელება. ეს გეგმა უნდა მოიცავდეს ნარჩენების ტიპების გამოყოფას სათავეში და სათანადო განადგურების მეთოდების მიღებას, როგორცაა მასალების ხელახალი გამოყენება, როდესაც ეს შესაძლებელია და სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო განადგურების უზრუნველყოფა. ნარჩენების წარმოქმნისა და განადგურების რეგულარული მონიტორინგი გადამწყვეტია ნარჩენების შემცირების შესაძლებლობების გამოსავლენად და საერთო ეფექტურობის გაზრდისათვის. ასეთ პროექტებში ნარჩენების მართვის განუყოფელი ნაწილია ნარჩენების რეგისტრაციის ფორმის გამოყენება. ეს ფორმა ემსახურება წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ არსებითი დეტალების აღრიცხვას, მათი ტიპის, რაოდენობის, დამუშავების პროცედურების და განთავსების ადგილის ჩათვლით. ნარჩენების რეგისტრაციის ფორმის გამოყენებით, სამშენებლო გუნდებს

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შეუძლიათ უზრუნველყონ სათანადო დოკუმენტაცია და ნარჩენების ეფექტური თვალყურის დევნება მთელი სამშენებლო პროცესის განმავლობაში. ნარჩენების კლასიფიკაცია მათი ბუნების მიხედვით, როგორცაა სამშენებლო ნარჩენები, სახიფათო მასალები, ორგანული ნარჩენები და პლასტმასი, ხელს უწყობს ნარჩენების მართვის უკეთ დაგეგმვას და ეხმარება ნარჩენების შემცირების მიზნობრივ სტრატეგიებს. თითოეული წარმოქმნილი ნარჩენის რაოდენობის ან მოცულობის აღრიცხვით, სამშენებლო პროექტებს შეუძლიათ ნარჩენების წარმოქმნის ტენდენციების მონიტორინგი და ნარჩენების მინიმიზაციის პოტენციური სფეროების იდენტიფიცირება. გარდა ამისა, ნარჩენების წარმოქმნის, შეგროვებისა და განთავსების თარიღისა და დროის აღნიშვნა უზრუნველყოფს ნარჩენების მართვის აქტივობების მკაფიო ვადებს, რაც უკეთესი კოორდინაციისა და დაგეგმვის საშუალებას იძლევა. კონკრეტული პიროვნებების ან ჯგუფების დანიშვნა, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან თითოეული ტიპის ნარჩენების მართვასა და განადგურებაზე, ხელს უწყობს ანგარიშვალდებულებას და უზრუნველყოფს ნარჩენების მართვის ამოცანების ეფექტურად შესრულებას.

265. რეალურ დროში ჰაერის ხარისხის, ხმაურის დონისა და მტვრის ემისიების მჭიდრო მონიტორინგით, სამშენებლო გუნდებს შეუძლიათ დაუყონებლივ აღმოაჩინონ ნებისმიერი პოტენციური გადაჭარბებული ზემოქმედება გარემოზე. ეს პროაქტიული მიდგომა მათ საშუალებას აძლევს იდენტიფიცირება მოახდინონ და გადაჭრან ნებისმიერი გადახრები დადგენილი გარემოსდაცვითი სტანდარტებიდან, რაც უზრუნველყოფს სამშენებლო საქმიანობების შესაბამისობას მარეგულირებელ მოთხოვნებთან. რეალურ დროში გარემოსდაცვითი მონიტორინგისა და მონიტორინგის მონაცემების პროაქტიული ანალიზის სამშენებლო პრაქტიკაში ინტეგრირებით, ურბანულ პროექტებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ თავიანთი გარემოსდაცვითი ეფექტურობა და წარმოაჩინონ მდგრადი განვითარებისადმი ერთგულება. ეს მიდგომა არა მხოლოდ ხელს უწყობს ადგილობრივი გარემოს დაცვას, არამედ მხარს უჭერს პოზიტიურ ურთიერთობას საზოგადოებასთან ახლომდებარე მაცხოვრებლებისა და მგრძნობიარე ტერიტორიების პოტენციური შეწუხების შემსუბუქებით.

266. სამშენებლო მოედნების და ქუჩების რეგულარულად მორწყვა მტვრის გამონაბოლქვის გასაკონტროლებლად და ნაწილაკების გავრცელების შესამცირებლად კარგ პრაქტიკას წარმოადგენს სამშენებლო სამუშაოებში. ამ ტერიტორიების გულმოდგინე მორწყვით, სამშენებლო გუნდებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ჰაერის მტვრის ნაწილაკები, რაც ხელს შეუწყობს ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს. ეს სპეციალიზებული წყლის სატვირთო მანქანები შექმნილია წყლის თანაბრად და ზუსტად გასაფრქვევად, რაც უზრუნველყოფს ერთგვაროვან დაფარვას სამშენებლო მოედანსა და ქუჩებში. ნაცადი გამფრქვევი სისტემები ხელს უშლის ჭარბ მორწყვას ან არაადეკვატურ დაფარვას, რაც მაქსიმალურად ზრდის მტვრის კონტროლის ღონისძიებების ეფექტურობას და იმავდროულად ზოგავს წყლის რესურსებს. ეს დამკვიდრებული კარგი პრაქტიკა არა მხოლოდ ამცირებს მტვერთან დაკავშირებულ პრობლემას, არამედ ავლენს ეკოლოგიურად მდგრადი სამშენებლო პრაქტიკის მიმართ ერთგულებას. მტვრის

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ემისიების მინიმიზაციის გზით, სამშენებლო პროექტები ხელს უწყობს ახლომდებარე მაცხოვრებლებზე, ბიზნესებსა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე პოტენციური ზემოქმედების შემცირებას. გარდა ამისა, ეს მიდგომა შესაბამისობაშია მარეგულირებელ მოთხოვნებთან და საზოგადოების მოლოდინებთან, ხელს უწყობს პოზიტიურ ურთიერთობებს დაინტერესებულ მხარეებთან და მხარს უჭერს უფრო ჰარმონიულ ურბანულ გარემოს.

267. ურბანულ სამშენებლო პროექტებში უმთავრესი მნიშვნელობისაა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის (HSE) რეგულარული ტრენინგის ჩატარების პრაქტიკის დამკვიდრება. მუშახელის, მიმდებარე თემებისა და გარემოს კეთილდღეობის პრიორიტეტად დასახვით, სამშენებლო გუნდებს შეუძლიათ თავიანთი საქმიანობის განმავლობაში დაიცვან უსაფრთხოებისა და მდგრადობის უმაღლესი სტანდარტები.

268. რეგულარული ტრენინგების მეშვეობით, მუშახელი და პერსონალი იღებს ამომწურავ ინსტრუქციას HSE-ს საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. ეს სესიები მოიცავს კრიტიკული საკითხების ფართო სპექტრს, მათ შორის ნარჩენების მართვას, მტვრის კონტროლს და საშიში მასალების უსაფრთხოდ განკარგვას. მუშახელს ეძლევა ინფორმაცია ნარჩენების განცალკევების, შენახვისა და განკარგვის სათანადო პროცედურებზე, რაც უზრუნველყოფს გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირებას. ტრენინგი ასევე ფოკუსირებულია მტვრის კონტროლის ეფექტურ მეთოდებზე, როგორცაა წყლის გამფრქვევი სისტემების გამოყენება ჰაერში მტვრის ნაწილაკების შესამცირებლად და სამშენებლო ობიექტებზე ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. გარდა ამისა, მუშახელი აღჭურვილია საჭირო ცოდნითა და უნარებით, რათა უსაფრთხოდ განკარგონ სახიფათო მასალები, რაც ამცირებს ავარიების რისკს და პოტენციურ ზიანს, როგორც მუშახელის, ასევე გარემოსათვის.

269. საკოორდინაციო შეხვედრები CSC-ს, CC-სა და MDF-ის უსაფრთხოების ჯგუფთან რეგულარულად ტარდება, როგორც ეს ხდებოდა წინა საანგარიშგებო პერიოდში.

270. პროექტის მენეჯმენტის გუნდი სრულად არის ჩართული იმისათვის, რომ გაიგოს, რა უნდა გაკეთდეს და როგორ გამოსწორდეს და გადაიჭრას ნებისმიერი გარემოსდაცვითი პრობლემა, რომელიც წარმოიშვა პროექტის განხორციელების პროცესში.

271. პროექტის განხორციელების პროცესში, მუშაობის საერთო სტრატეგიის შენარჩუნება, ყველა შიდა და გარე დაინტერესებული მხარის თანამშრომლობის, როგორც ასოცირებული და მონაწილეობითი პროცესის გააზრება, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად.

272. პროექტის განხორციელების დროს ადგილის ჰქონდა ორ ძირითად გაუმჯობესებას (1) სიჩქარის შეზღუდვის შემცირება როდესაც პროექტის მანქანები სოფელში გადაადგილდებიან. ეს არის განხორციელებული შემარბილებელი ღონისძიებები, რომლებიც ამცირებს მტვრის/ხმაურის გავრცელებას, და შესაბამისად ქმნის პოზიტიურ გავლენას მოსახლეობაზე და კარგ დამოკიდებულებას პროექტის განმახორციელებლებს და სოფლის მოსახლეობას შორის, (2) კაკლის ხის თაობაზე

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

კონსტრუქციული გადაწყვეტის მოძიება, რომელიც მდებარეობს პარკში და მოჭრას გადარჩება საინჟინრო გადაწყვეტის წყალობით.

273. სამშენებლო კომპანიებს მიეცათ ინსტრუქცია, გამოვლენილი შეუსაბამოების შესწორებით გაეუმჯობესებინათ HSE პირობები, რათა მიაღწიონ უკეთეს გარემო პირობებს SSEMP-ის მოთხოვნების შესაბამისად და შექმნან საფუძველი კარგი შესრულების პრაქტიკისთვის უფრო უსაფრთხო გარემოს მისაღწევად.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

7. დასკვნა და რეკომენდაციები

7.1. დასკვნა

საბავშვო ბაღები და სპორტული კომპლექსები

274. ტექნიკური ზედამხედველის გარემოსდაცვითი სპეციალისტი აფასებს რამდენად ზუსტია კონტრაქტორის ანგარიშებში მოწოდებული ინფორმაცია, ავსებს მათში გამოვლენილ ჩავარდნებს და აფასებს კონტრაქტორის მიერ გამოყენებული შემარბილებელი ღონისძიებების ადეკვატურობას.
275. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას, ზედამხედველ კონსულტანტის გარემოსდაცვითი სპეციალისტი დროდადრო ატარებს გარემოსდაცვით შეხვედრებს და ტერიტორიის ინსპექტირებას.
276. ვალდებულებების შესასრულებლად, სამშენებლო სამუშაოების დროს EMP/SSEMP კარგი სამშენებლო პრაქტიკის დაცვის მიზნით, კონტრაქტორებმა შექმნეს გარემოსდაცვითი მართვის ჯგუფები და პროცედურები.
277. მშენებელი კონტრაქტორები ამზადებენ ყოველთვიურ სამუშაოების მიმდინარეობის ანგარიშებს SSEMP-ის განხორციელების შესახებ, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის ძირითადი ტიპების, გამოყენებული შემარბილებელი ღონისძიებების და გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ, რომლებიც წარმოიშვა მომწოდებლებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ზემოქმედების ქვეშ მყოფ თემებთან ურთიერთობაში. და ა.შ.
278. მშენებელმა კონტრაქტორებმა სამუშაოები შეასრულეს საკონტრაქტო ხელშეკრულებებისა და SSEMP-ების მიხედვით.
279. სამშენებლო კომპანიების საქმიანობა ამ პერიოდის განმავლობაში ძირითადად დამაკმაყოფილებელია.
280. ტერიტორიის გაწმენდა - სამშენებლო კომპანიებმა ჩაატარეს SSEMP-ით განსაზღვრული HSE-თან დაკავშირებული ყველა საჭირო სამუშაო.
281. ნარჩენების მართვა - სამშენებლო კომპანიებმა მოამზადეს ნარჩენების მართვის გეგმები. არასახიფათო ნარჩენების განთავსებაზე სამშენებლო კომპანიებს ძირითადად გაფორმებული აქვთ კონტრაქტები მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან.
282. SSEMP-ის მომზადების პროცესში, ჩატარდა ტერიტორიის ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის საბაზისო გაზომვები.
283. ზედამხედველი კონსულტანტი რეგულარულად ახორციელებს სამუშაოების გარემოსდაცვით მონიტორინგს.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ველისციხის ურბანული განახლების პროექტი და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა ზუგდიდში

284. გარემოსდაცვით საკითხებს მართავს საზედამხედველო კომპანია EPTISA. EHS პერსონალი განიხილავს და ამტკიცებს კონტრაქტორის მიერ წარდგენილ გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციას, აკონტროლებს სამშენებლო საქმიანობას და გამოსცემს შეუსაბამობის ანგარიშებს; კონტრაქტორის მხარდაჭერა გარემოსდაცვითი ნებართვებისა და ლიცენზიების მოპოვებაში.
285. CSC კომპანია ამზადებს ყოველთვიურ სამუშაოების მიმდინარეობის ანგარიშებს (დღიური და ყოველკვირეული საკონტროლო სიების გამოყენებით), რომელიც მოიცავს SSEMP-ის განხორციელებას, SSEMP-ისთან შეუსაბამობებს და ყველა HSE შესაბამისი ინციდენტის და ავარიის ჩამონათვალს, რომელიც განხორციელების დროს ხდება; წარადგენს პერიოდულ ანგარიშებს მონიტორინგის მონაცემებისა და ლაბორატორიული ანალიზის საფუძველზე.
286. მშენებელმა კონტრაქტორებმა სრულ განაკვეთზე დანიშნეს ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯერები (HS&EM), რომლებიც წარმოადგენენ ადგილზე მყოფი სამშენებლო მენეჯმენტის ჯგუფის უფროს წევრებს, ხელშეკრულების ხანგრძლივობის განმავლობაში.
287. CC -ები დამსაქმებელს ყოველთვიურად წარუდგენენ ანგარიშებს შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ; ობიექტთან დაკავშირებული ჩანაწერების შექმნა და წარმოება: ობიექტის ყოველკვირეული ინსპექტირება SEMP-ზე დაფუძნებული საკონტროლო სიების გამოყენებით; გარემოსდაცვითი ავარიები/ინციდენტები მოგვარების აქტივობების ჩათვლით.
288. IEE-ების მოთხოვნის შესაბამისად, CC-ებმა დანიშნეს გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების (EHS) პერსონალი ხელშეკრულების ხანგრძლივობის განმავლობაში.
289. CC -ებმა აწარმოეს სამუშაოები საკონტრაქტო ხელშეკრულებებისა და SSEMP-ების მიხედვით და შეიმუშავეს ყოველთვიური გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშები.
290. CC -ების მიერ შესრულებული საქმიანობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია.
291. ტერიტორიის გაწმენდა - სამშენებლო კომპანიებმა ჩაატარეს SSEMP-ით განსაზღვრული HSE-თან დაკავშირებული ყველა საჭირო სამუშაო.
292. CC -ებს აქვთ კონტრაქტი მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან არასახიფათო და სახიფათო ნარჩენების განკარგვის მიზნით.
293. CC -ები აგროვებენ სახიფათო ნარჩენებს დროებით საწყობებში და გადასცემენ სახიფათო ნარჩენების ექსპლუატაციის გარემოსდაცვითი ნებართვის მქონე შპს „ეკო სერვის ჯორჯიას“ ლიცენზირებულ ოპერატორს, შპს „სანიტარს“, შპს „მედიქალ ტექნოლოგიას“.
294. კონტრაქტორმა, კერძოდ ზუგდიდის პროექტის ფარგლებში, დროულად უნდა წარადგინოს ყოველთვიური ანგარიშები, დაფაროს უფრო კონკრეტული საკითხები და
- შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

არ გააკეთოს ზოგადი ანგარიშები. ამის შესახებ არაერთხელ ეცნობა კონტრაქტორს და იმედია, რომ ეს საკითხი მომავალ თვეებში გაუმჯობესდება.

7.2. რეკომენდაციები

295. საზედამხედველო კონსულტანტის მონიტორინგის საფუძველზე, ობიექტებს სჭირდებათ უკეთესი საყოფაცხოვრებო მოვლა. ობიექტებზე მასალები საჭიროებს უკეთეს სეგრეგაციას და ადეკვატურ შენახვას. სამშენებლო მასალების ნარჩენები დროულად უნდა იქნას გატანილი სამშენებლო მოედნიდან. ობიექტი რეგულარულად უნდა დასუფთავდეს. ადგილზე დაღვრილი ლაქების წმენდა ადეკვატურად უნდა განხორციელდეს.
296. სამშენებლო მოედანი შემოღობილი უნდა იყოს ყველა მხრიდან, უნდა დამონტაჟდეს გამაფრთხილებელი ნიშნები.
297. ნიადაგის ზედა ფენა უნდა ინახებოდეს ცალკე, შესაბამის ადგილას (ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ და ნაყარის ფერდის დახრილობა არ უნდა აღემატებოდეს 45°-ს), უნდა იყოს ლენტით შემოღობილი და წარწერილი.
298. საწვავის/ზეთის დაღვრაზე რეაგირების საშუალებები (ქვიშა, ნახერხი, ღრმა საწვეთურები, მცირე ზომის ავზი) ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სამშენებლო ობიექტებზე.
299. სამშენებლო ობიექტზე ხეები დაცული უნდა იყოს სამშენებლო სამუშაოების დროს მათი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
300. სახიფათო ნარჩენების სათანადო კონტეინერი შესაბამისი ნიშნით „სახიფათო ნარჩენები“ სათანადოდ ორგანიზებულ ადგილზე უნდა დამონტაჟდეს ბეტონის იატაკით და გადახურვით.
301. მუშახელმა უნდა გამოიყენოს ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობის სრული კომპლექტი.

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

დანართი 1. ინფორმაცია საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ჩატარებული ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტრენინგების შესახებ

ოლიმპიური საცურაო აუზის მშენებლობა ქუთაისში		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგადი საწყისი ტრენინგი	09/01/2023	 
სიმაღლეზე მუშაობა	12/01/2023 15/02/2023 10/03/2023 25/04/2023 12/05/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	25/01/2023 02/05/2023	
საგანგებო სიტუაციები	29/02/2023	
ხარაჩოები	12/01/2023 10/03/2023	
ელექტროაღჭურვილობა	25/01/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	15/01/2023 26/02/2023 18/03/2023	
აღჭურვილობა	12/01/2023	
ერგონომიკა	12/02/2023	
ადამიანური რესურსების და აღჭურვილობის ინტერვენცია	19/01/2023	
ინდივიდუალური უსაფრთხოების ზომები	09/01/2023 15/02/2023 25/04/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ქუთაისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	  
ხანძრის პროფილაქტიკა	01/04/2023	
თანამშრომლების ფუნქციები და პასუხისმგებლობები	17/01/2023	
პირველადი დახმარება	31/01/2023	
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება	14/02/2023	
ობიექტის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ზოგადი ტრენინგი	28/02/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	04/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	27/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	10/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	24/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	21/05/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ხარაჩოები	06/04/2023	
მტკიცებულების დარღვევა	18/05/2023	

ბანძას საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ხანძრის პროფილაქტიკა	18/01/2023	
თანამშრომლების ფუნქციები და პასუხისმგებლობები	05/01/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	14/02/2023	
ფოლადის სამუშაოები	23/05/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	06/06/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	28/03/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/02/2023	
ხარაჩოები	01/02/2023	
კიბეების უსაფრთხო გამოყენება	14/03/2023	
ცხელი სამუშაოები	11/04/2023	
სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების განცალკევება	09/05/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მტკიცებულების დარღვევა	20/06/2023	
---------------------------	------------	--

ჭითაწყარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	 
ხანძრის პროფილაქტიკა	20/01/2023	
ზოგადი უსაფრთხოება	17/02/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	19/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	30/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	14/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	02/03/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	01/08/2023	
ხარაჩოები	12/05/2023	
კიბეების უსაფრთხო გამოყენება	03/02/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ელექტროსამუშაოები	08/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

რუხის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	 
ხანძრის პროფილაქტიკა	20/01/2023	
პირველადი დახმარება	03/02/2023	
ზოგადი უსაფრთხოება	17/02/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	16/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	30/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	14/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	02/03/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ხარაჩოები	06/01/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ელექტროსამუშაოები	08/06/2023	
მტკიცებულების დარღვევა	20/06/2023	

სენაკის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ხანძრის პროფილაქტიკა	20/01/2023	


შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ინდივიდუალური უსაფრთხოება	January/2023 June/2023	
პირველადი დახმარება	03/02/2023	
ზოგადი უსაფრთხოება	June/2023	
ინსტრუქციები დღიური მუშახელისთვის	April/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	16/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	30/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	14/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	02/03/2023	
კიბეებით მუშაობა	May/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	January/2023	
ხარაჩოები	06/01/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ელექტროსამუშაოები	08/06/2023	
მტკიცებულების დარღვევა	20/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

დარჩელის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		 
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ხანძრის პროფილაქტიკა	20/01/2023	
პირველადი დახმარება	03/02/2023	
ზოგადი უსაფრთხოება	17/02/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	16/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	30/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	14/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	02/03/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ხარაჩოები	06/01/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ელექტროსამუშაოები	08/06/2023	
მტკიცებულების დარღვევა	20/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

შამგონას საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ხანძრის პროფილაქტიკა	18/01/2023	
თანამშრომლების ფუნქციები და პასუხისმგებლობები	05/01/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	14/02/2023	
კიბეებზე მუშაობა	14/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	23/05/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	06/06/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	28/03//2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/0/2023	
ხარაჩოები	02/01/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	28/02/2023	
ელექტროსამუშაოები	25/04/2023	
მტკიცებულების დარღვევა	20/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

დიდიჭყონის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სამართლებრივი პრინციპები	23/04/2023	
ხანძრისგან დაცვა და საგანგებო სიტუაციები	23/04/2023	
პირველადი დახმარების ინსტრუქციები	23/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	23/04/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	23/04/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	23/04/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	23/04/2023	
სიმაღლეებზე მუშაობის საგანგებო გეგმა	23/04/2023	
ინსტრუქციები ხარაჩოებზე და კიბეებზე მუშაობასთან დაკავშირებით	23/04/2023	
ინსტრუქციები ცხელი აღჭურვილობით	23/04/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

მუშაობასთან დაკავშირებით		
-----------------------------	--	--

სუფსის და ხაჯალის საბავშვო ბაღების მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სამართლებრივი პრინციპები	24/04/2023	 
ხანძრისგან დაცვა და საგანგებო სიტუაციები	24/04/2023	
პირველადი დახმარების ინსტრუქციები	24/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	24/04/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	24/04/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	24/04/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	24/04/2023	
სიმაღლეებზე მუშაობის საგანგებო გეგმა	24/04/2023	
ინსტრუქციები ხარაჩოებზე და კიბეებზე მუშაობასთან დაკავშირებით	24/04/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ინსტრუქციები ცხელი აღჭურვილობით მუშაობასთან დაკავშირებით	24/04/2023	
---	------------	--

რუსთავის სპორტკომპლექსის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ხანძრისგან დაცვა და საგანგებო სიტუაციები	15/05/2023	
პირველადი დახმარების ინსტრუქციები და ინდივიდუალური დაცვა და უსაფრთხოება	18/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა, ხანძრისაგან დაცვა და ინდივიდუალური უსაფრთხოება	16/01/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	16/02/2023	
სიმაღლეებზე მუშაობის საგანგებო გეგმა, ხელით ჩატვირთვა	16/03/2023	
სიმაღლეებზე მუშაობის ინსტრუქციები, ინდივიდუალური და კოლექტიური უსაფრთხოების ზომები	20/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ფოტის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
სიმაღლეზე მუშაობა, პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა და ინდივიდუალური უსაფრთხოება	20/01/2023	 
პირველადი დახმარება, ხანძრისგან დაცვა	02/02/2023	
უსაფრთხოების ზომები სიმაღლეებისათვის; ზოგადი ინსტრუქციები;	10/03/2023	
ინსტრუქციები დღიური მუშახელისთვის და მათთვის, ვინც ფოლადის კონსტრუქციებზე და ხარაჩოებზე მუშაობს	24/04/2023	
ინსტრუქციები ინსტალაციებისათვის, შედუღებისა და ფოლადის კონსტრუქციებისთვის	01/05/2023	
ინდივიდუალური და კოლექტიური უსაფრთხოების ზომები; მძიმე აღჭურვილობა და სიმაღლეზე მუშაობა	23/05/2023	
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქციები თანამშრომლებისათვის	11/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ახალციხის სპორტკომპლექსის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
სიმაღლეზე მუშაობა, პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა და ინდივიდუალური უსაფრთხოება	თებერვალი 2023 მარტი 2023	
ხარაჩოების მონტაჟი და დემონტაჟი; პირველადი დახმარების ინსტრუქციები	მარტი 2023 აპრილი 2023	
ელექტროაღჭურვილობა; კიბეების გადაადგილება; უსაფრთხოების ღვედების გამოყენება	აპრილი 2023 ივნისი 2023	
ჭები, ორმოები; ჰიდროიზოლაცია და გადახურვა; პოტენციური საფრთხე მიწასა და იატაკებზე	მაისი 2023	

აგარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სამართლებრივი პრინციპები	28/04/2023	
პირველადი დახმარება, ხანძრისგან დაცვა	28/04/2023	
პირველადი დახმარების ინსტრუქციები	28/04/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

სიმაღლეზე მუშაობა	28/04/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	28/04/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	28/04/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	28/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობის საგანგებო გეგმა	28/04/2023	
ინსტრუქციები ხარაჩოებზე და კიბეებზე მუშაობასთან დაკავშირებით	28/04/2023	
ინსტრუქციები ცხელი აღჭურვილობით მუშაობასთან დაკავშირებით	28/04/2023	

ფარცხისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგადი საწყისი ტრენინგი	10/01/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	05/01/2023 16/02/2023 14/03/2023 24/04/2023 28/05/2023 14/06/2023	
ელექტროუსაფრთხოება	20/02/2023 07/04/2023	
საგანგებო სიტუაციები	06/03/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

პირველადი დახმარება	16/04/2023	
ხარაჩოები	12/01/2023 10/04/2023	
ელექტროაღჭურვილობა	27/01/2023 24/04/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	15/01/2023 26/03/2023 18/05/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	12/01/2023 10/03/2023 11/05/2023	
ერგონომიკა	12/02/2023	
ფიზიკური ფაქტორები	19/01/2023 20/03/2023	
მძიმე აღჭურვილობა	22/02/2023 13/04/2023	
ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეები	12/03/2023 21/06/2023	
უსაფრთხოების ნიშნები	18/02/2023 29/04/2023	
შედულების სამუშაოები	14/03/2023 27/06/2023	

ველისციხის ურბანული განახლება		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	
ჯანმრთელობასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგადი საწყისი ტრენინგი	10/01/2023 15/03/2023 03/04/2023	
სიმაღლეზე მუშაობა	08/01/2023 17/02/2023 15/03/2023 03/04/2023 01/05/2023 20/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

ელექტროუსაფრთხოება	28/01/2023 15/03/2023 01/05/2023	  
საგანგებო სიტუაციები	10/01/2023	
ხარაჩოები	10/01/2023 17/02/2023 15/03/2023 03/04/2023 01/05/2023 20/06/2023	
ელექტროაღჭურვილობა	17/02/2023 03/04/2023	
ჩატვითების სამუშაოები	13/01/2023 15/03/2023 01/05/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	11/01/2023 15/03/2023 01/05/2023	
ფიზიკური ფაქტორები	28/02/2023 03/04/2023	
მძიმე აღჭურვილობა	17/02/2023 05/06/2023	
ექსკავაციის პროცედურები	17/02/2023 03/04/2023	
უსაფრთხოების ნიშნები	15/03/2023 03/06/2023	
შედეგების სამუშაოები	05/03/2023 15/06/2023	

ზუგდიდის ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია		
ტრენინგის დასახელება	ტრენინგის ჩატარების თარიღები	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.

თანამშრომლების ფუნქციები და პასუხისმგებლობები	17/01/2023	 
პირველადი დახმარება	31/01/2023	
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება	14/02/2023	
ობიექტის ორგანიზებასთან დაკავშირებული ზოგადი ტრენინგი	28/02/2023	
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა	14/03/2023	
ფოლადის სამუშაოები	27/03/2023	
ჩატვირთვის სამუშაოები	10/04/2023	
უსაფრთხოების ბარიერები	24/04/2023	
ცხელი სამუშაოები	07/05/2023	
სიმაღლეებზე მუშაობა	21/05/2023	
ხარაჩოები	04/06/2023	

შიდა: წარმოდგენილი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აზიის განვითარების ბანკის (აგბ) ხელმძღვანელობისა და პერსონალისთვის. აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელება შესაძლებელია მხოლოდ აგბ-ის შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში.
